

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	剩余成本	2009年11月15日							2009年11月15日	
									日	一	二	三	四	五	六	日	一
0	msproj11	29.88 days	2019年3月13	2019年4月23			¥25,440.00	¥25,440.00									
1	启动	4 days	2019年3月1	2019年3月1			¥1,600.00	¥1,600.00									
2	组建核心	1 day	2019年3月	2019年3月		项目经理	¥320.00	¥320.00									
3	干系人分析	1 day	2019年3月14	2019年3月14		项目经理	¥320.00	¥320.00									
4	里程碑计划	1 day	2019年3月15	2019年3月15		项目经理	¥320.00	¥320.00									
5	制定项目	1 day	2019年3月	2019年3月	2, 3, 4	项目经理	¥320.00	¥320.00									
6	项目启动	1 day	2019年3月	2019年3月	5	项目经理	¥320.00	¥320.00									
7	规划	17 days	2019年3月1	2019年4月9			¥7,120.00	¥7,120.00									
8	规划范围	4 days	2019年3月	2019年3月			¥1,840.00	¥1,840.00									
9	进行调	1 day	2019年3月	2019年3月			¥0.00	¥0.00									
10	制定需	1 day	2019年3月	2019年3月	9		¥0.00	¥0.00									
11	界面设	1 day	2019年3月	2019年3月	9	UI专家	¥240.00	¥240.00									
12	详细设	1 day	2019年3月	2019年3月	9	项目经理	¥320.00	¥320.00									
13	范围说	1 day	2019年3月	2019年3月	9	项目经理	¥320.00	¥320.00									
14	创建WBS	1 day	2019年3月	2019年3月	10, 11, 12, 13	项目经理	¥320.00	¥320.00									
15	形成范	2 days	2019年3月	2019年3月	14	项目经理	¥640.00	¥640.00									
16	规划时间	5 days	2019年3月	2019年3月			¥1,280.00	¥1,280.00									
17	排列各	1 day	2019年3月	2019年3月	15	项目经理	¥320.00	¥320.00									
18	估算资	1 day	2019年3月	2019年3月	17	产品经理	¥320.00	¥320.00									
19	估算持	1 day	2019年3月	2019年3月	18	产品经理	¥320.00	¥320.00									
20	制定进	1 day	2019年3月	2019年3月		项目经理	¥320.00	¥320.00									
21	规划成本	3 days	2019年4月	2019年4月			¥640.00	¥640.00									
22	项目成	1 day	2019年3月	2019年3月	20	项目经理	¥320.00	¥320.00									
23	项目预	1 day	2019年3月	2019年4月	22	产品经理	¥320.00	¥320.00									
24	规划质量	2 days	2019年3月	2019年3月			¥480.00	¥480.00									
25	制定测	1 day	2019年3月	2019年3月	15	测试工程师	¥240.00	¥240.00									
26	制定测	1 day	2019年3月	2019年3月	25	测试工程师	¥240.00	¥240.00									
27	规划人力	2 days	2019年3月	2019年3月			¥640.00	¥640.00									
28	制定人	1 day	2019年3月	2019年3月		项目经理	¥320.00	¥320.00									
29	制定人	1 day	2019年3月	2019年3月		产品经理	¥320.00	¥320.00									
30	规划沟通	1 day	2019年3月	2019年3月			¥320.00	¥320.00									
31	制定沟	1 day	2019年3月	2019年3月		项目经理	¥320.00	¥320.00									
32	规划采购	2 days	2019年3月	2019年3月			¥640.00	¥640.00									

项目: msproj11 日期: 2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	剩余成本	2009年11月15日							2009年11月15日	
									日	一	二	三	四	五	六	日	一
33	制定外	1 day	2019年3月	2019年3月	18	产品经理	¥320.00	¥320.00									
34	制定采	1 day	2019年3月	2019年3月	33	产品经理	¥320.00	¥320.00									
35	规划风险	3 days	2019年4月	2019年4月			¥960.00	¥960.00									
36	识别风	1 day	2019年4月	2019年4月	16, 22, 26, 28	项目经理	¥320.00	¥320.00									
37	风险分	1 day	2019年4月	2019年4月	36	项目经理	¥320.00	¥320.00									
38	制定风	1 day	2019年4月	2019年4月	39	项目经理	¥320.00	¥320.00									
39	规划整合	1 day	2019年4月7日	2019年4月8日		项目经理	¥320.00	¥320.00									
40	执行与监控	8 days	2019年4月11日	2019年4月20日			¥15,120.00	¥15,120.00									
41	项目执行	7 days	2019年4月11日	2019年4月19日			¥4,720.00	¥4,720.00									
42	用户注	3 days	2019年4月	2019年4月	39	UI专家, 算法工	¥1,920.00	¥1,920.00									
43	用户拍照	3 days	2019年4月15日	2019年4月17日	42	算法工程师	¥1,200.00	¥1,200.00									
44	查询记录	1 day	2019年4月18日	2019年4月18日	43	算法工程师	¥400.00	¥400.00									
45	实时人	3 days	2019年4月	2019年4月	44	算法工程师	¥1,200.00	¥1,200.00									
46	项目监控	3 days	2019年4月11日	2019年4月14日			¥4,560.00	¥4,560.00									
47	各项指	1 day	2019年4月	2019年4月	44	测试工程师	¥240.00	¥240.00									
48	监控评审	1 day	2019年4月22日	2019年4月22日	47	产品经理	¥320.00	¥320.00									
49	变更评审	1 day	2019年4月23日	2019年4月23日	48	测试工程师, 算法	¥960.00	¥960.00									
50	例会	2 days	2019年4月19日	2019年4月22日	44	UI专家, 测试工程	¥3,040.00	¥3,040.00									
51	管理干系	1 day	2019年4月	2019年4月			¥960.00	¥960.00									
52	了解干	1 day	2019年4月	2019年4月	44	项目经理	¥320.00	¥320.00									
53	发布项	1 day	2019年4月	2019年4月	44	项目经理	¥320.00	¥320.00									
54	报告监	1 day	2019年4月	2019年4月	44	产品经理	¥320.00	¥320.00									
55	团队建设	1 day	2019年4月21日	2019年4月21日			¥4,560.00	¥4,560.00									
56	娱乐活动	1 day	2019年4月19日	2019年4月19日	44	UI专家, 测试工程	¥1,520.00	¥1,520.00									
57	学习培训	1 day	2019年4月19日	2019年4月19日	44	UI专家, 测试工程	¥1,520.00	¥1,520.00									
58	工作相	1 day	2019年4月	2019年4月	44	UI专家, 测试工	¥1,520.00	¥1,520.00									
59	采购	1 day	2019年4月22日	2019年4月22日	41	产品经理	¥320.00	¥320.00									
60	项目验收	1 day	2019年4月19日	2019年4月19日	44		¥0.00	¥0.00									
61	收尾	2 days	2019年4月21日	2019年4月23日			¥1,600.00	¥1,600.00									
62	项目终验	1 day	2019年4月22日	2019年4月22日	60	产品经理, 项目	¥640.00	¥640.00									
63	结束采购	1 day	2019年4月22日	2019年4月22日	60	产品经理	¥320.00	¥320.00									
64	项目内部	1 day	2019年4月	2019年4月	60	产品经理, 项目	¥640.00	¥640.00									

项目：msproj11

日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要


仅开始时间

仅完成时间

期限

进度

手动进度





项目：msproj11  
日期：2019年6月19日


任务


拆分


里程碑


摘要


项目摘要












外部任务


外部里程碑


非活动任务


非活动里程碑

非活动摘要










手动任务


仅工期


手动摘要总成


手动摘要


仅开始时间













仅完成时间


期限


进度


手动进度









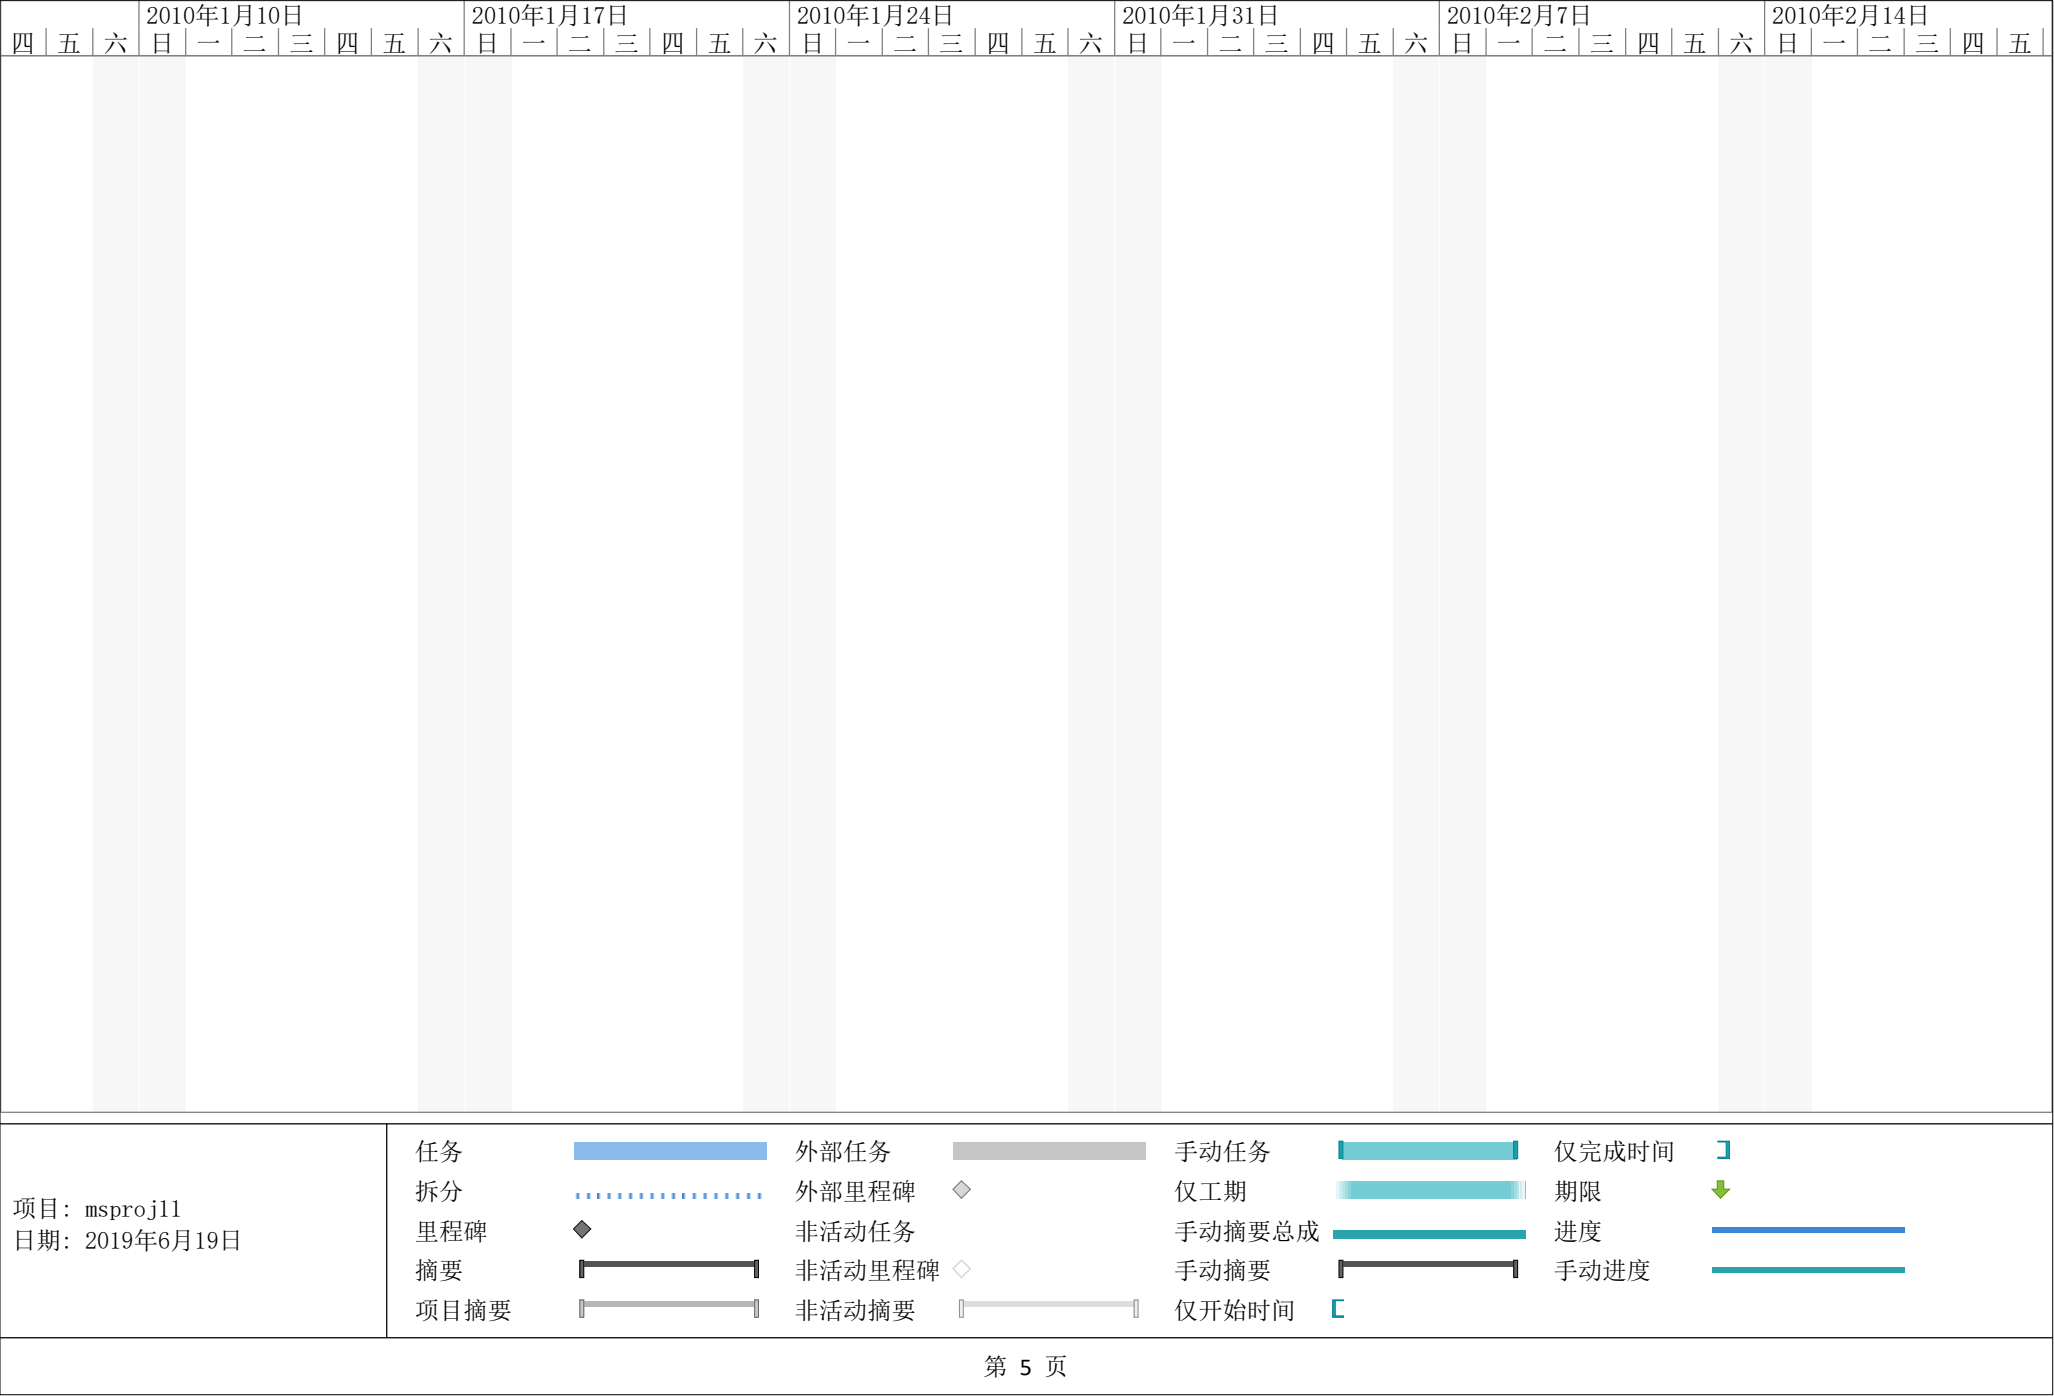




























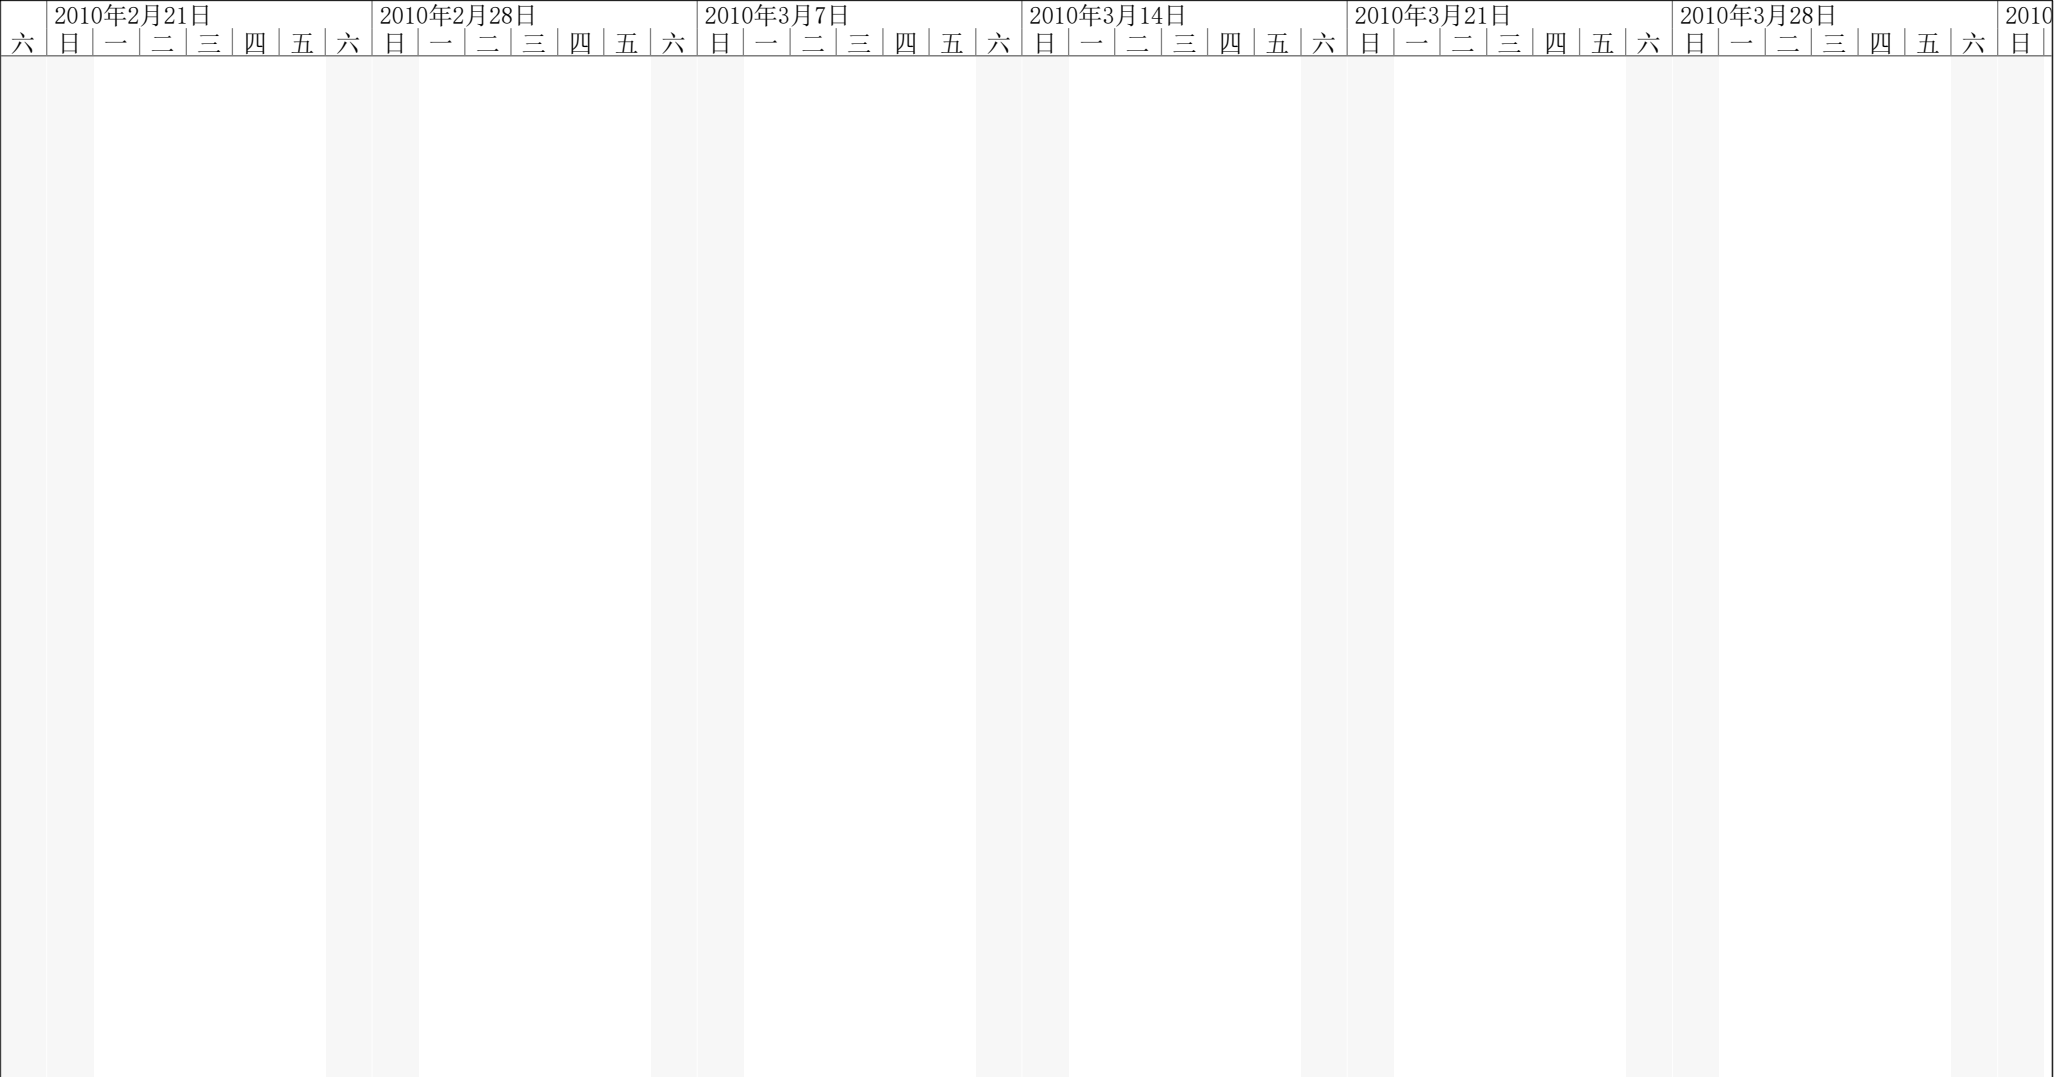
















[illegible]

项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			




项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			



项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			



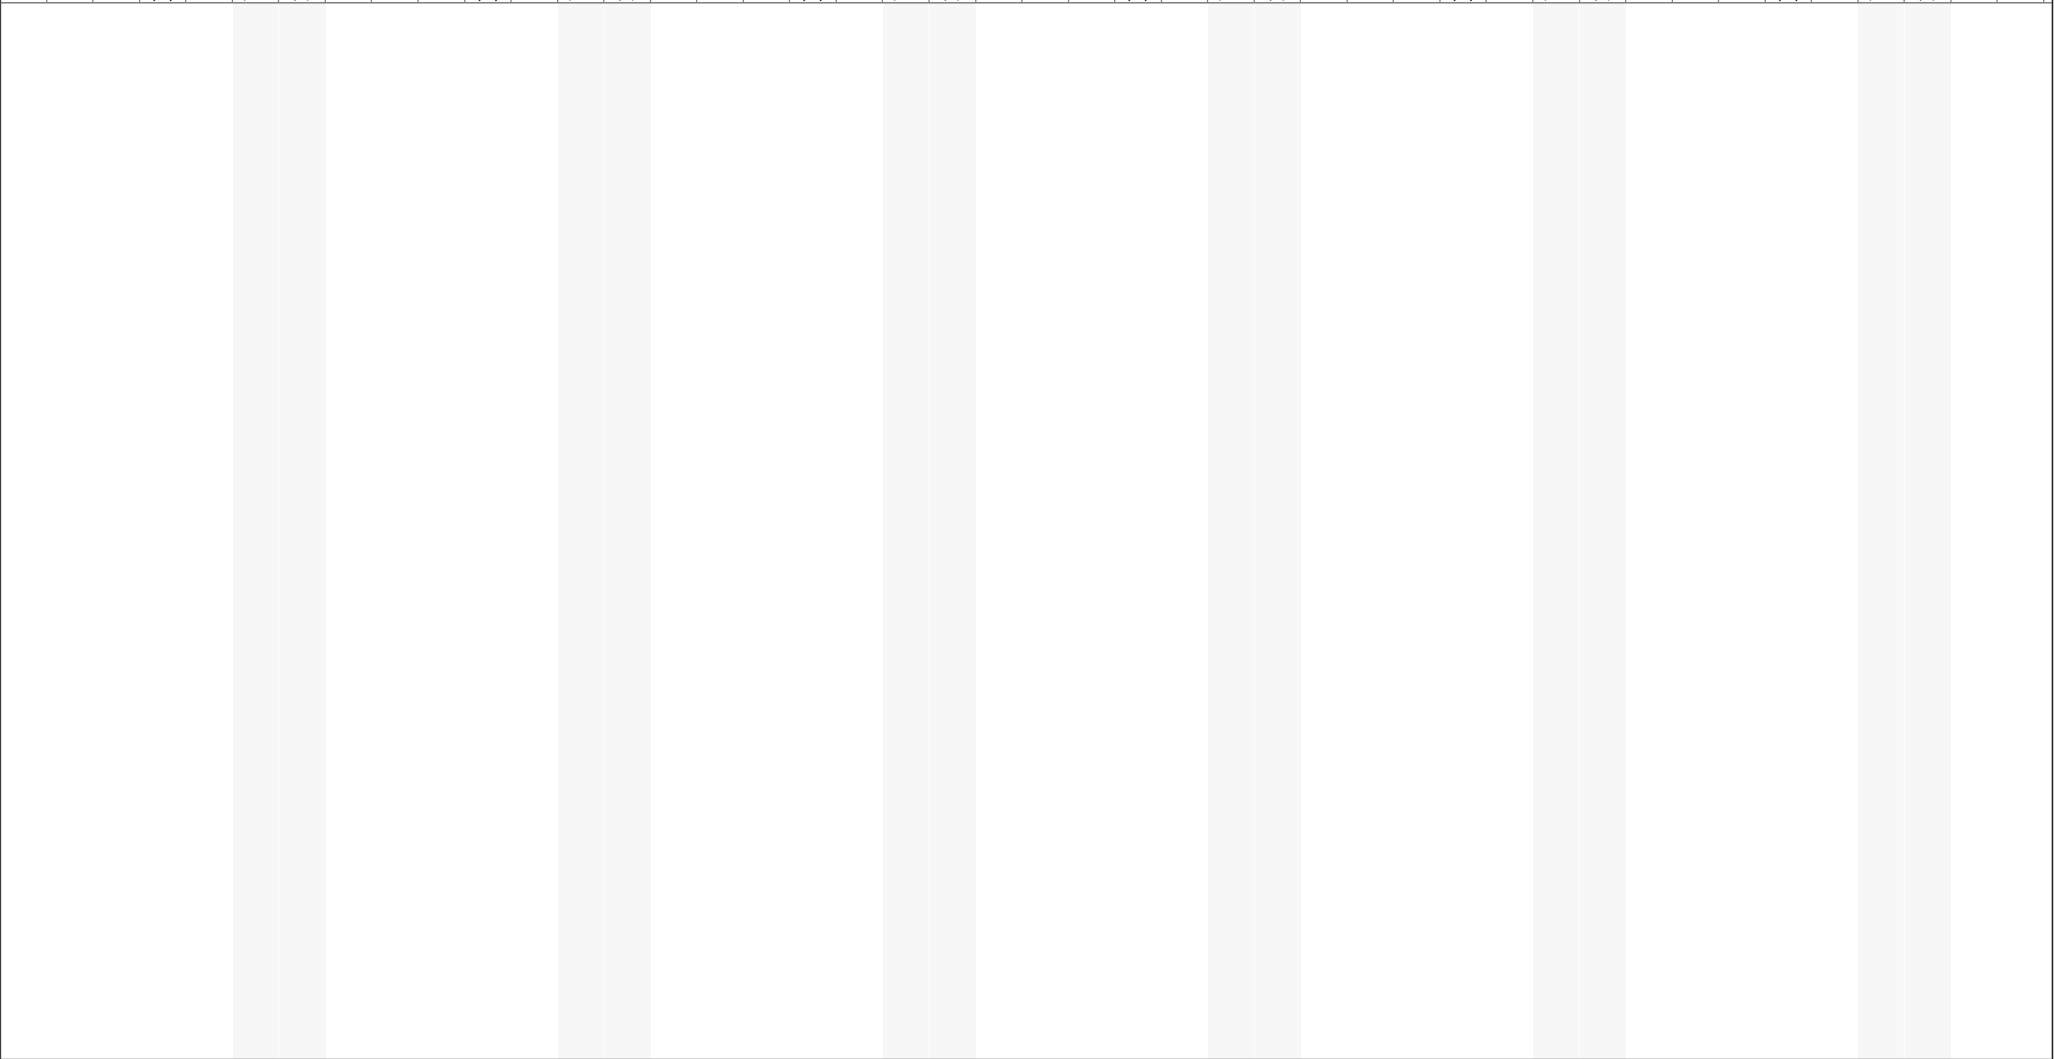

项目：msproj11  
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间



















仅完成时间


期限


进度

手动进度



项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			



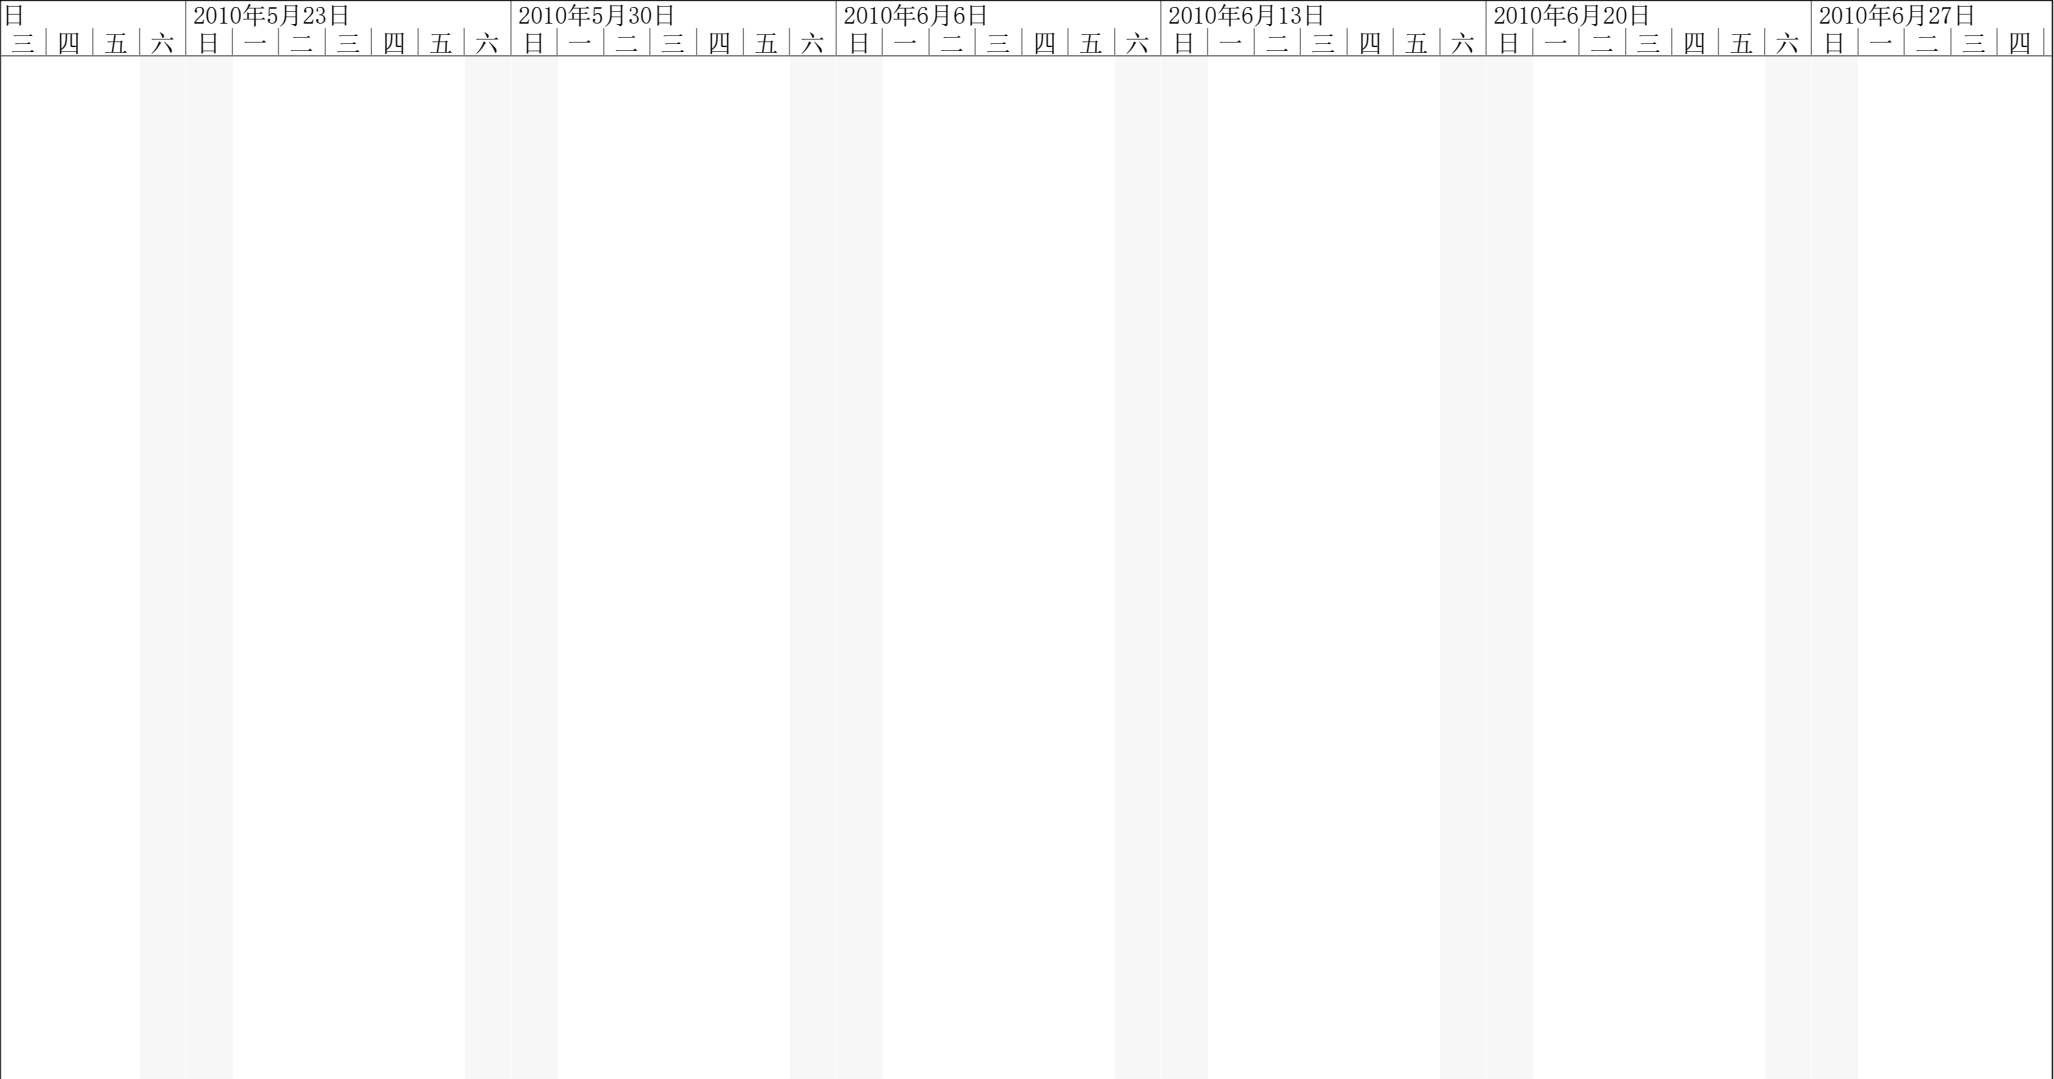

项目：msproj11  
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要



















仅开始时间

仅完成时间

期限

进度

手动进度

2010年7月4日							2010年7月11日							2010年7月18日							2010年7月25日							2010年8月1日							2010年8月8日								
五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六
项目：msproj11 日期：2019年6月19日							任务		外部任务		手动任务		仅完成时间																														
							拆分		外部里程碑		仅工期		期限																														
							里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度																														
							摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度																														
							项目摘要		非活动摘要		仅开始时间																																
第 13 页																																											



















[illegible]

项目：msproj11  
日期：2019年6月19日

任务	外部任务	手动任务	仅完成时间
拆分	外部里程碑	仅工期	期限
里程碑	非活动任务	手动摘要总成	进度
摘要	非活动里程碑	手动摘要	手动进度
项目摘要	非活动摘要	仅开始时间	

[illegible]


项目: msproj11  
日期: 2019年6月19日

任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			

[illegible]

项目: msproj11 日期: 2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			



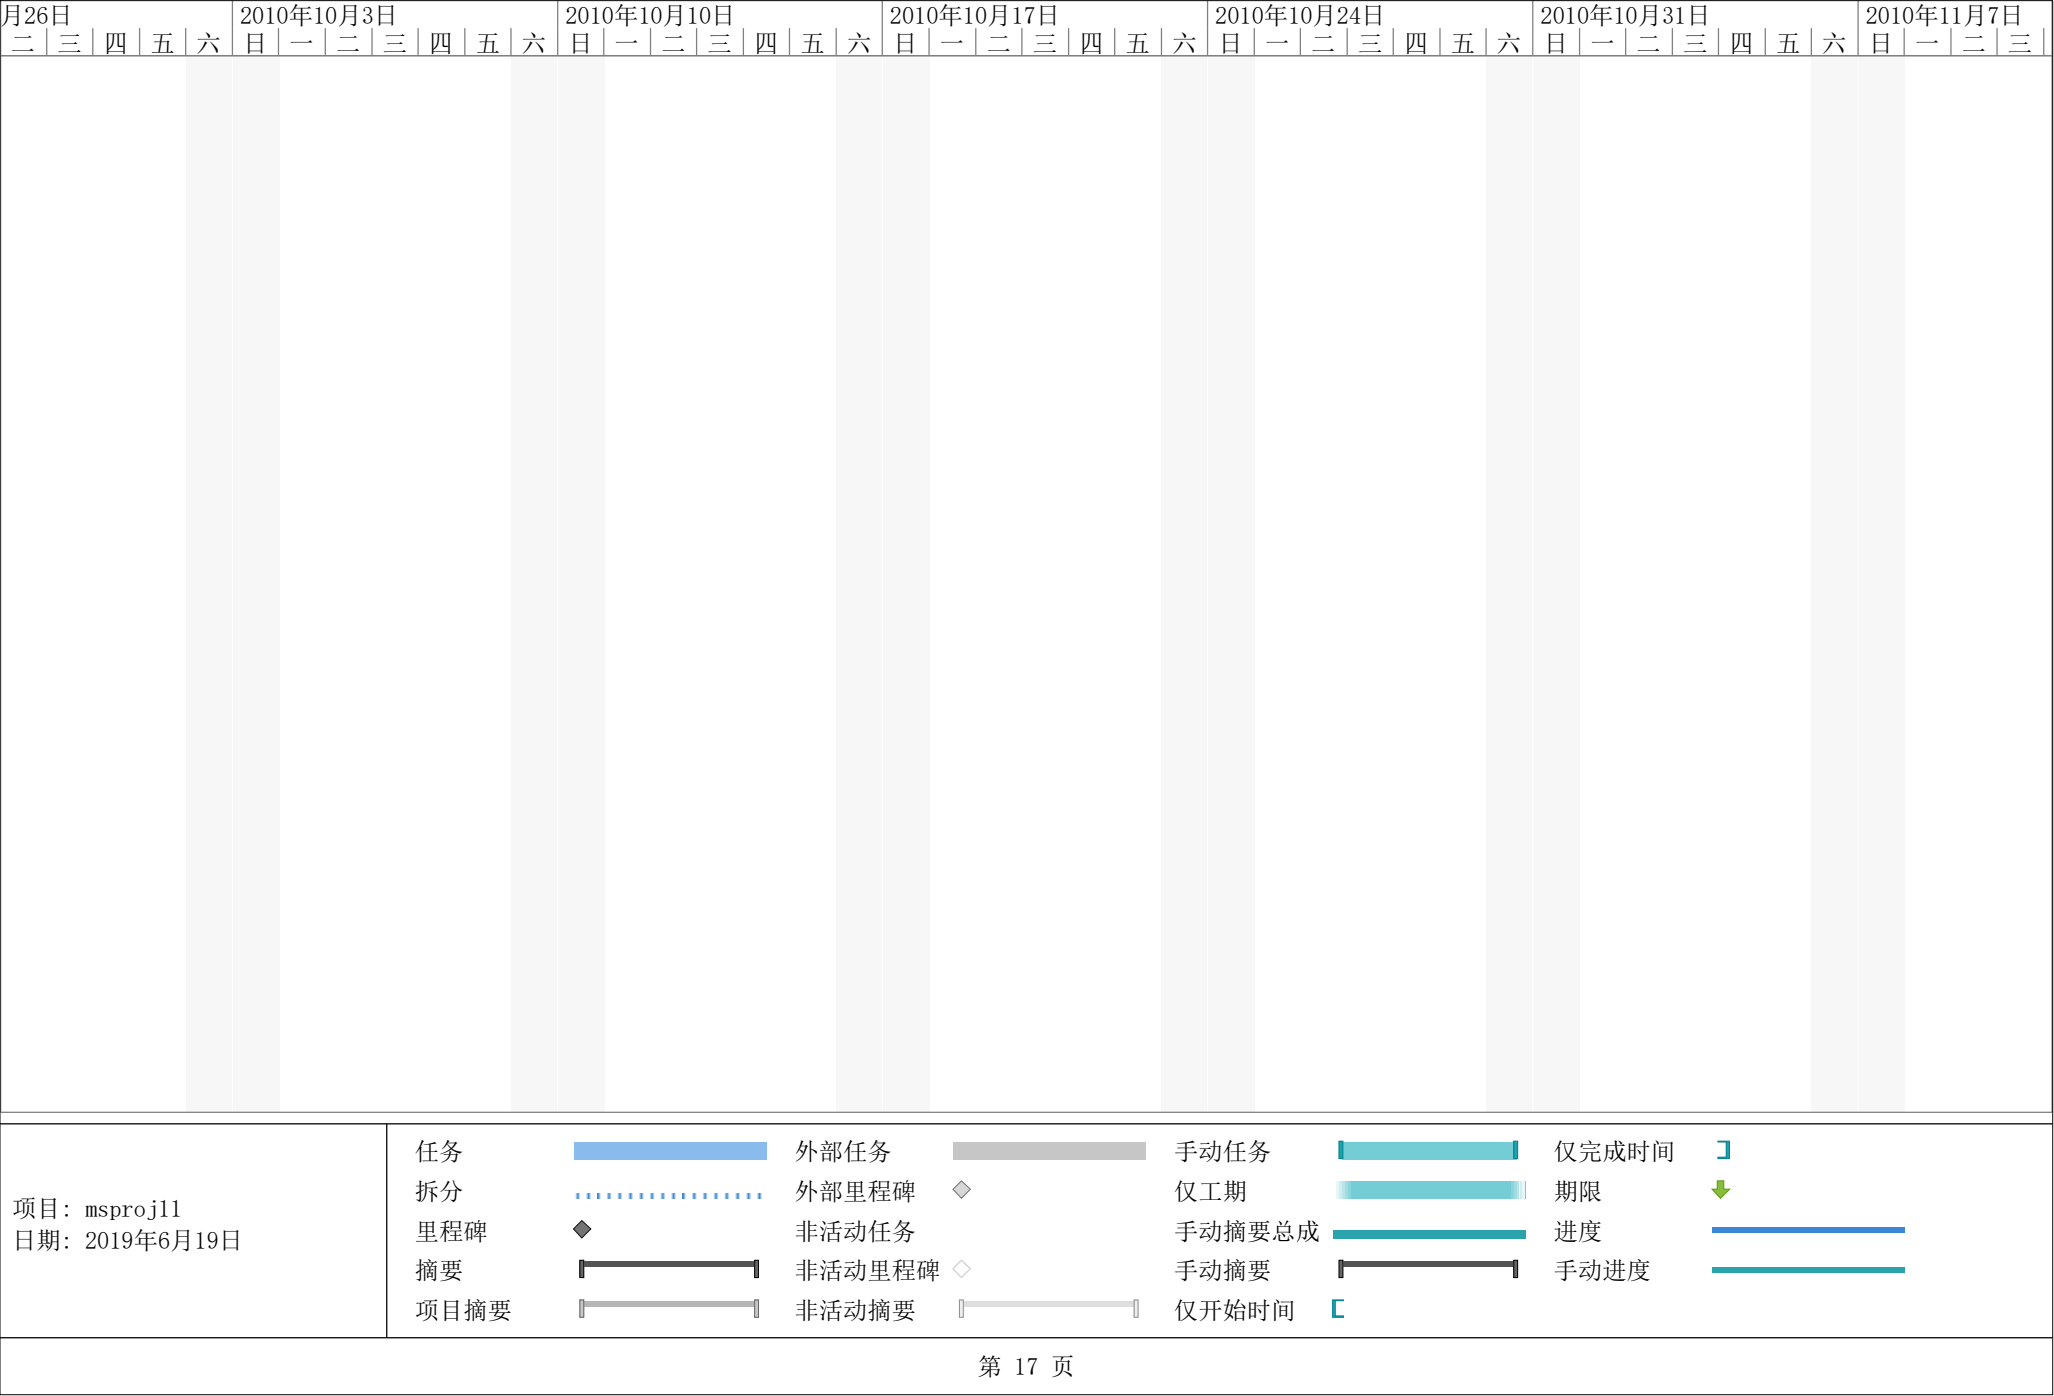



项目：msproj11  
日期：2019年6月19日


任务


拆分


里程碑


摘要


项目摘要












外部任务


外部里程碑


非活动任务


非活动里程碑


非活动摘要












手动任务


仅工期


手动摘要总成


手动摘要


仅开始时间













仅完成时间


期限


进度

手动进度










[illegible]

项目: msproj11 日期: 2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			

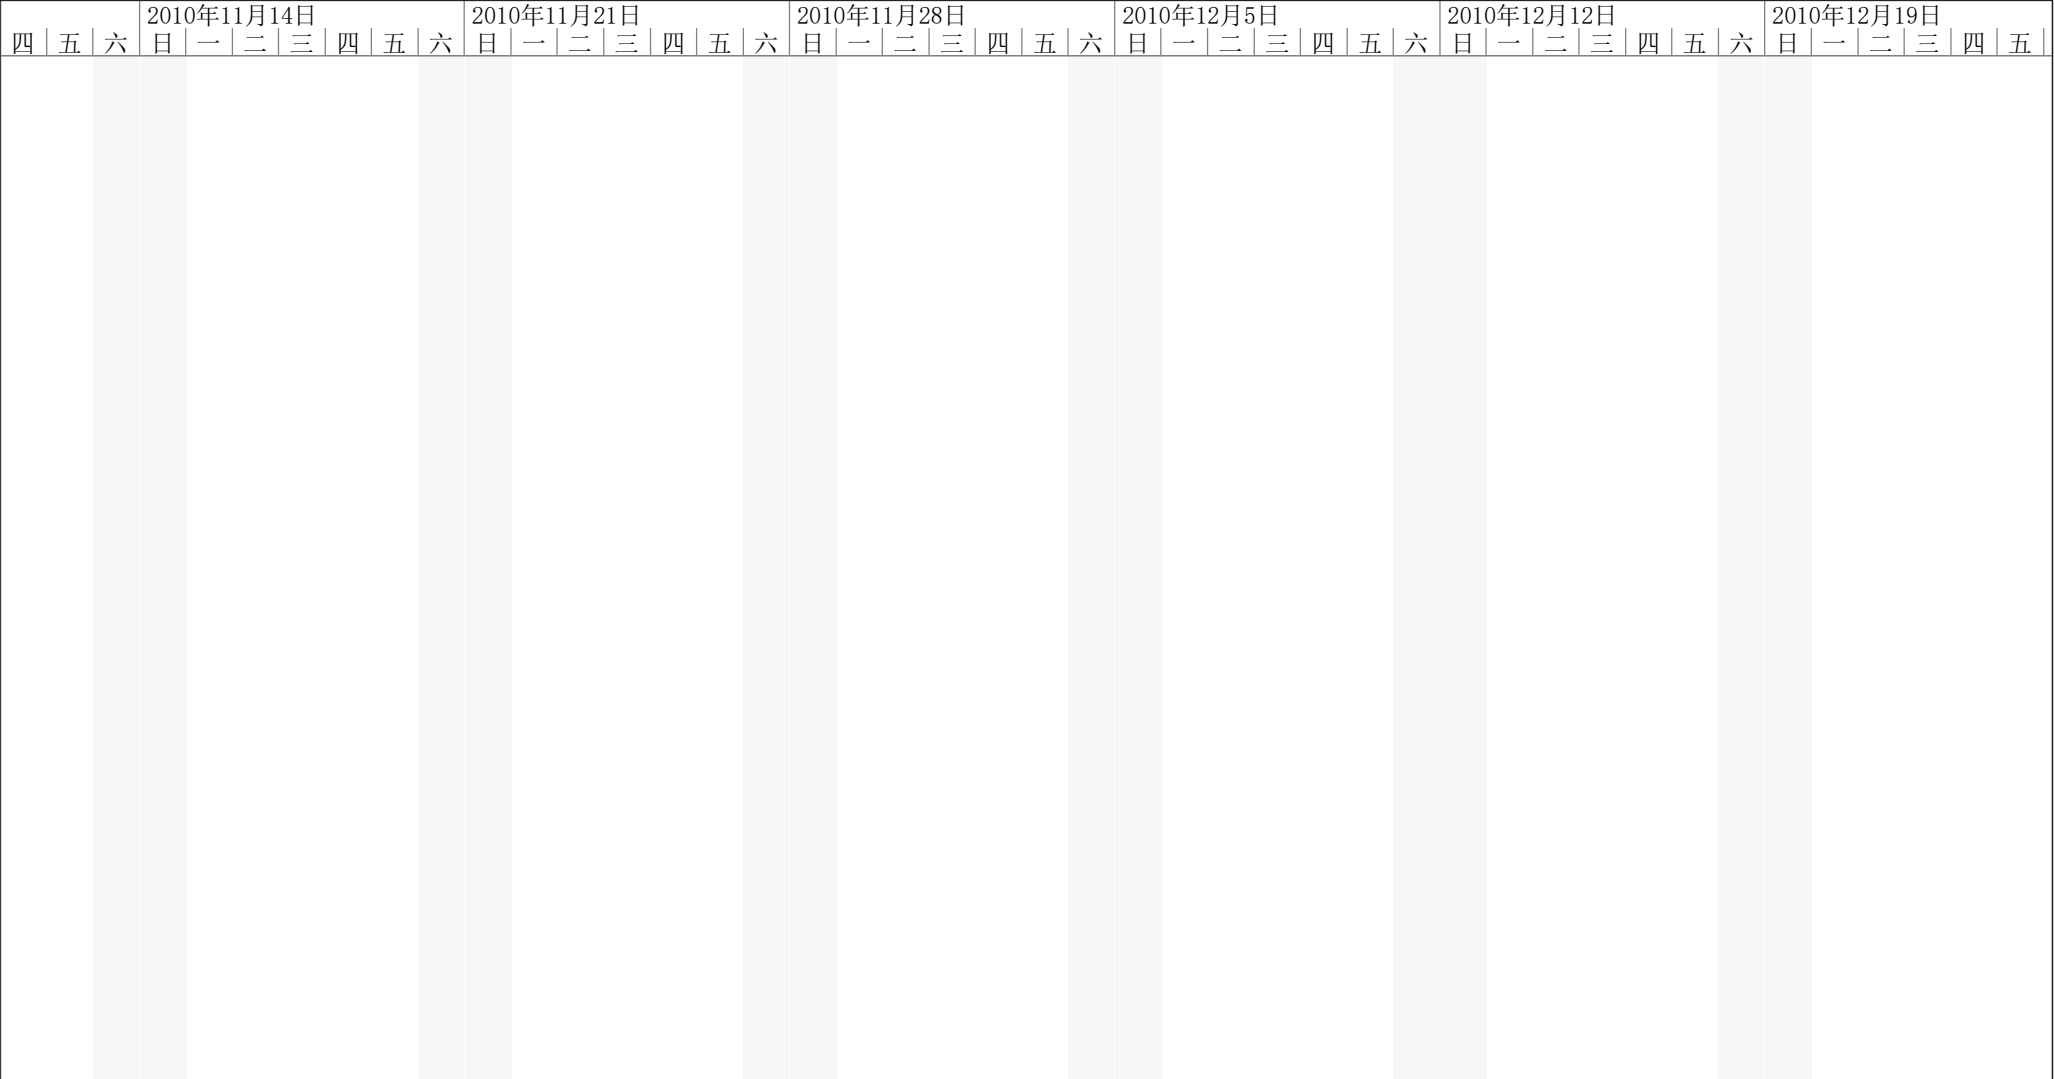

项目：msproj11  
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

◆

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

◇

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

期限

进度

手动进度


手动任务







仅工期

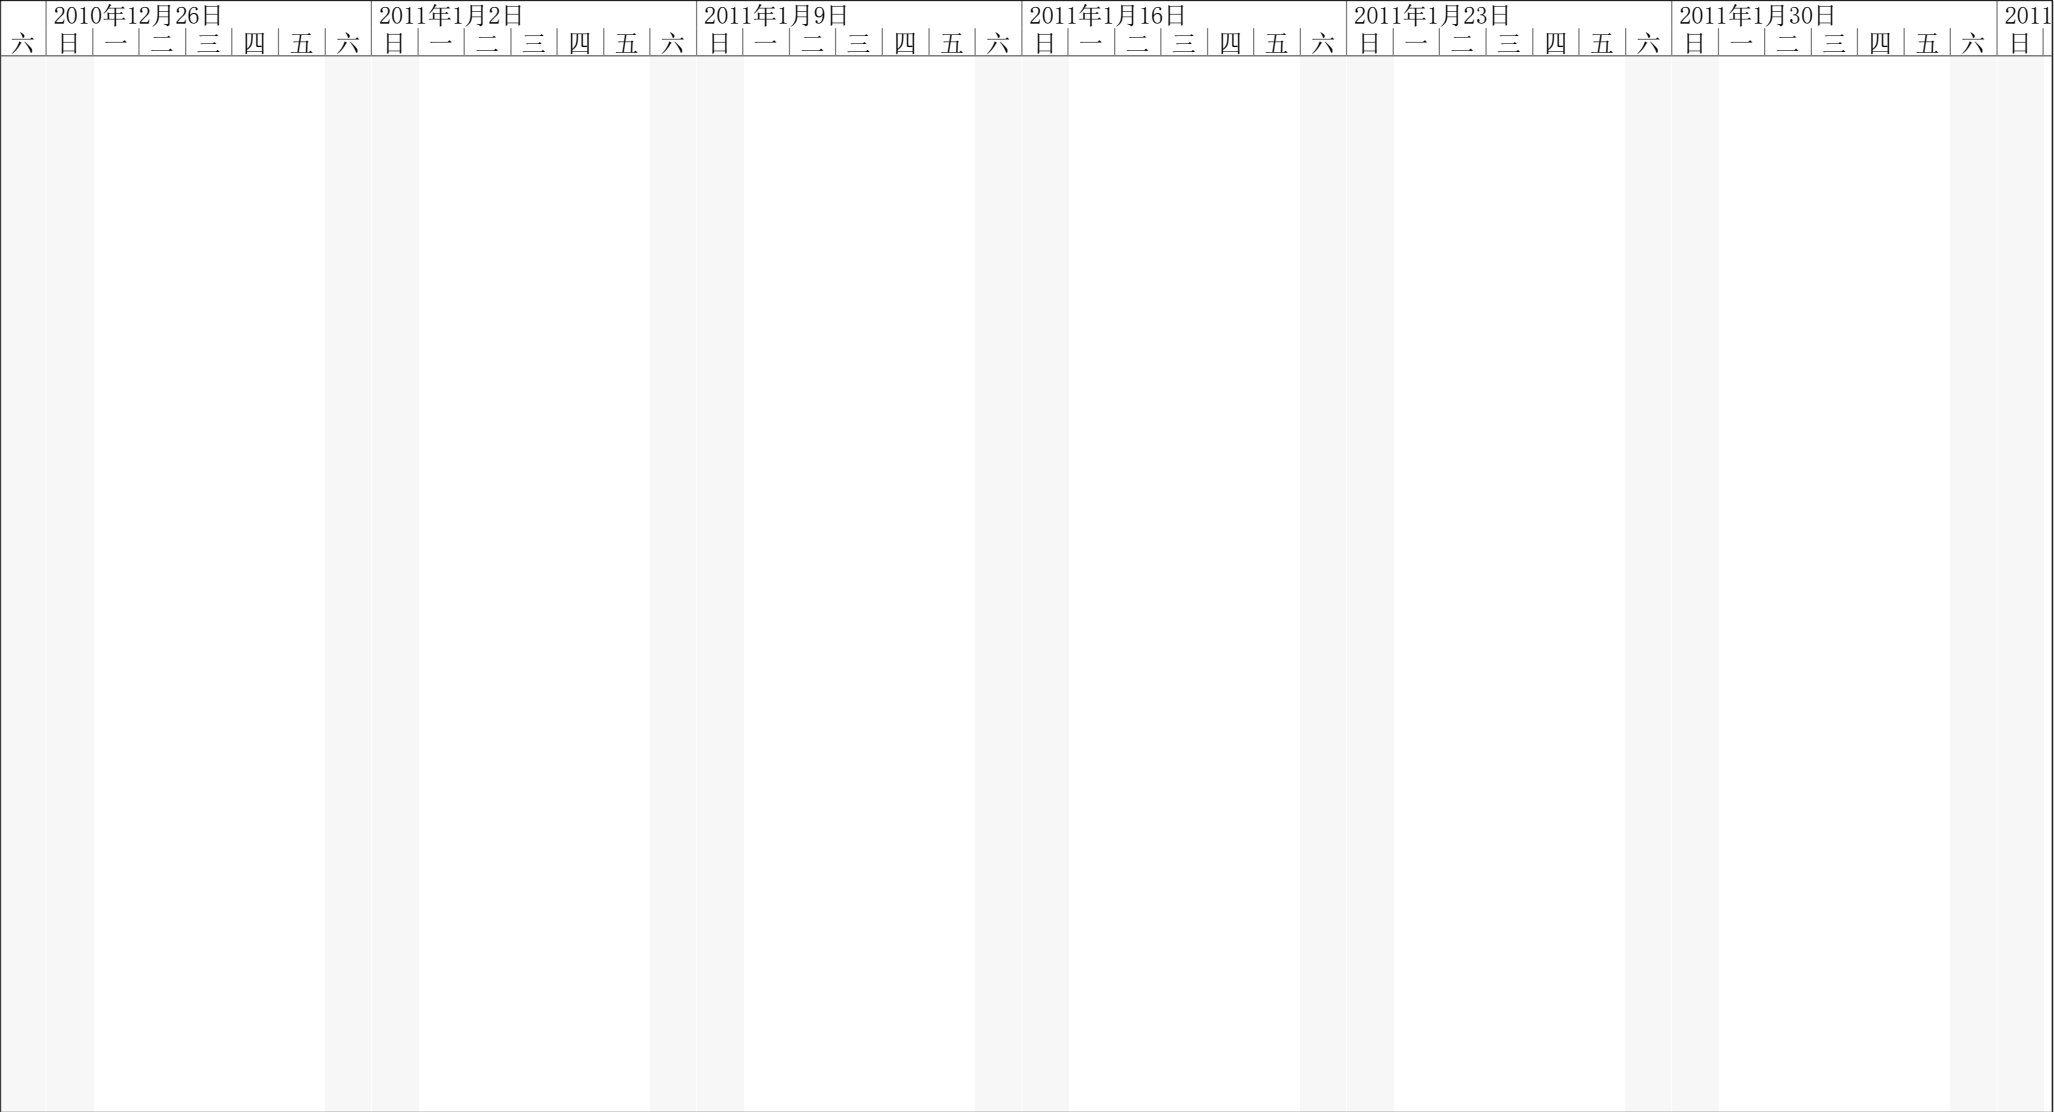
手动摘要总成








手动摘要

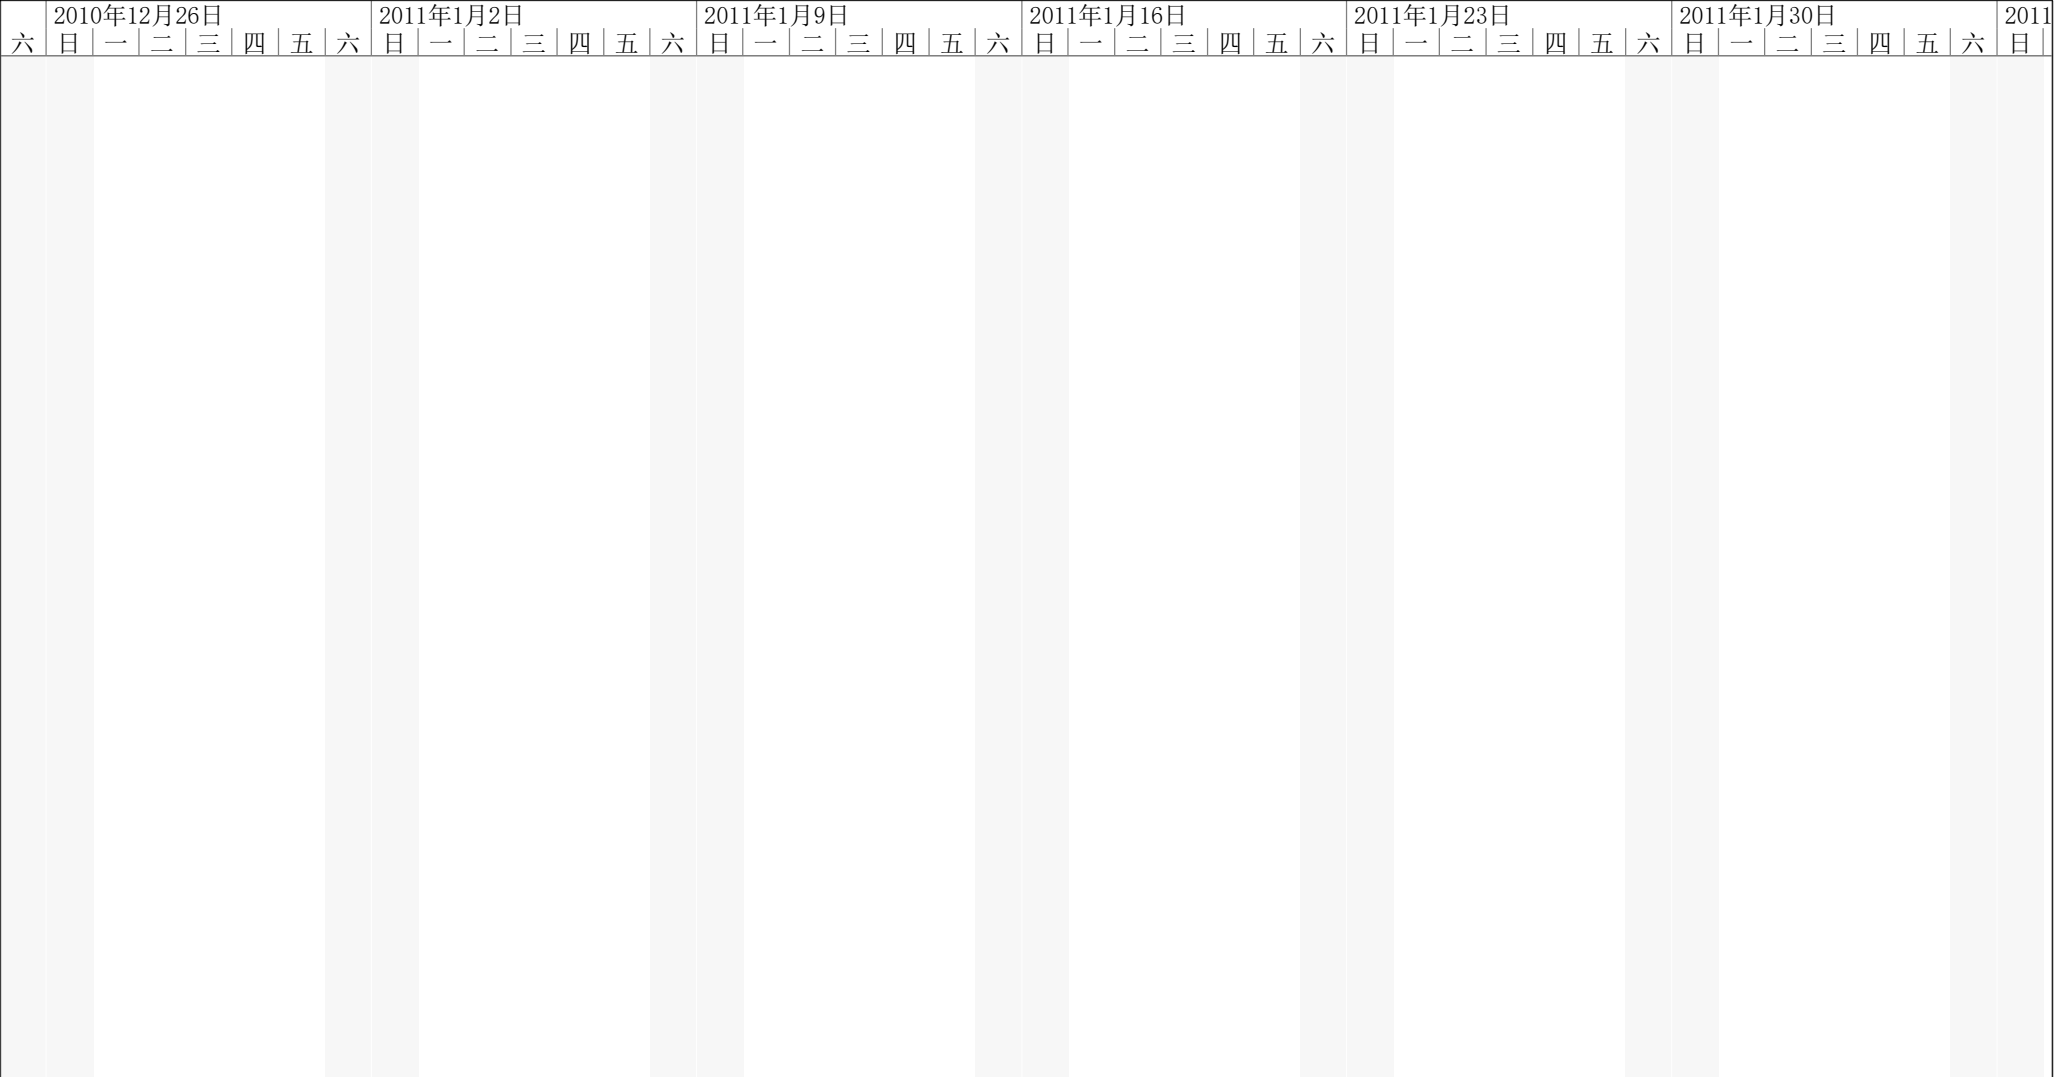仅开始时间



项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			



项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			



项目：msproj11  
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

◆

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

◆

◇

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

期限

进度

手动进度



















┌

└


└


┌



项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			





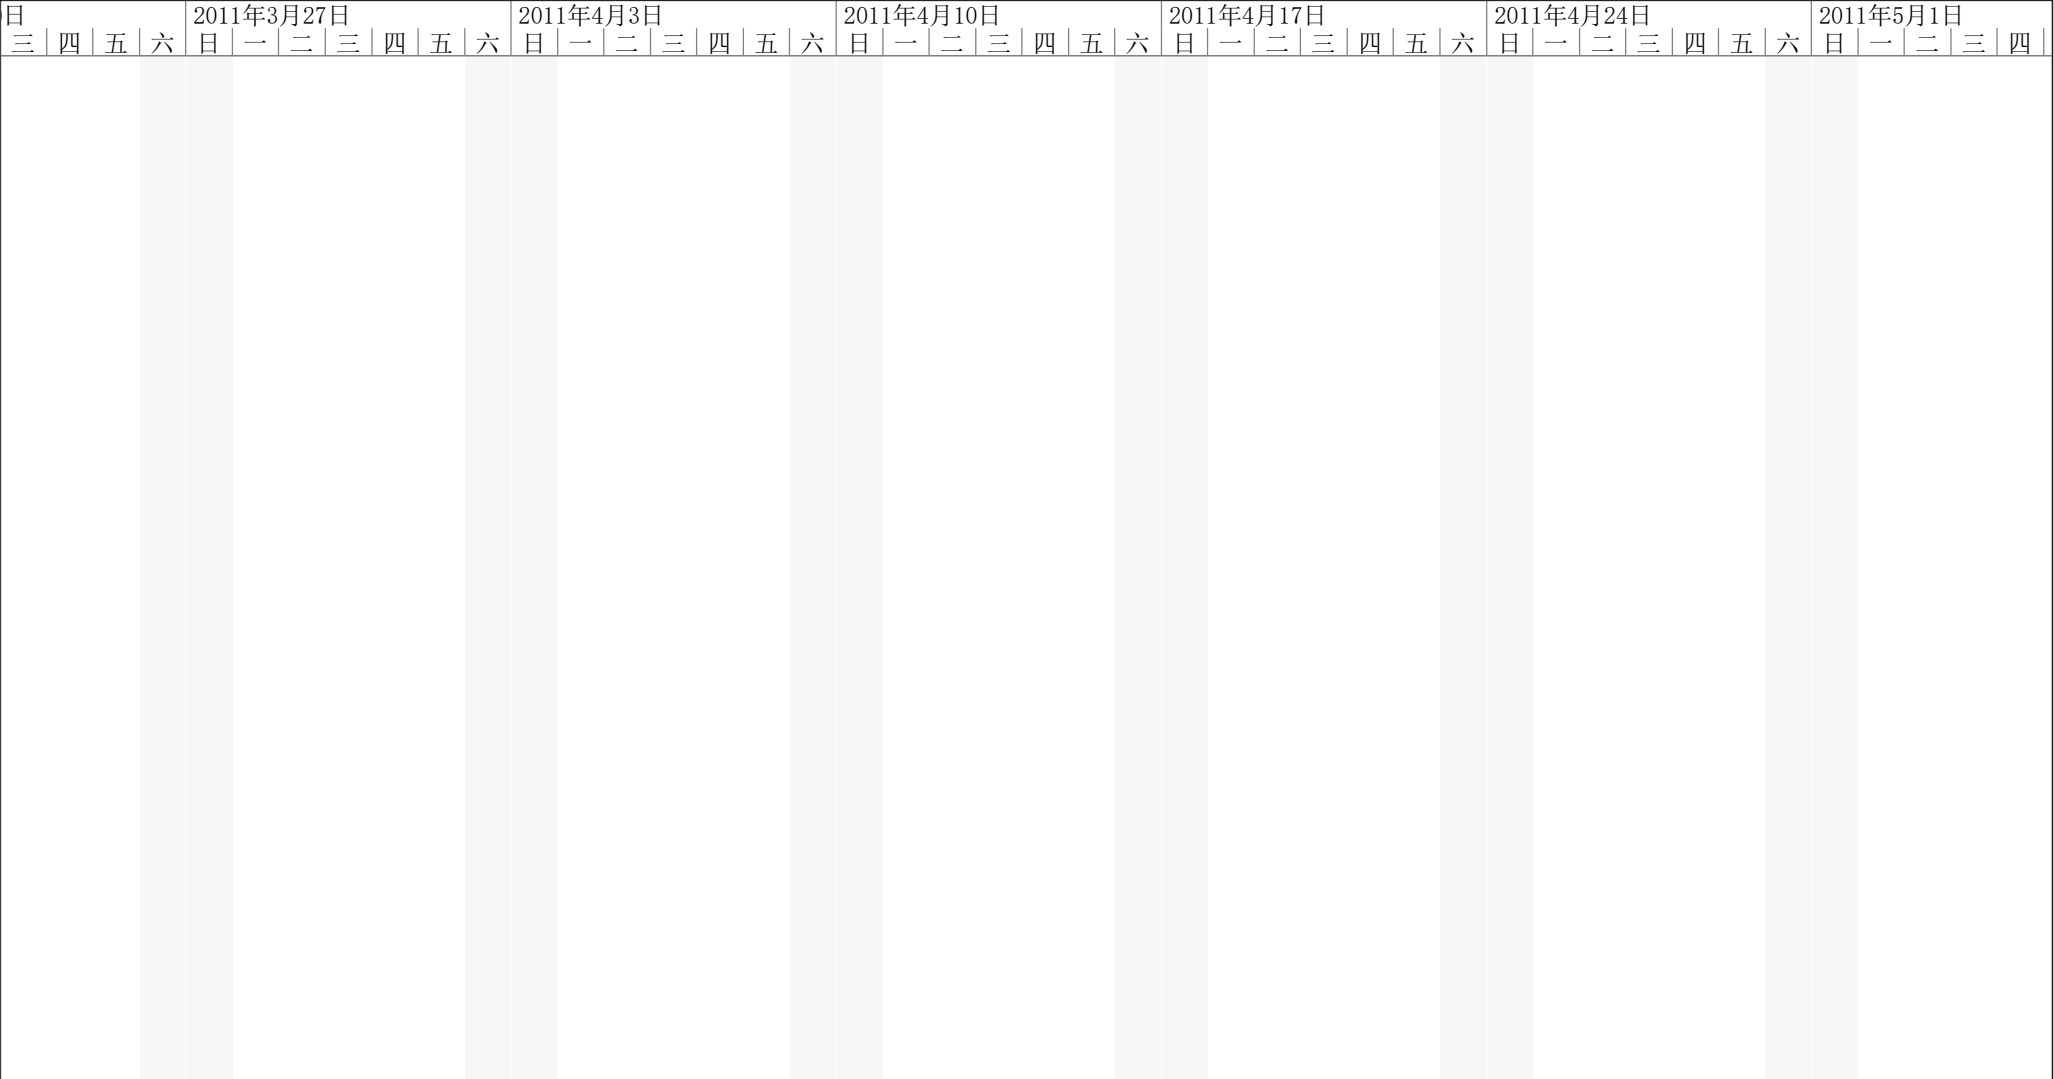

项目：msproj11  
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

◆

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

◇

◇

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

期限

进度

手动进度

↓

五	六	2011年5月8日							2011年5月15日							2011年5月22日							2011年5月29日							2011年6月5日							2011年6月12日						
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六		

[illegible]








项目：msproj11  
日期：2019年6月19日

任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			



项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			



项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			

月31日  
二 三 四 五 六

2011年8月7日  
日 一 二 三 四 五 六

2011年8月14日  
日 一 二 三 四 五 六

2011年8月21日  
日 一 二 三 四 五 六

2011年8月28日  
日 一 二 三 四 五 六

2011年9月4日  
日 一 二 三 四 五 六

2011年9月11日  
日 一 二 三

项目：msproj11  
日期：2019年6月19日

任务  
拆分  
里程碑  
摘要  
项目摘要



















外部任务  
外部里程碑  
非活动任务  
非活动里程碑  
非活动摘要

手动任务  
仅工期  
手动摘要总成  
手动摘要  
仅开始时间

仅完成时间  
期限  
进度  
手动进度






















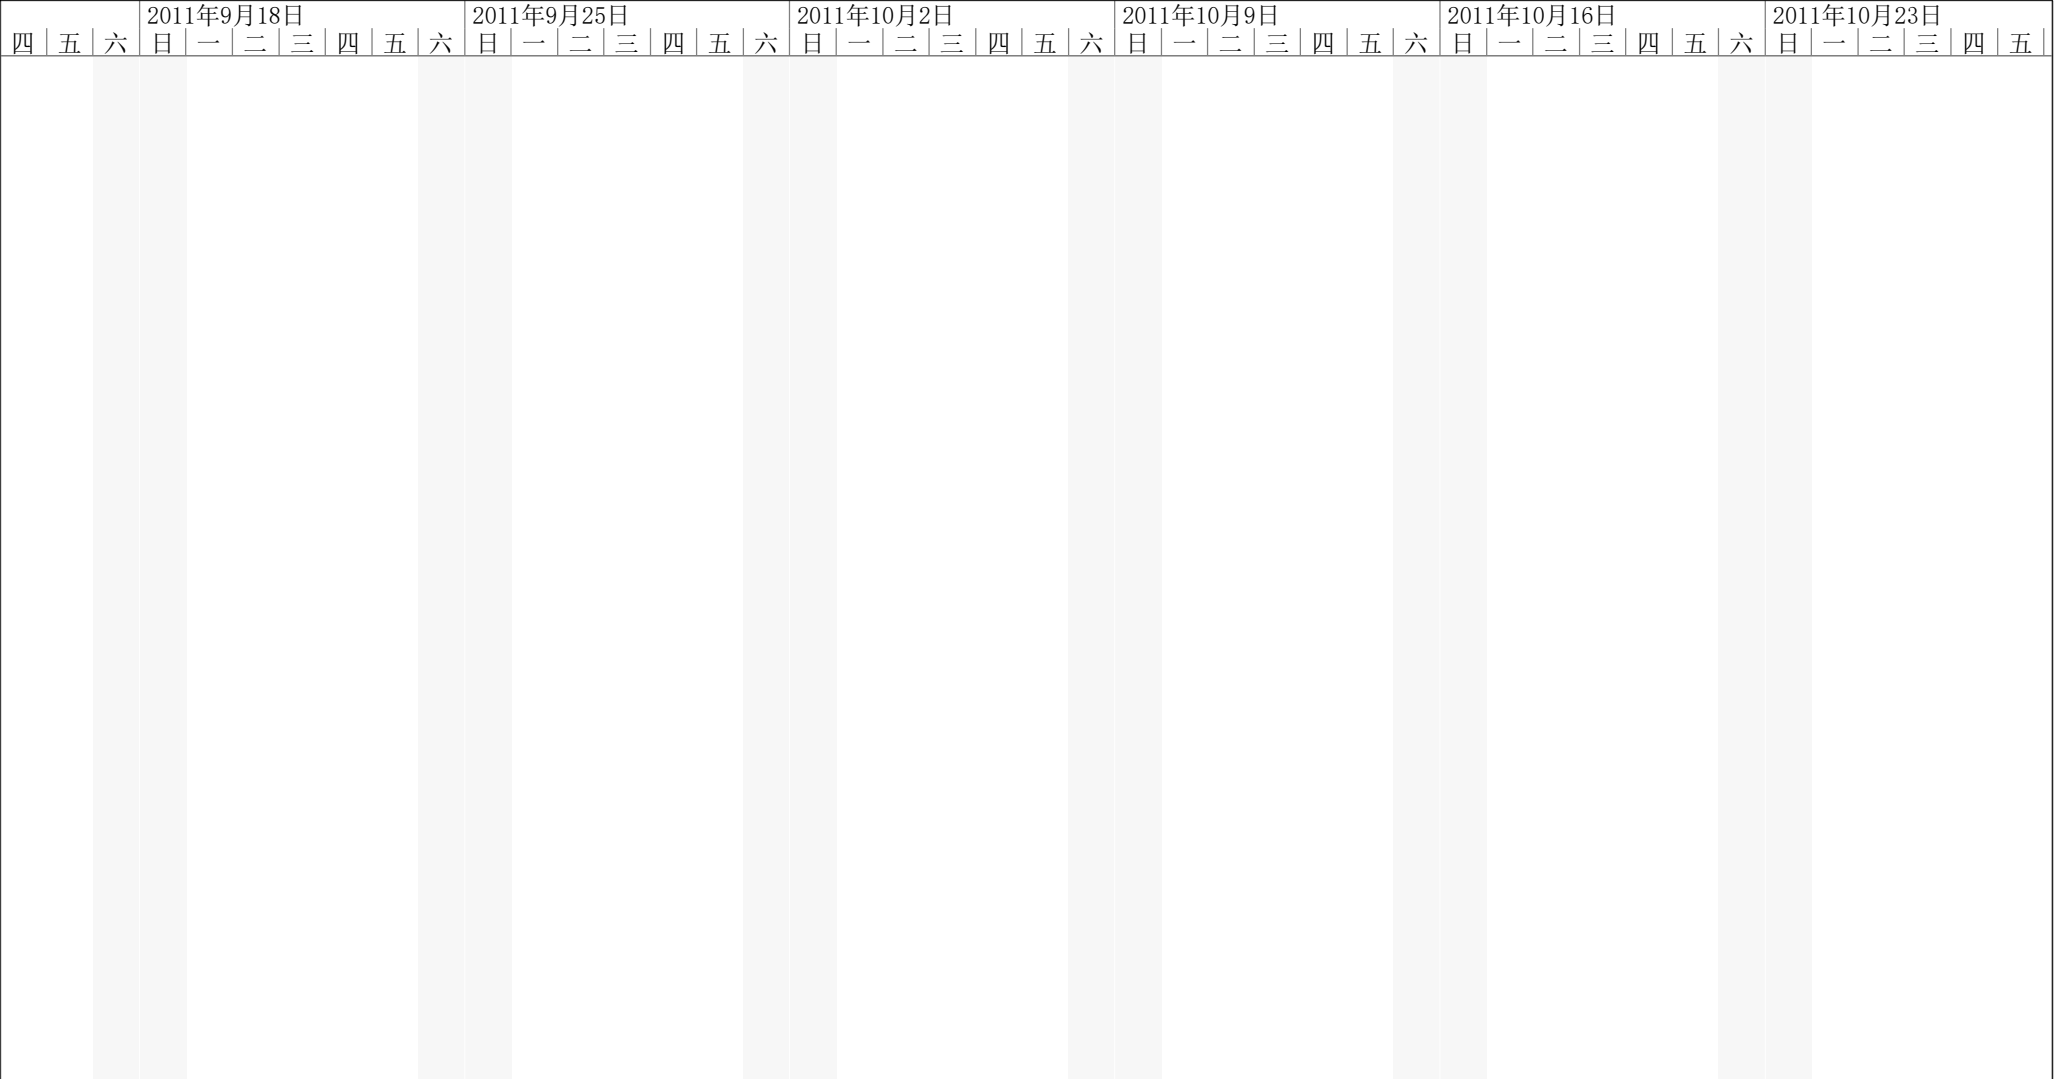
项目：msproj11  
日期：2019年6月19日

任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			



[illegible]

项目: msproj11 日期: 2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			



项目：msproj11  
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间



















期限


进度

手动进度





项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			

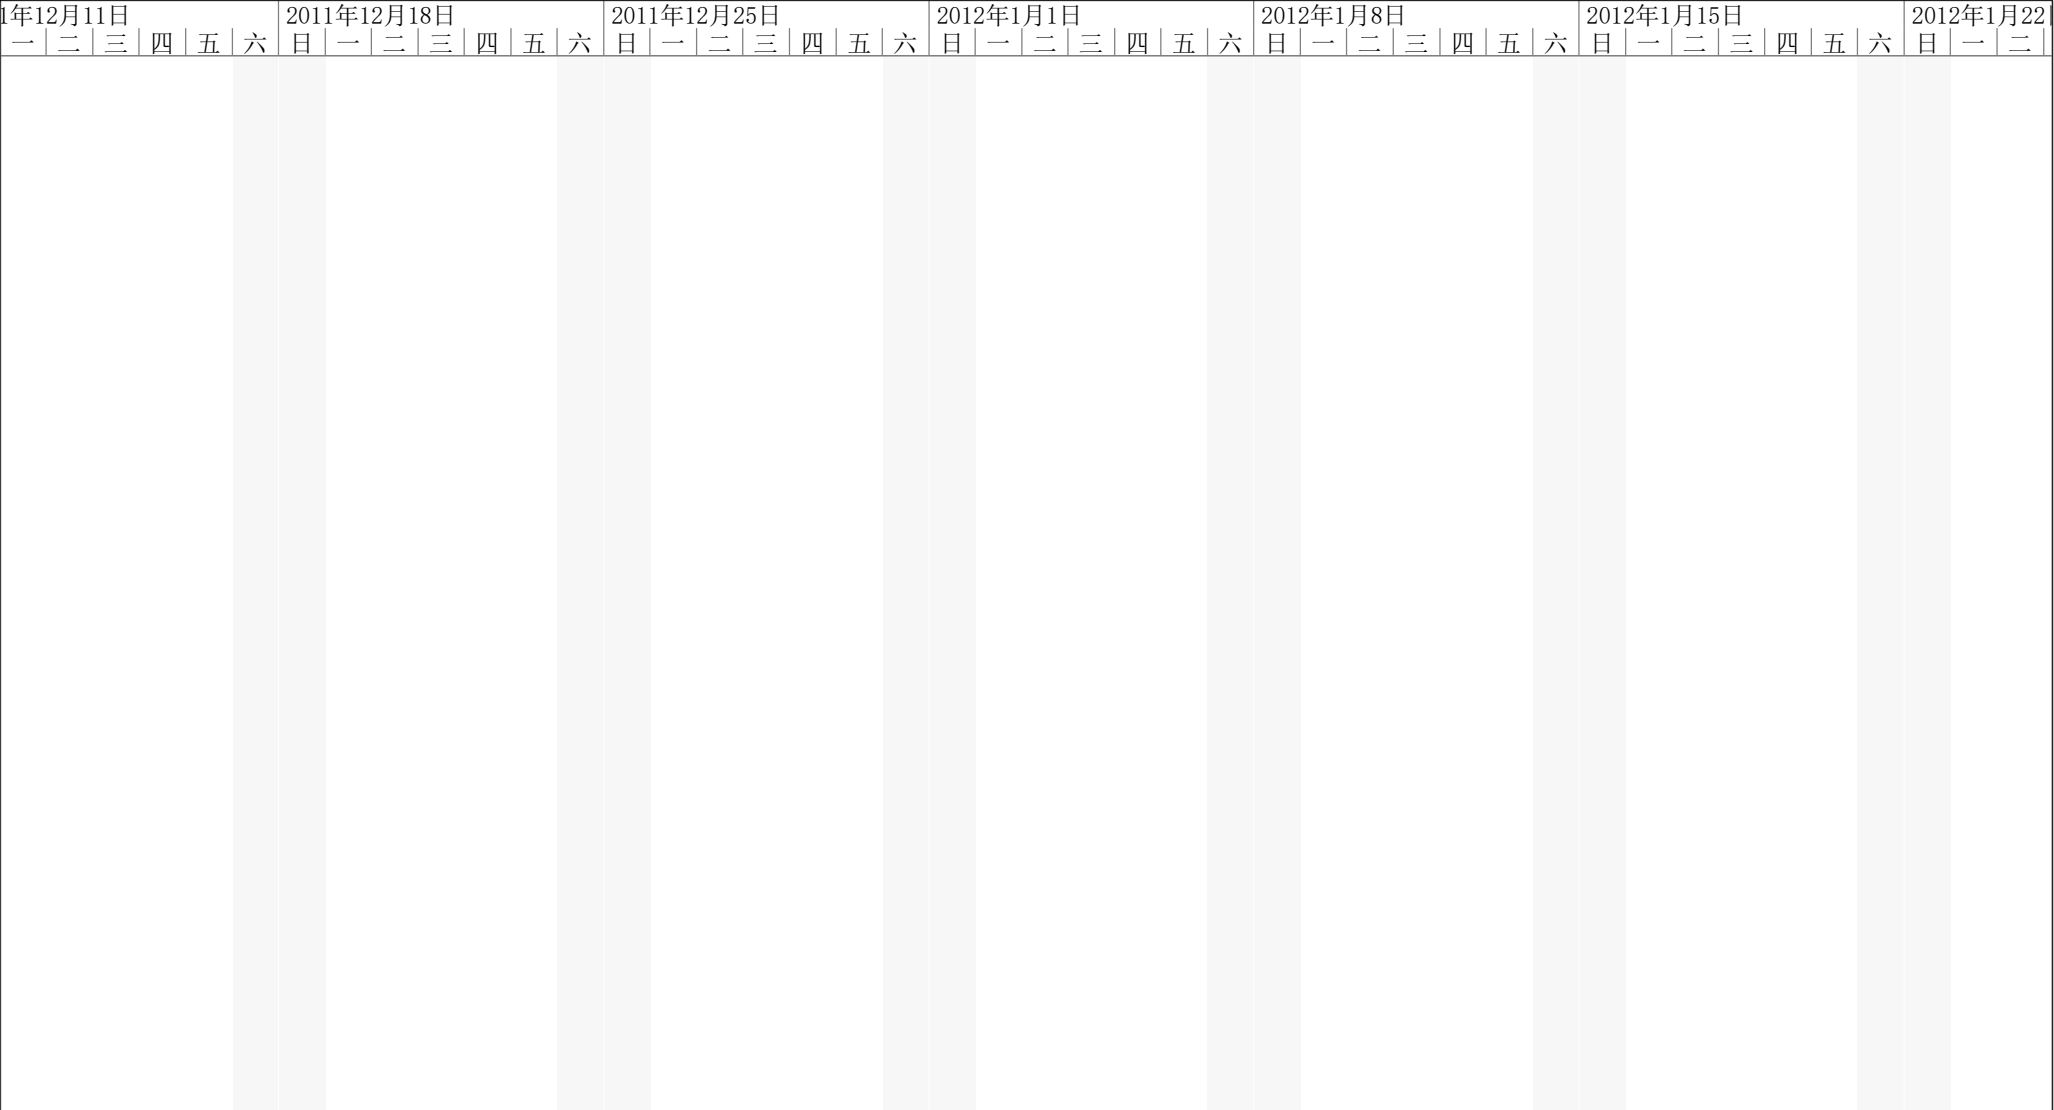

项目：msproj11  
日期：2019年6月19日


任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要











外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要









手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要


仅开始时间











仅完成时间


期限

进度

手动进度






























项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			





项目：msproj11  
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间


仅完成时间


期限

进度

手动进度





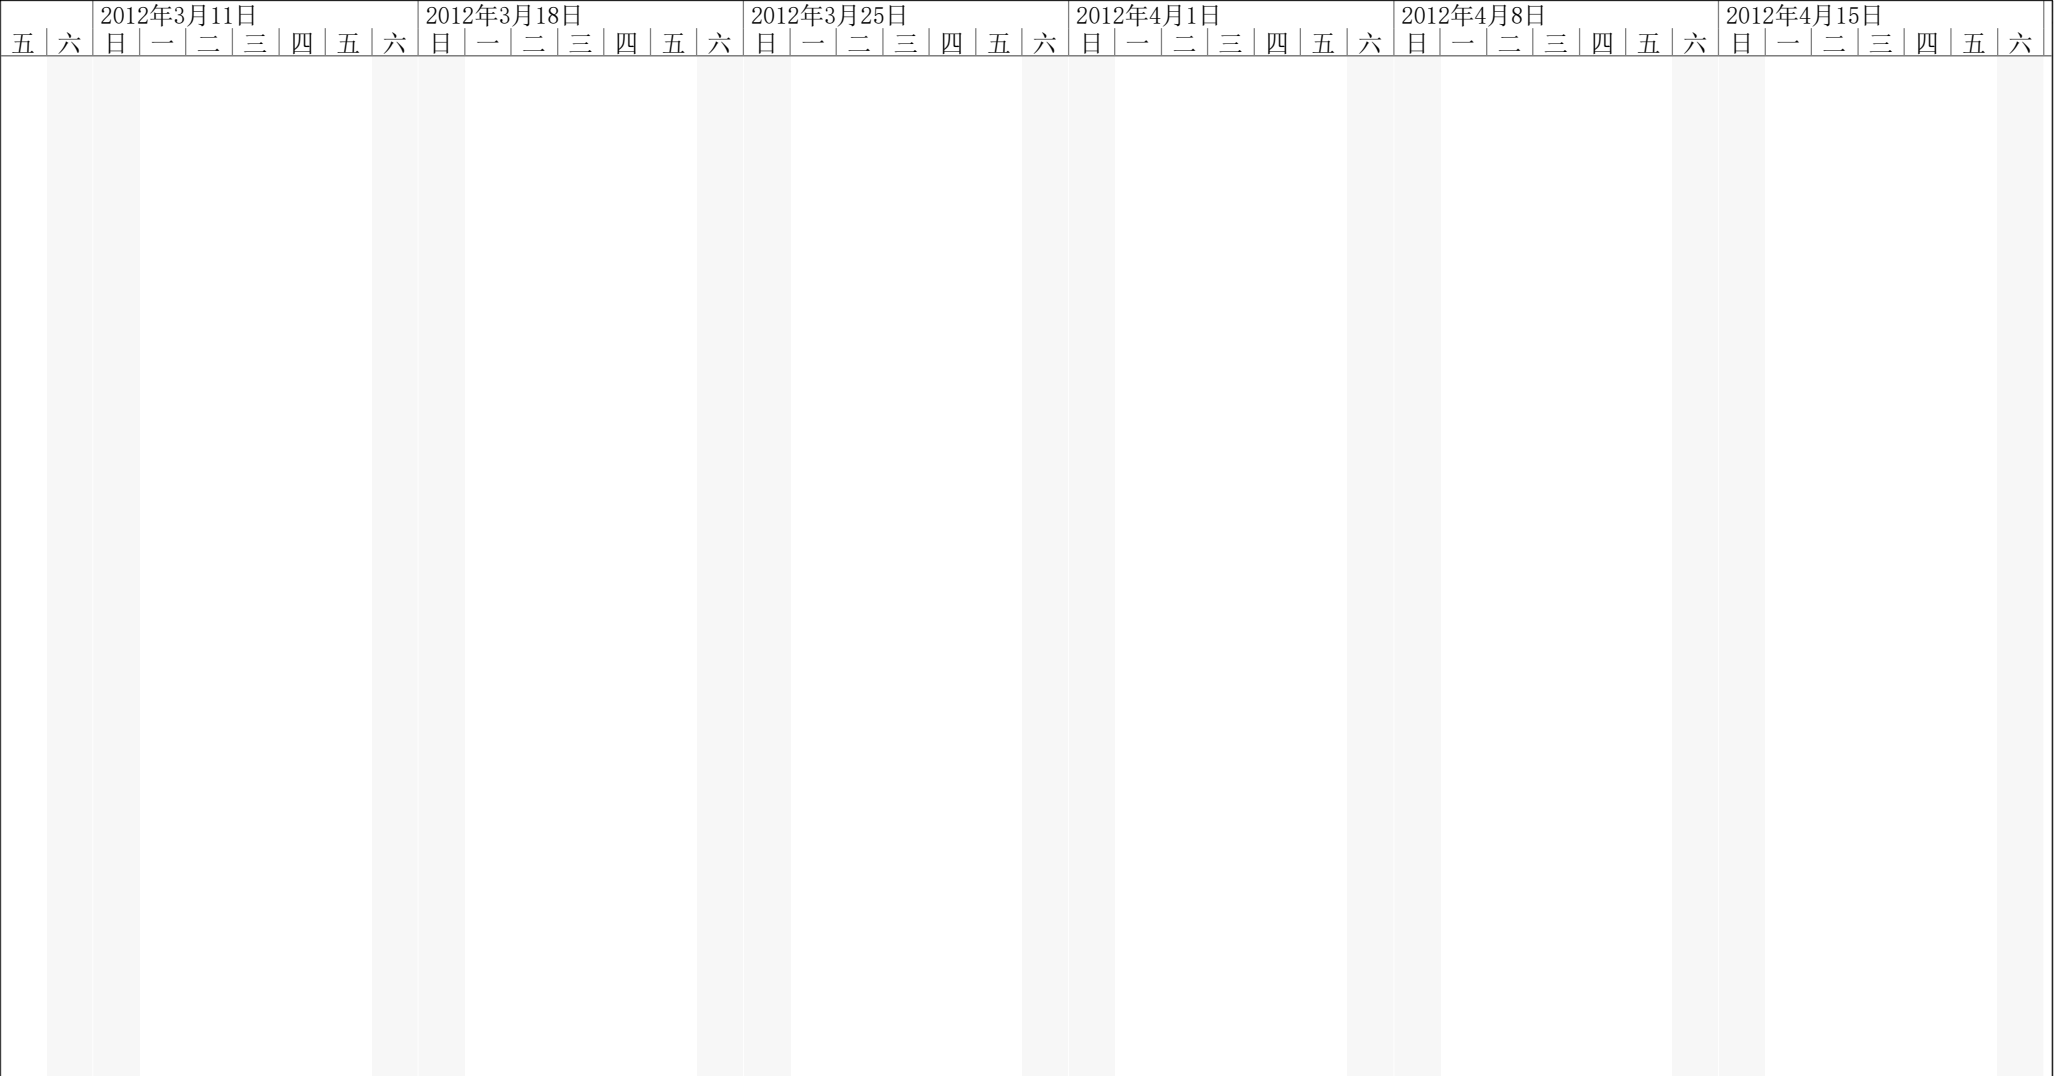

项目：msproj11  
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间










仅完成时间

期限

进度


手动进度



项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			



项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			





项目：msproj11  
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

◆

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

◇

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间


仅完成时间


期限

进度

手动进度

↓

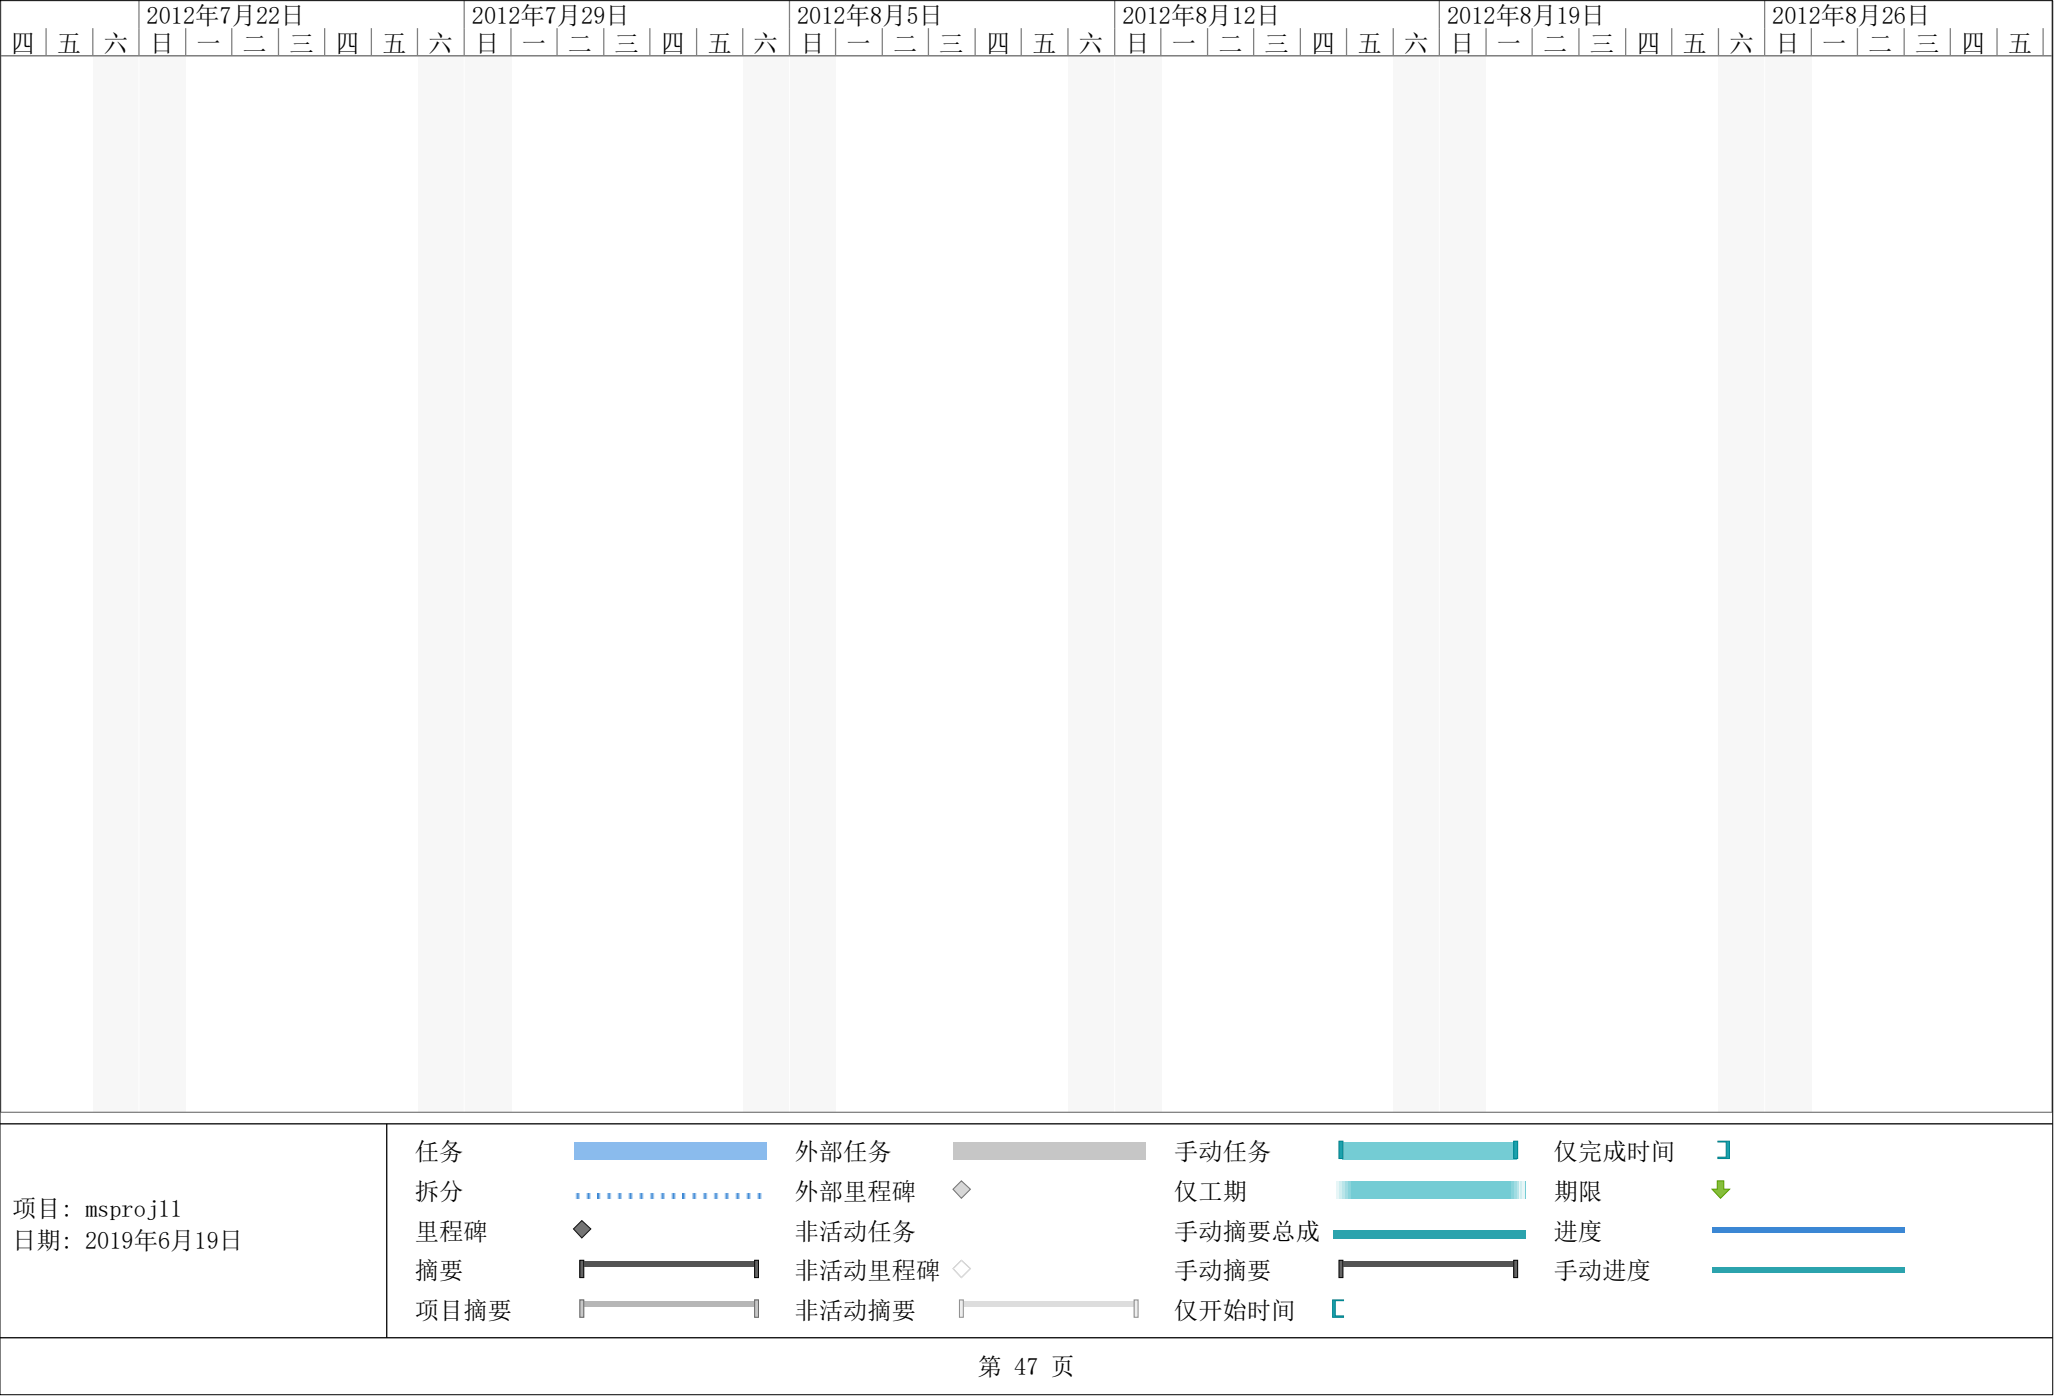

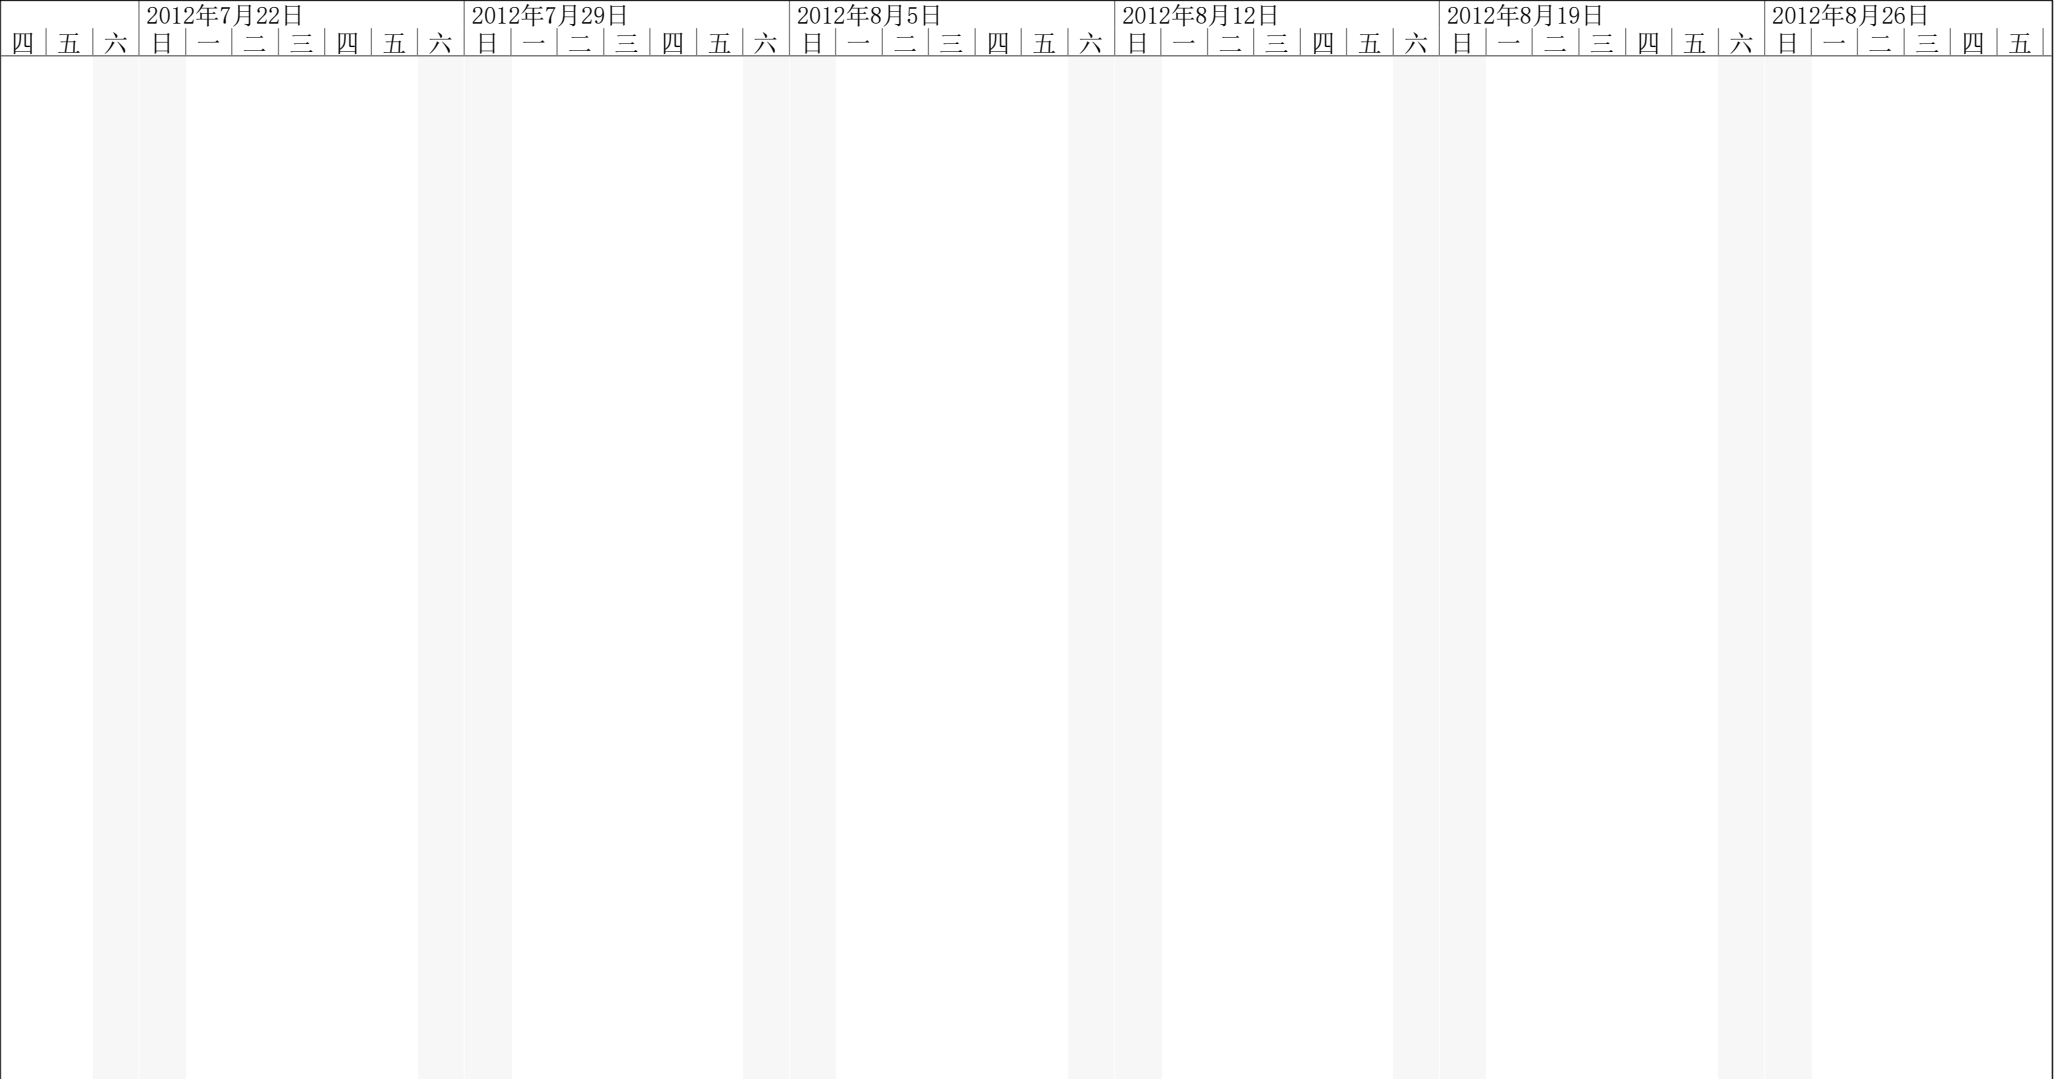

项目：msproj11  
日期：2019年6月19日


任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要











外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要









手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间











仅完成时间

期限

进度

手动进度












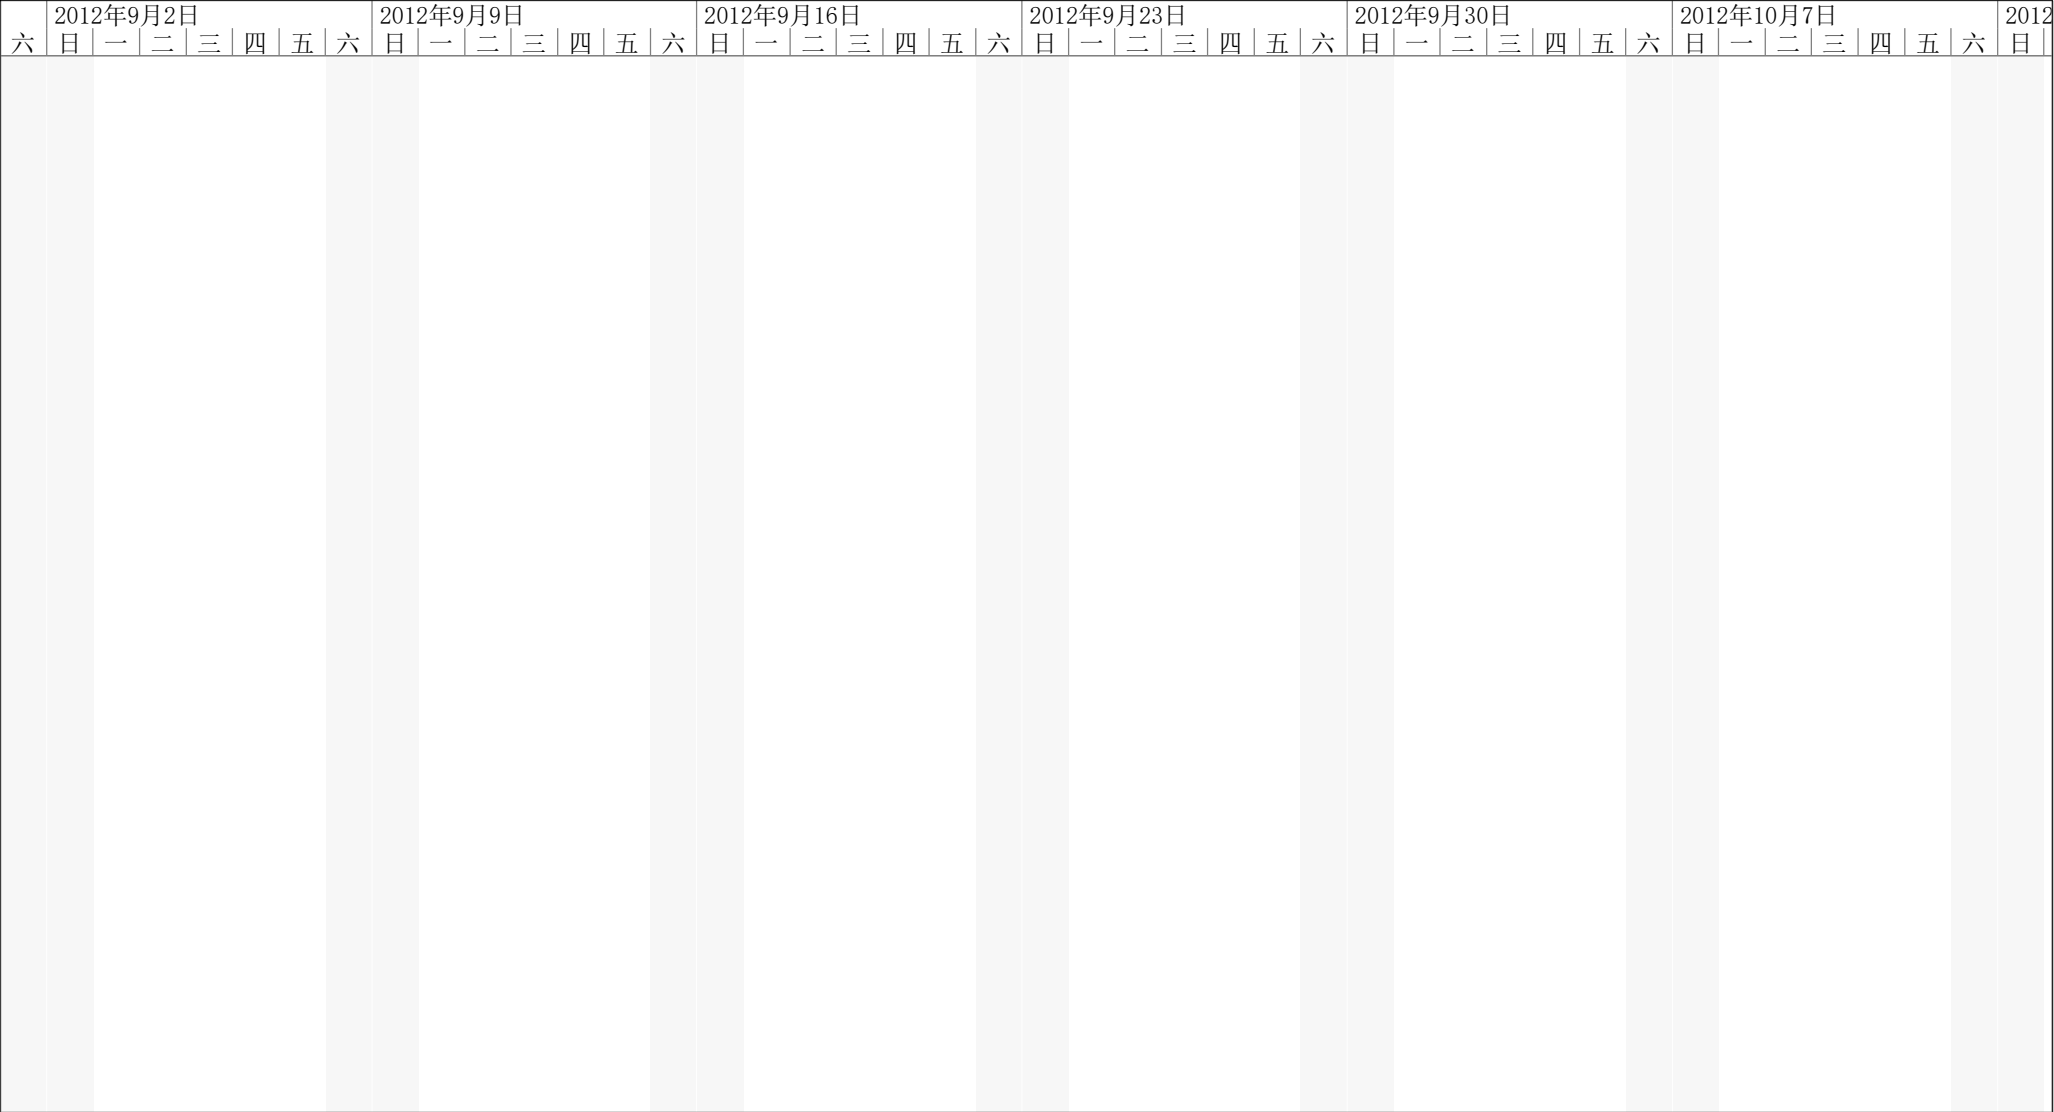


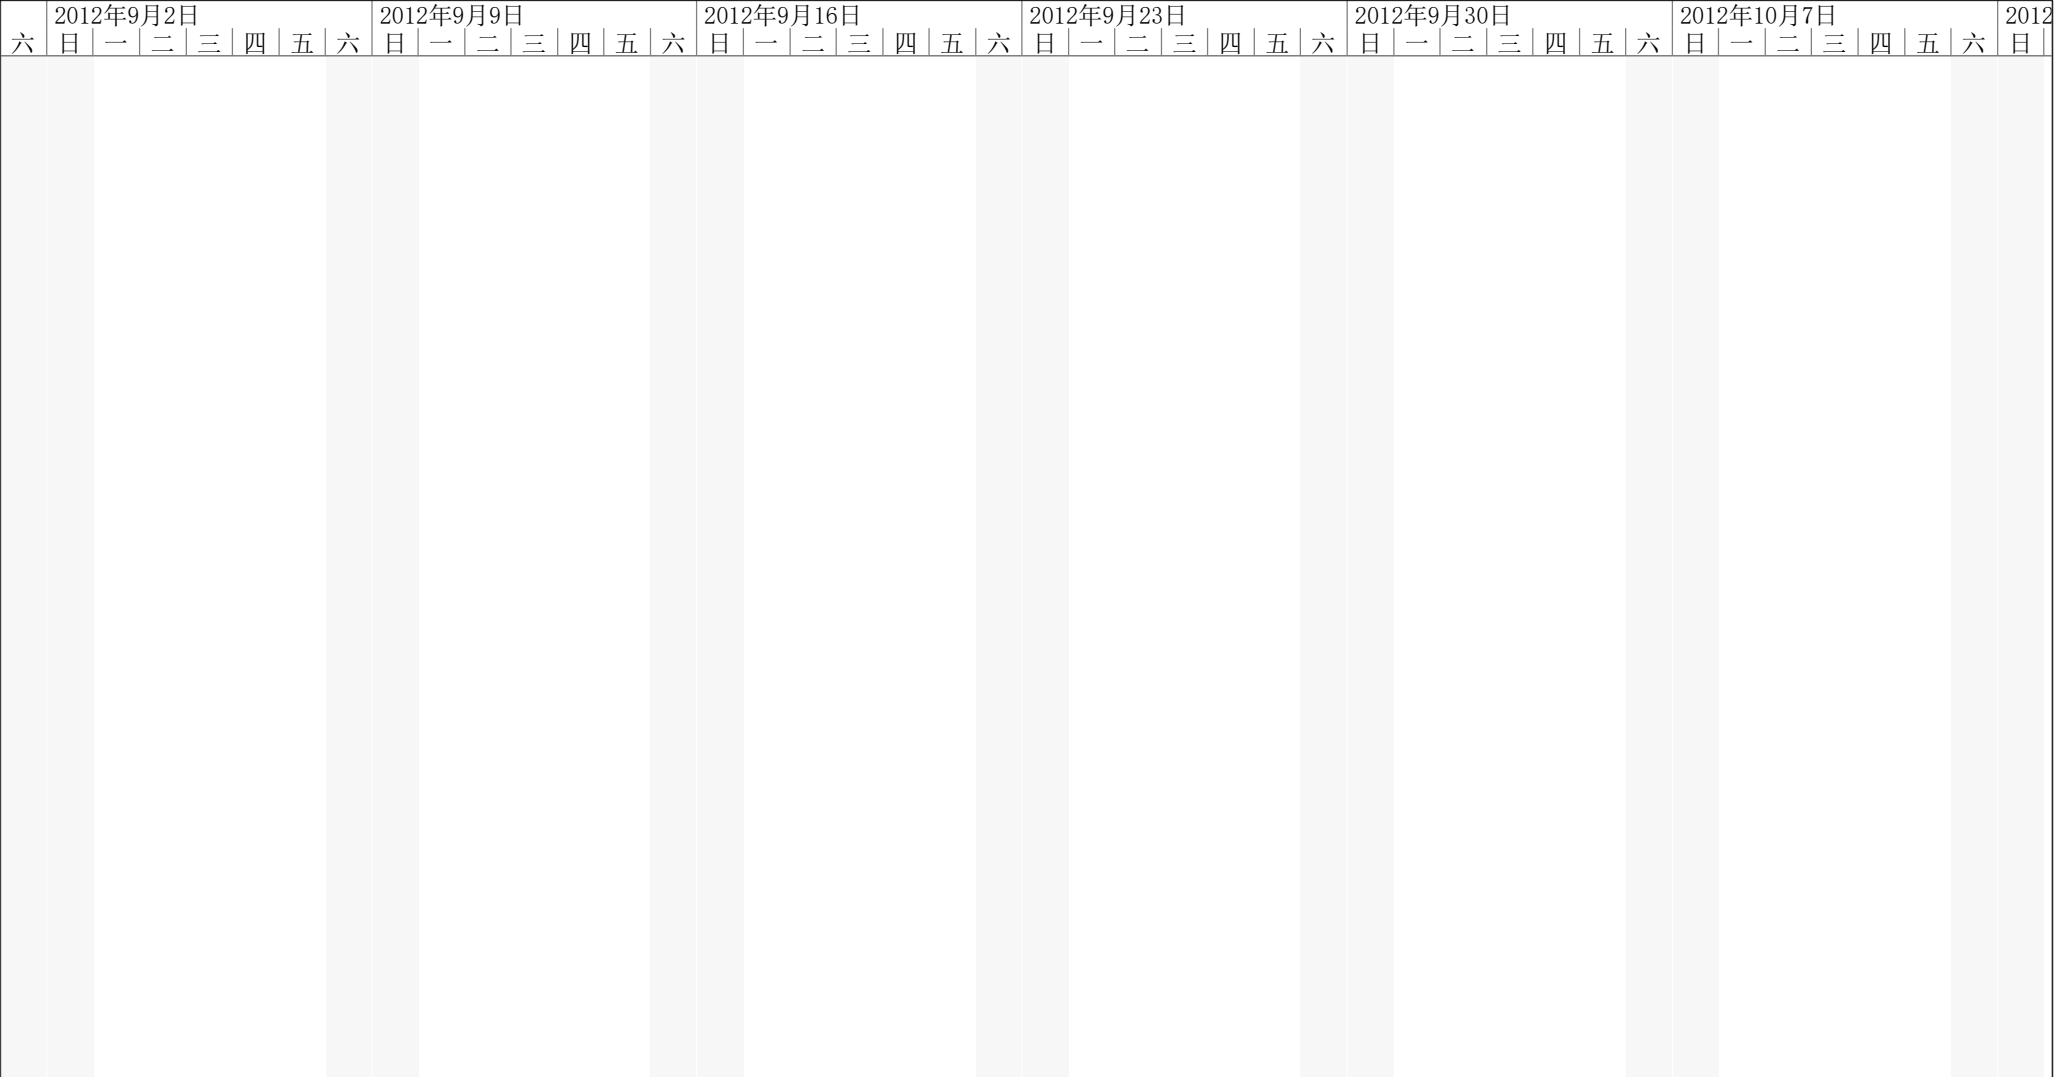


















项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			



项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			



项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			



项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			

[illegible]

项目: msproj11 日期: 2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			



项目：msproj11  
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

期限



















进度

手动进度



五		六		2013年1月13日						2013年1月20日						2013年1月27日						2013年2月3日						2013年2月10日						2013年2月17日					
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六					

项目：msproj11  
日期：2019年6月19日



















任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			






项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			



项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			





项目：msproj11  
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

◆

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

◇

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间


仅完成时间

期限

进度

手动进度

↓

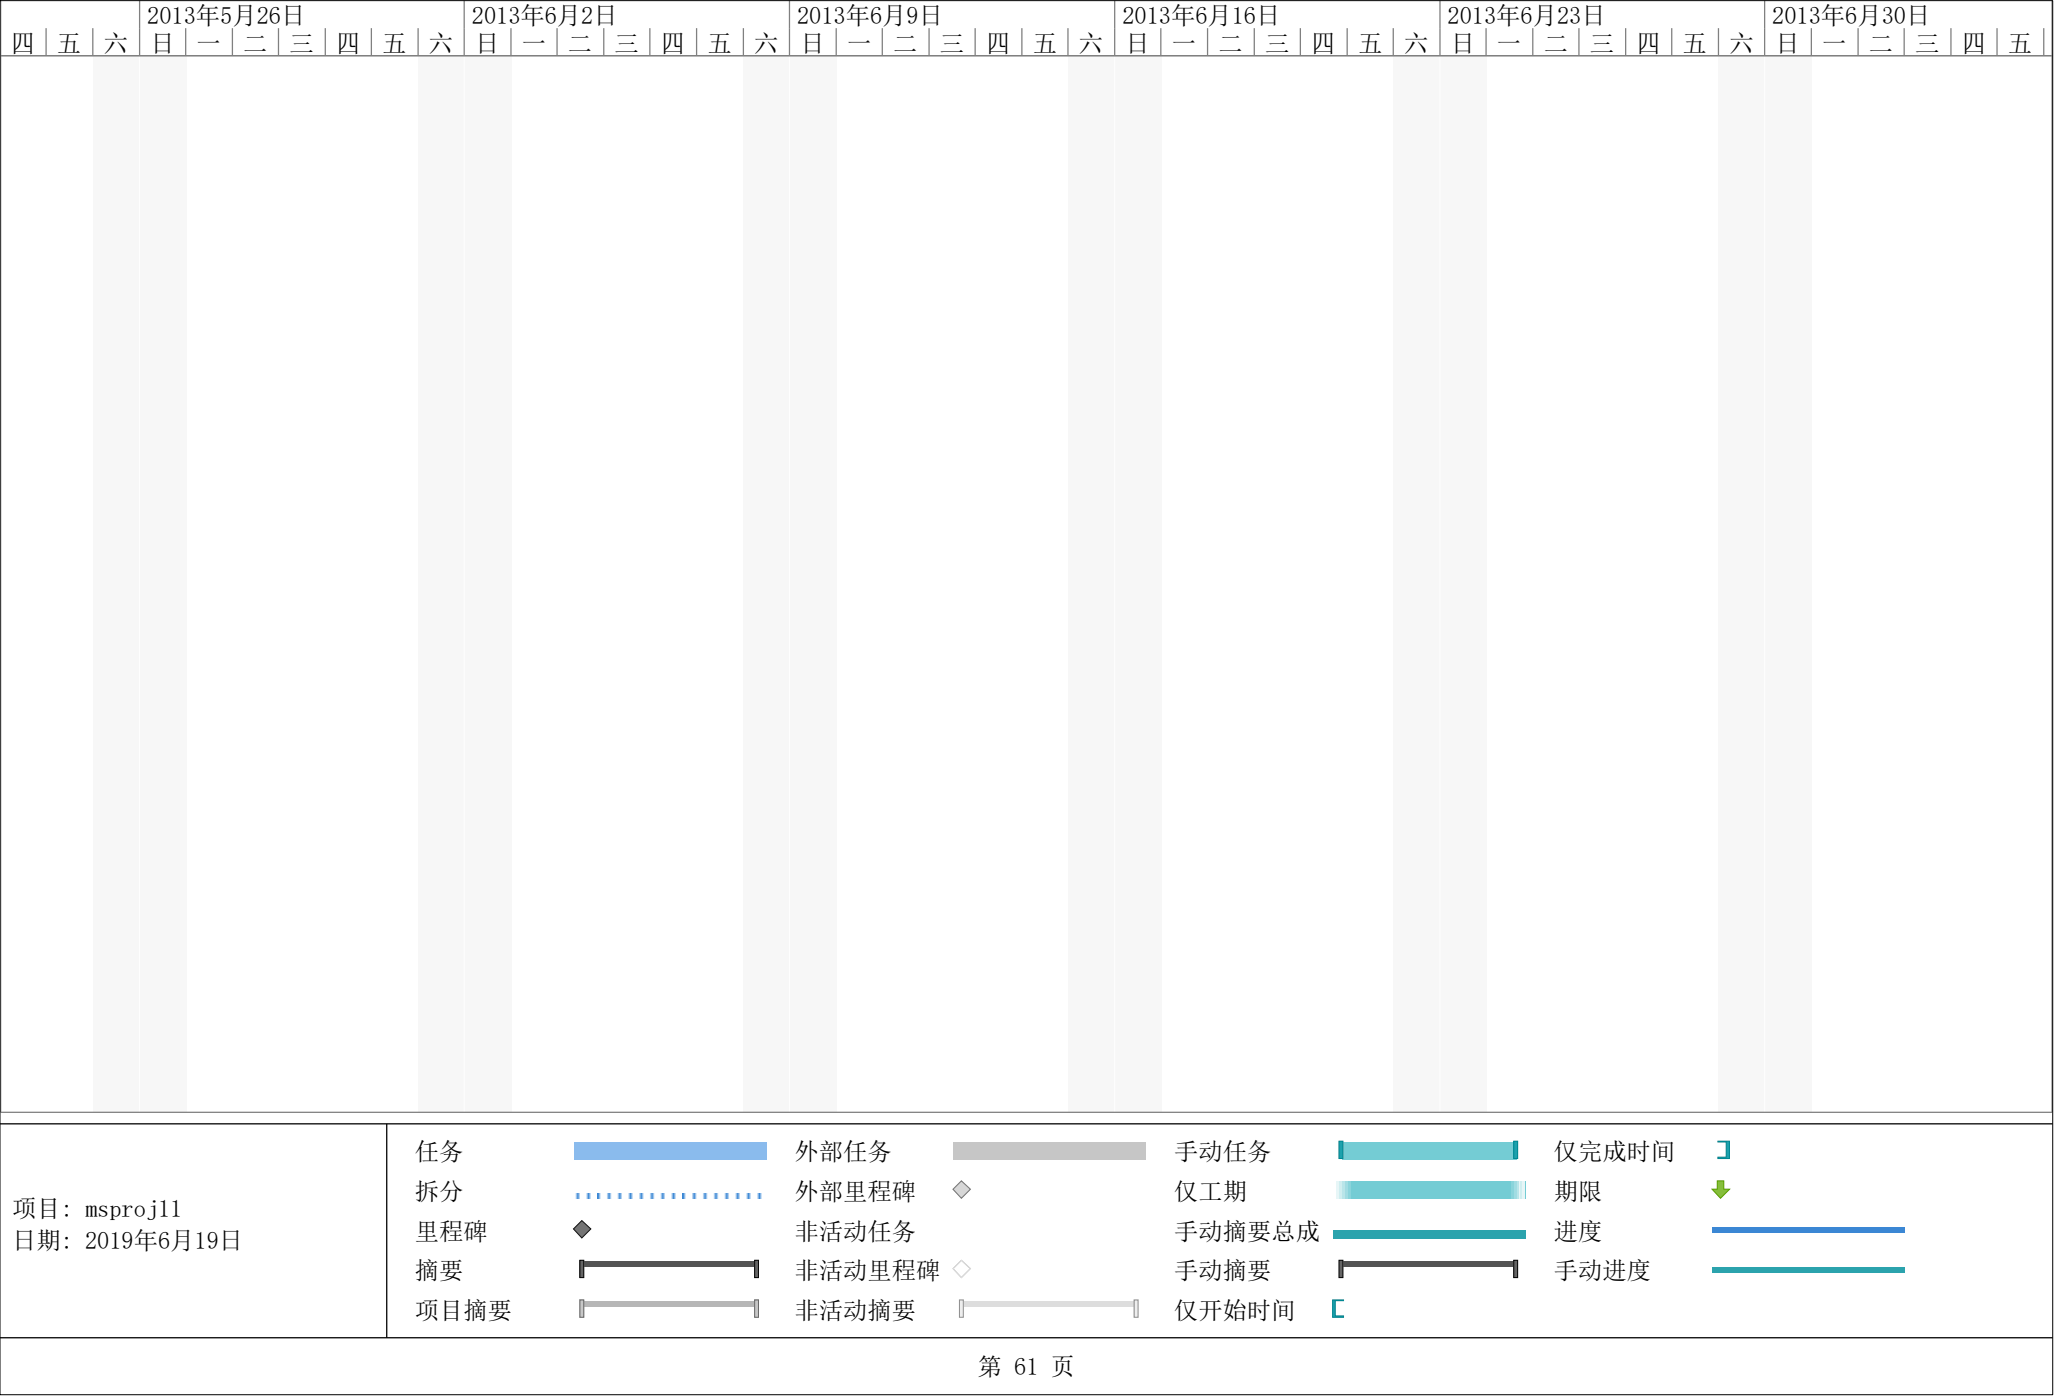



项目：msproj11  
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

◆

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

◇

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间












仅完成时间


期限









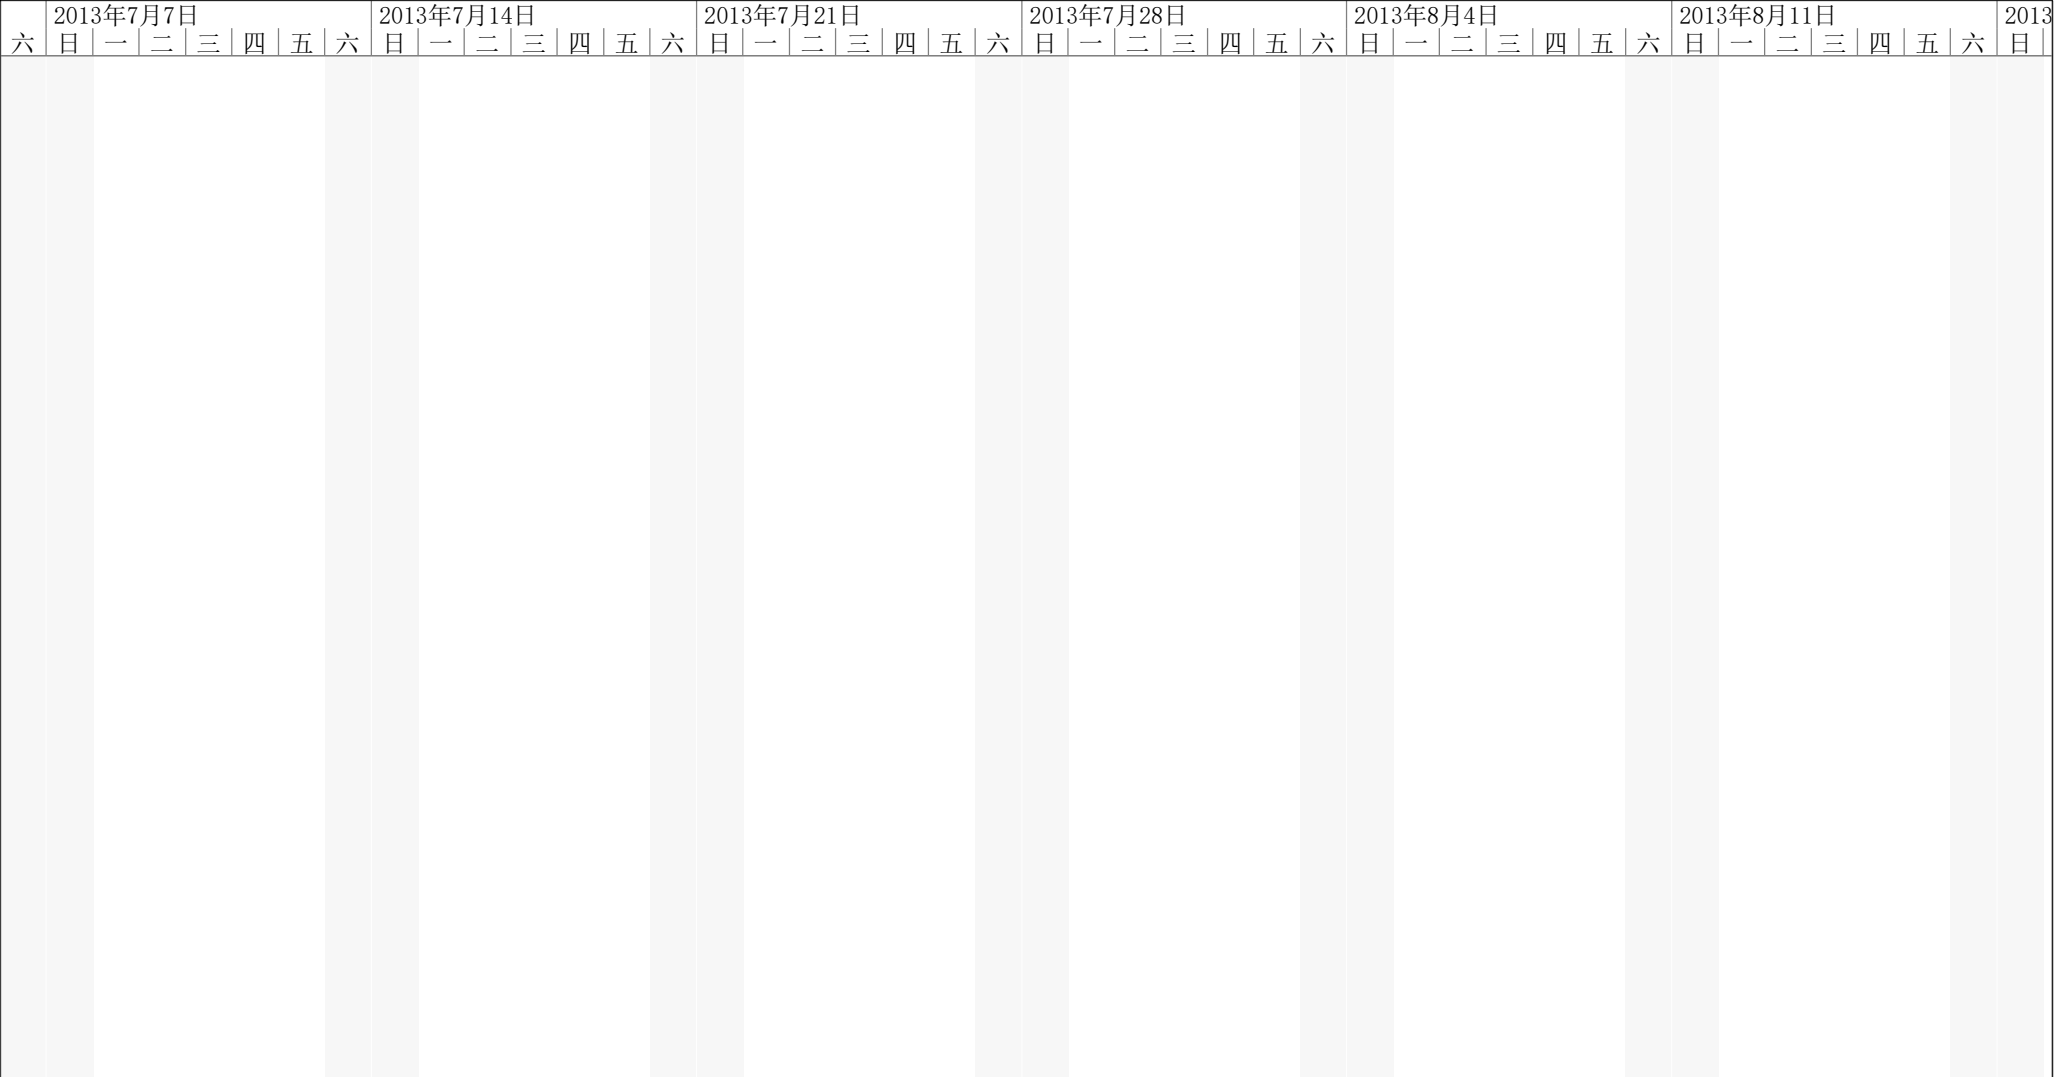









进度

手动进度



项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			




项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			









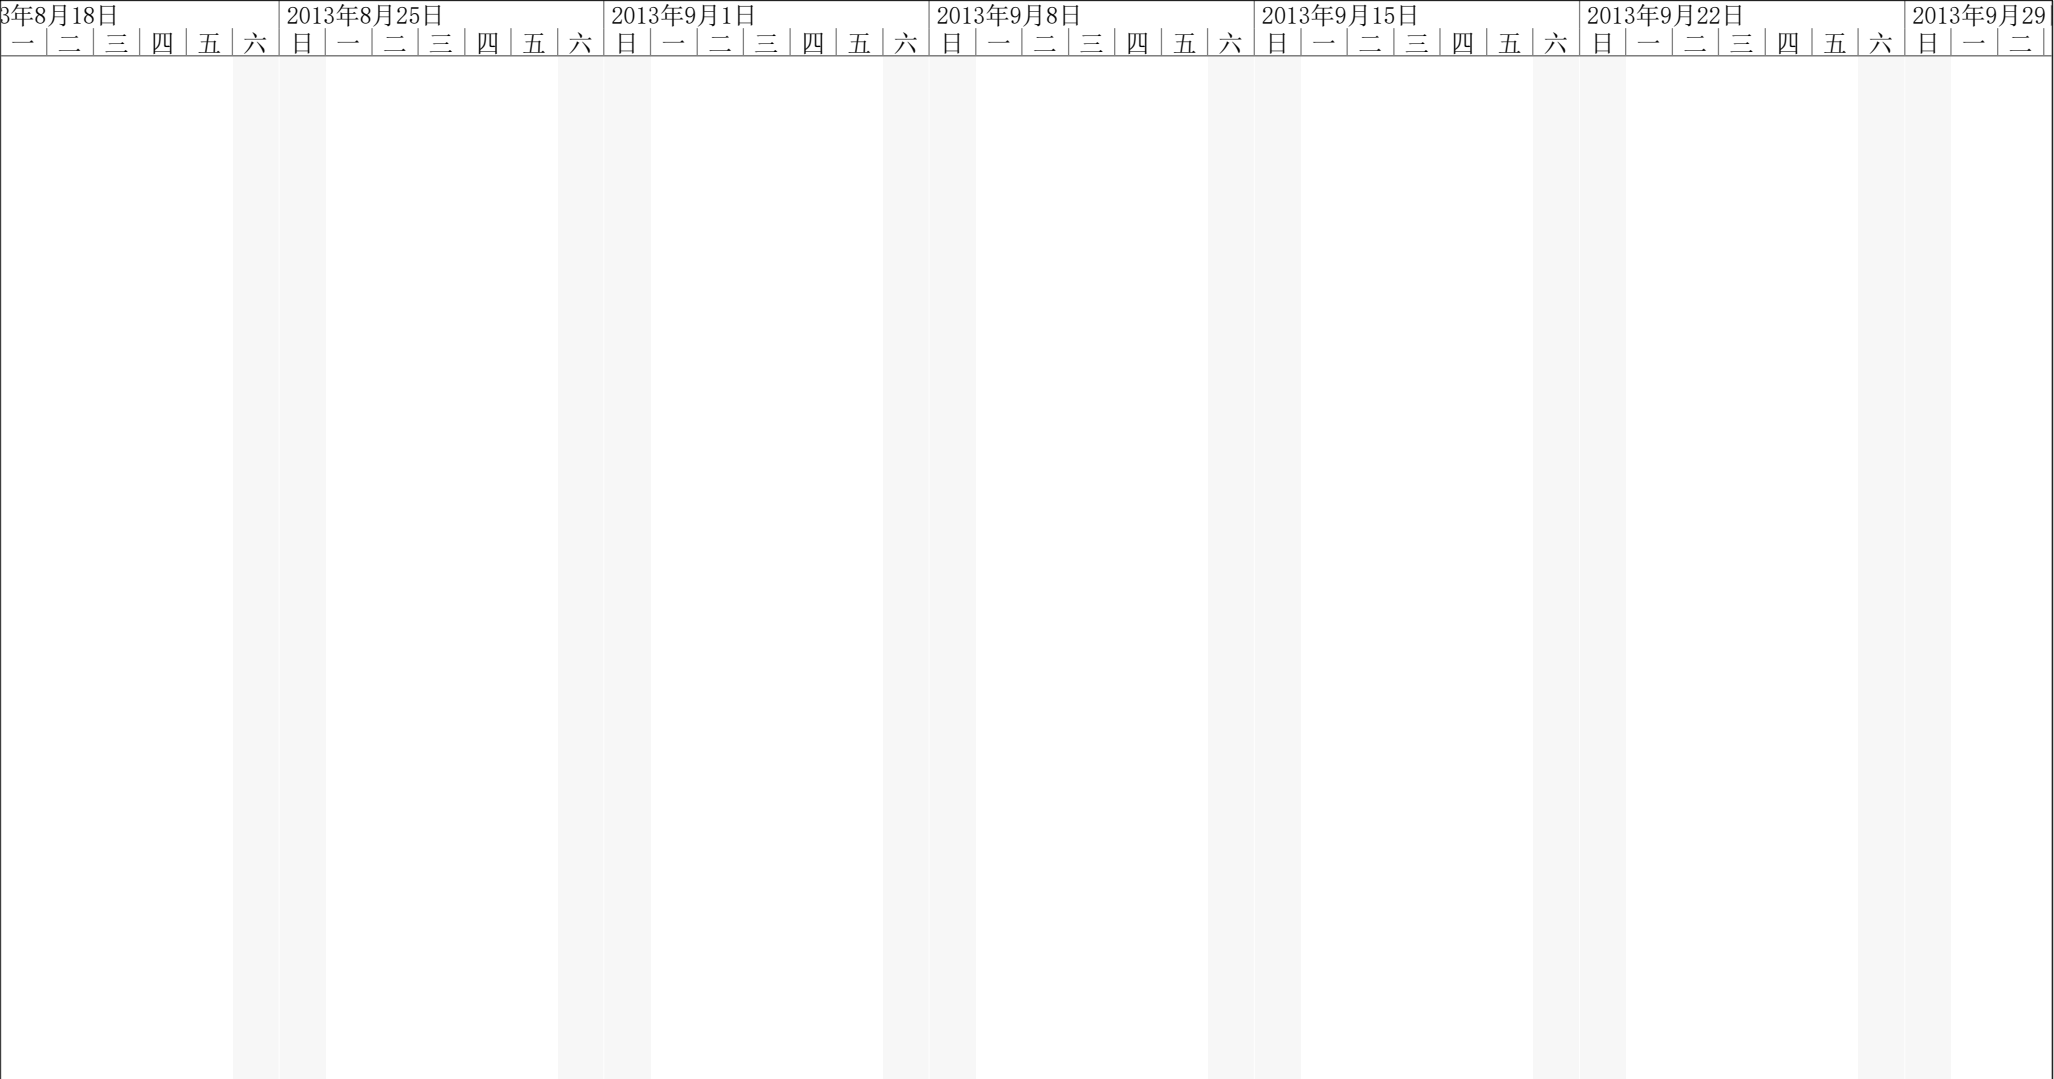












[illegible]


项目：msproj11  
日期：2019年6月19日

任务	外部任务	手动任务	仅完成时间
拆分	外部里程碑	仅工期	期限
里程碑	非活动任务	手动摘要总成	进度
摘要	非活动里程碑	手动摘要	手动进度
项目摘要	非活动摘要	仅开始时间	



项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			



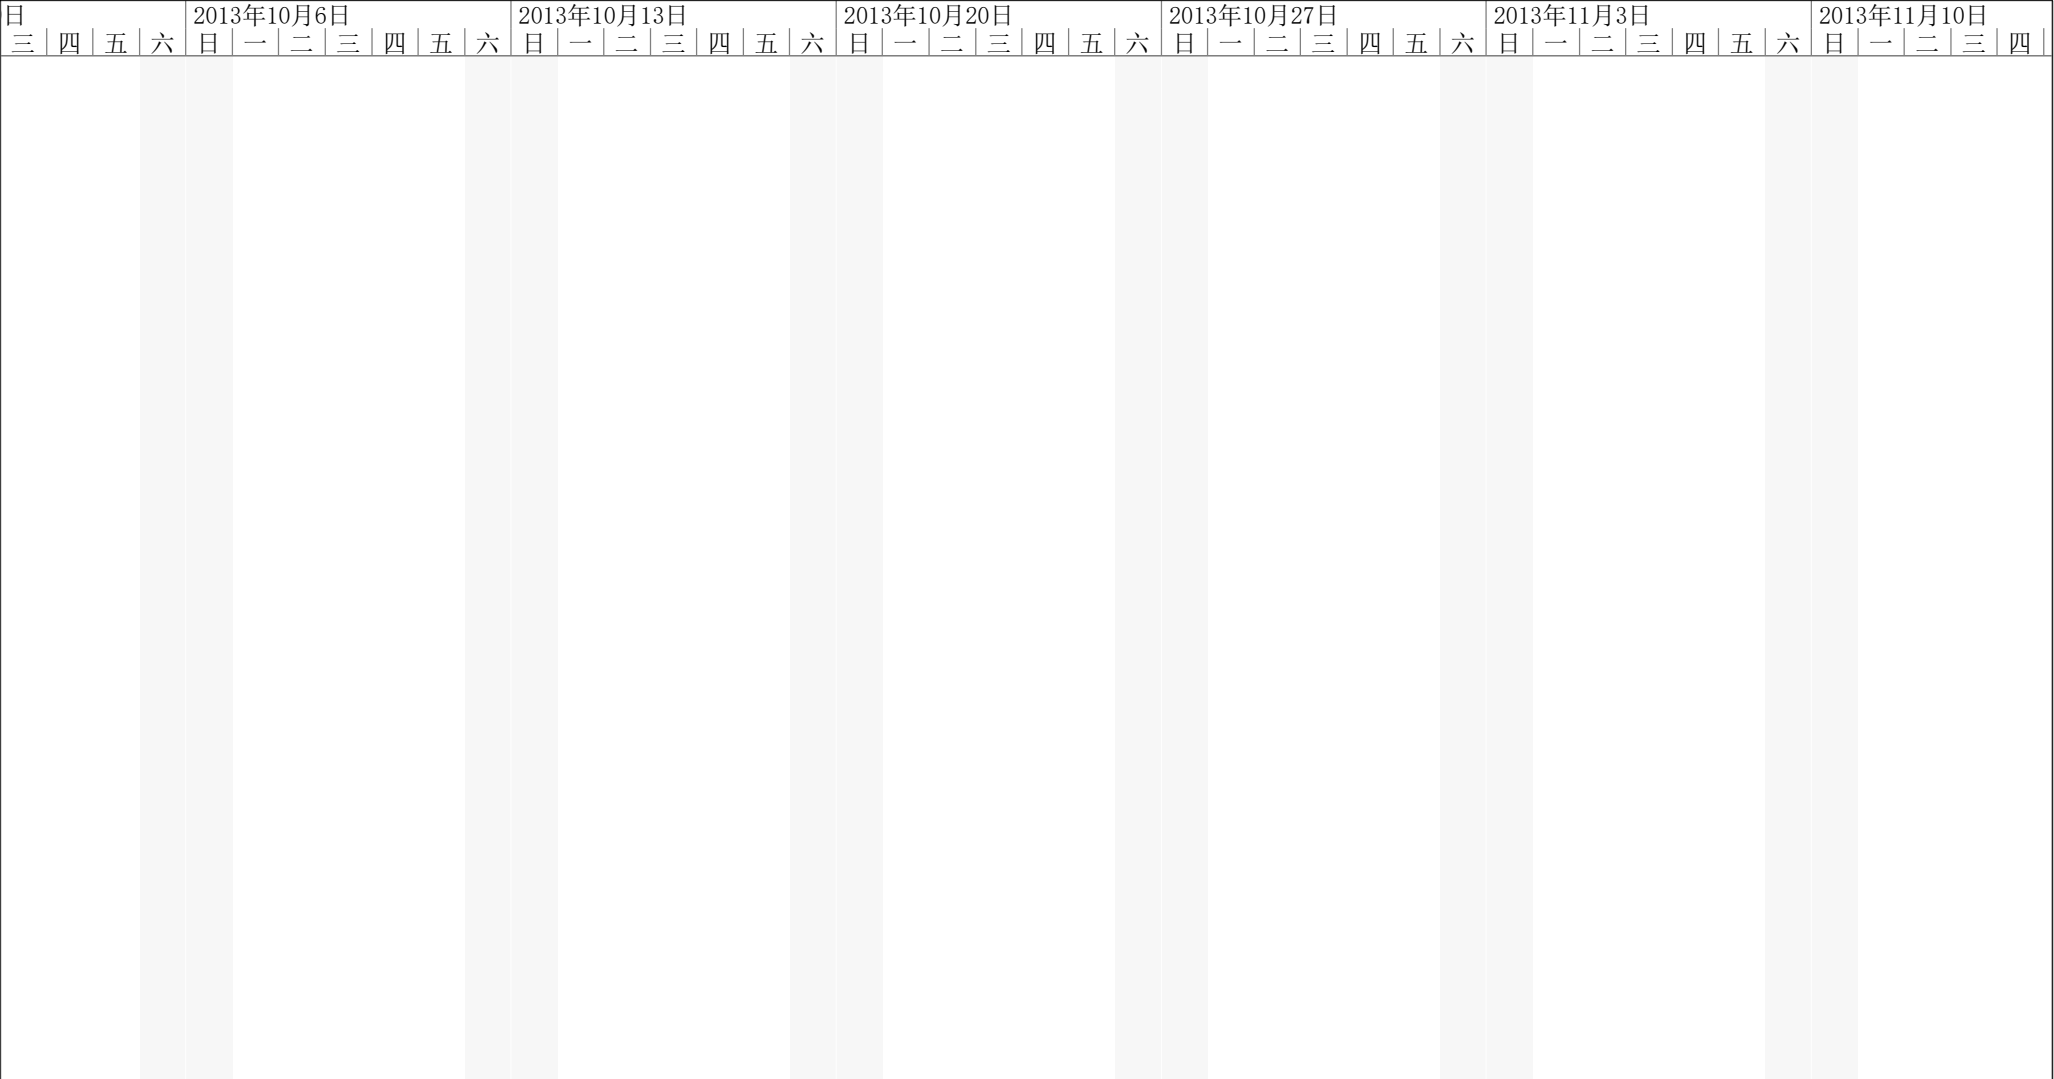

项目：msproj11  
日期：2019年6月19日


任务


拆分


里程碑


摘要


项目摘要












外部任务


外部里程碑


非活动任务


非活动里程碑

非活动摘要










手动任务


仅工期


手动摘要总成


手动摘要


仅开始时间













仅完成时间


期限


进度


手动进度











[illegible]















项目: msproj11  
日期: 2019年6月19日

任务	外部任务	手动任务	仅完成时间
拆分	外部里程碑	仅工期	期限
里程碑	非活动任务	手动摘要总成	进度
摘要	非活动里程碑	手动摘要	手动进度
项目摘要	非活动摘要	仅开始时间	



项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			



项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			



[illegible]

项目: msproj11  
日期: 2019年6月19日

任务	外部任务	手动任务	仅完成时间
拆分	外部里程碑	仅工期	期限
里程碑	非活动任务	手动摘要总成	进度
摘要	非活动里程碑	手动摘要	手动进度
项目摘要	非活动摘要	仅开始时间	



项目：msproj11  
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间


仅完成时间


期限

进度

手动进度

第 74 页

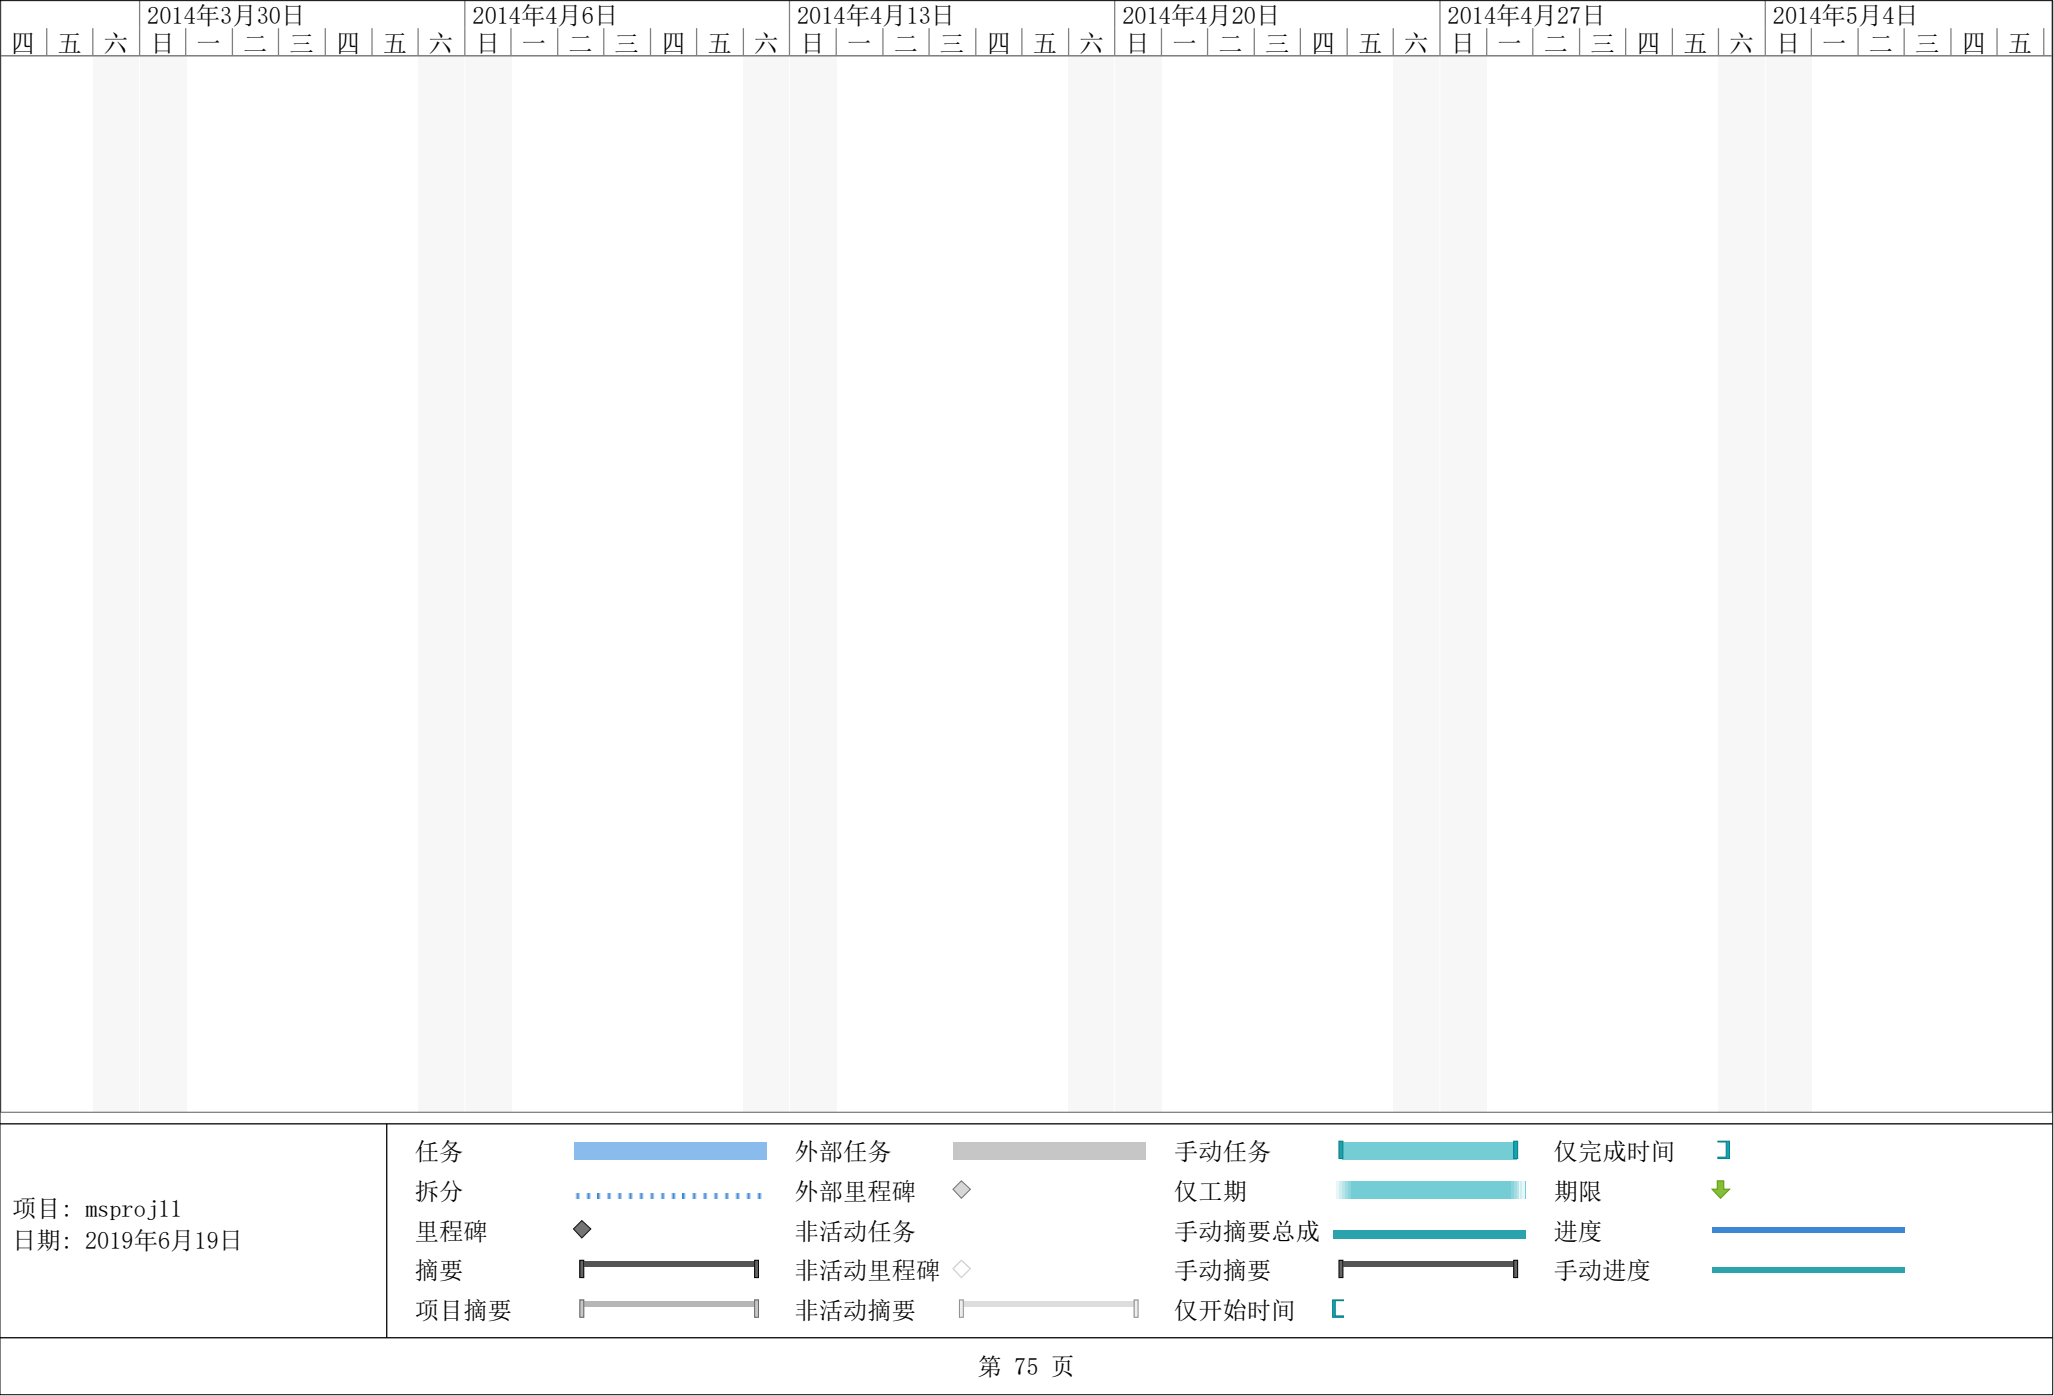

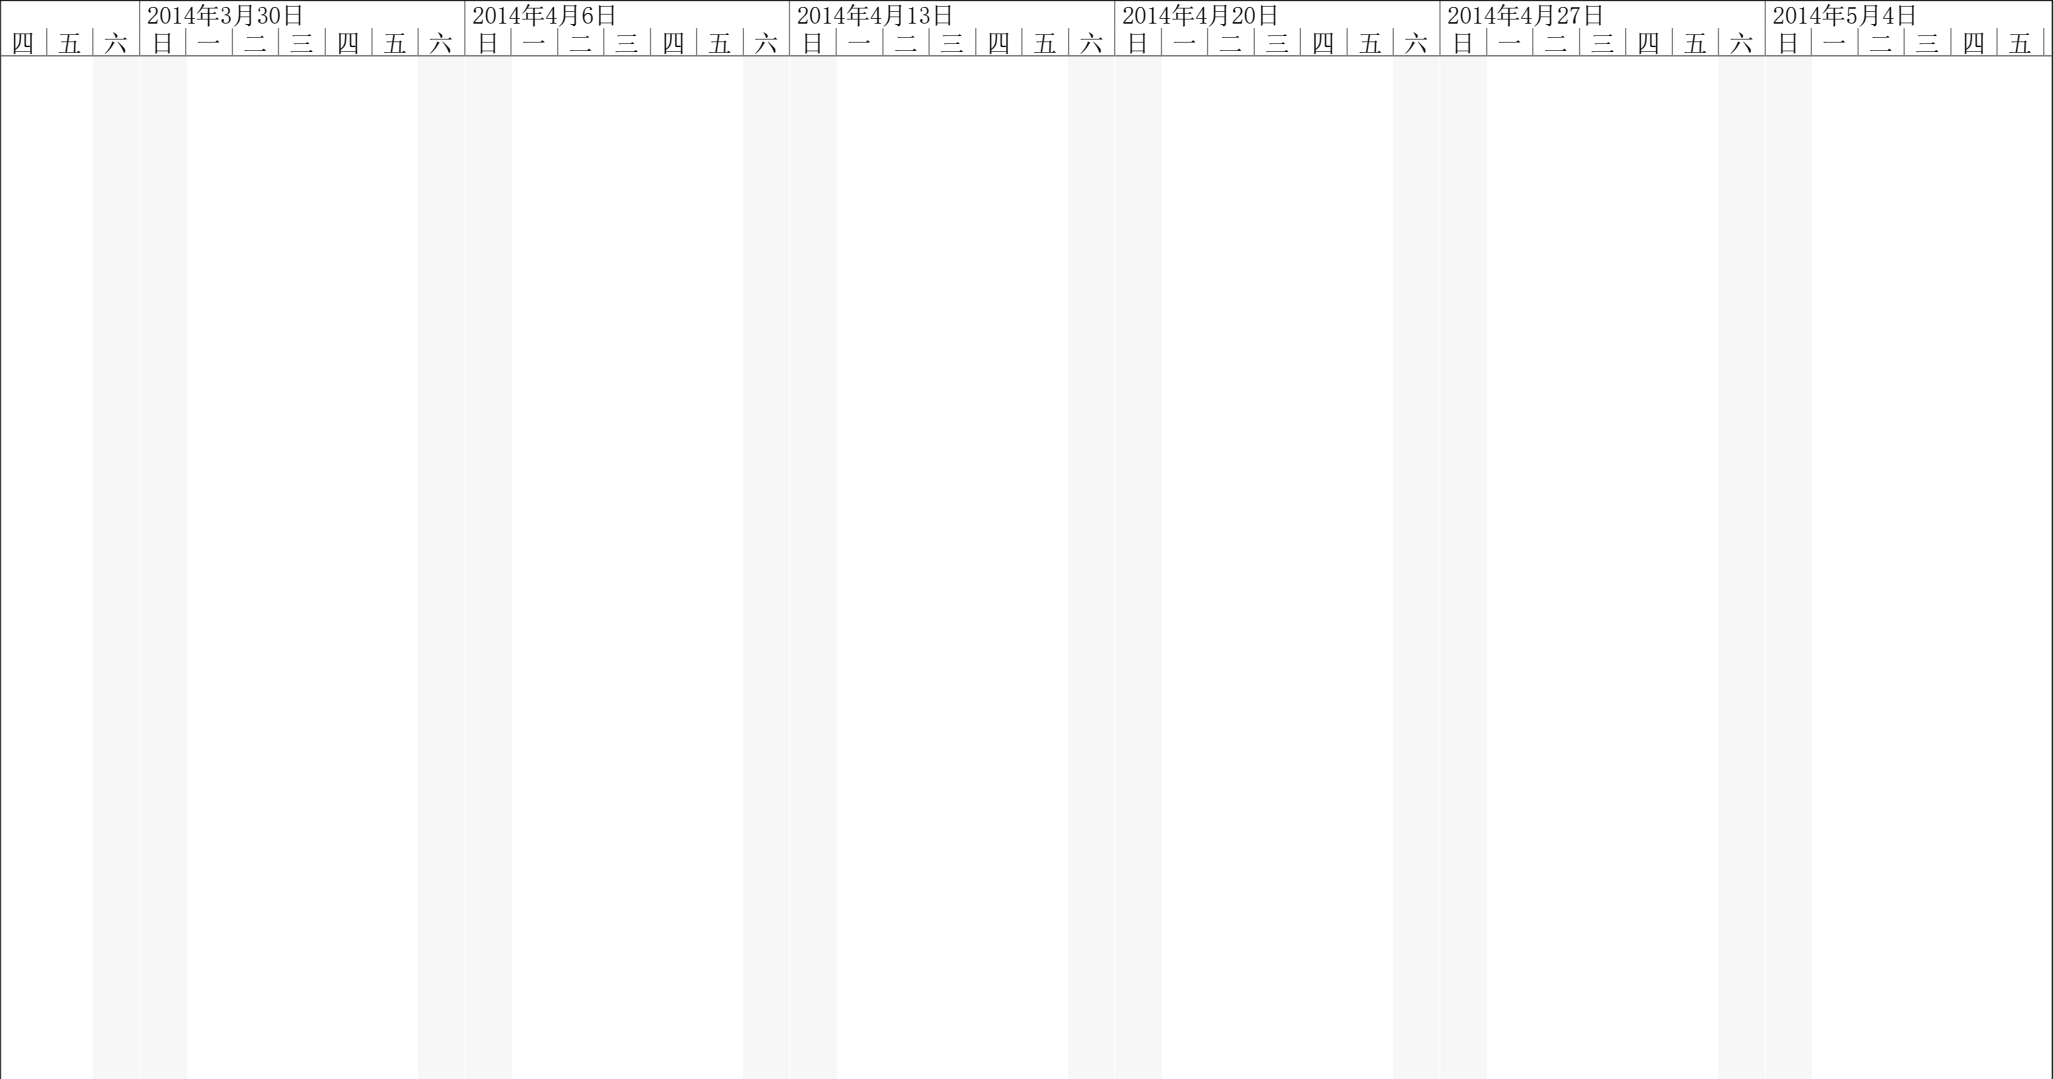

项目：msproj11  
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

◆

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

◇

◇

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

期限


进度

手动进度

期限

进度

手动进度

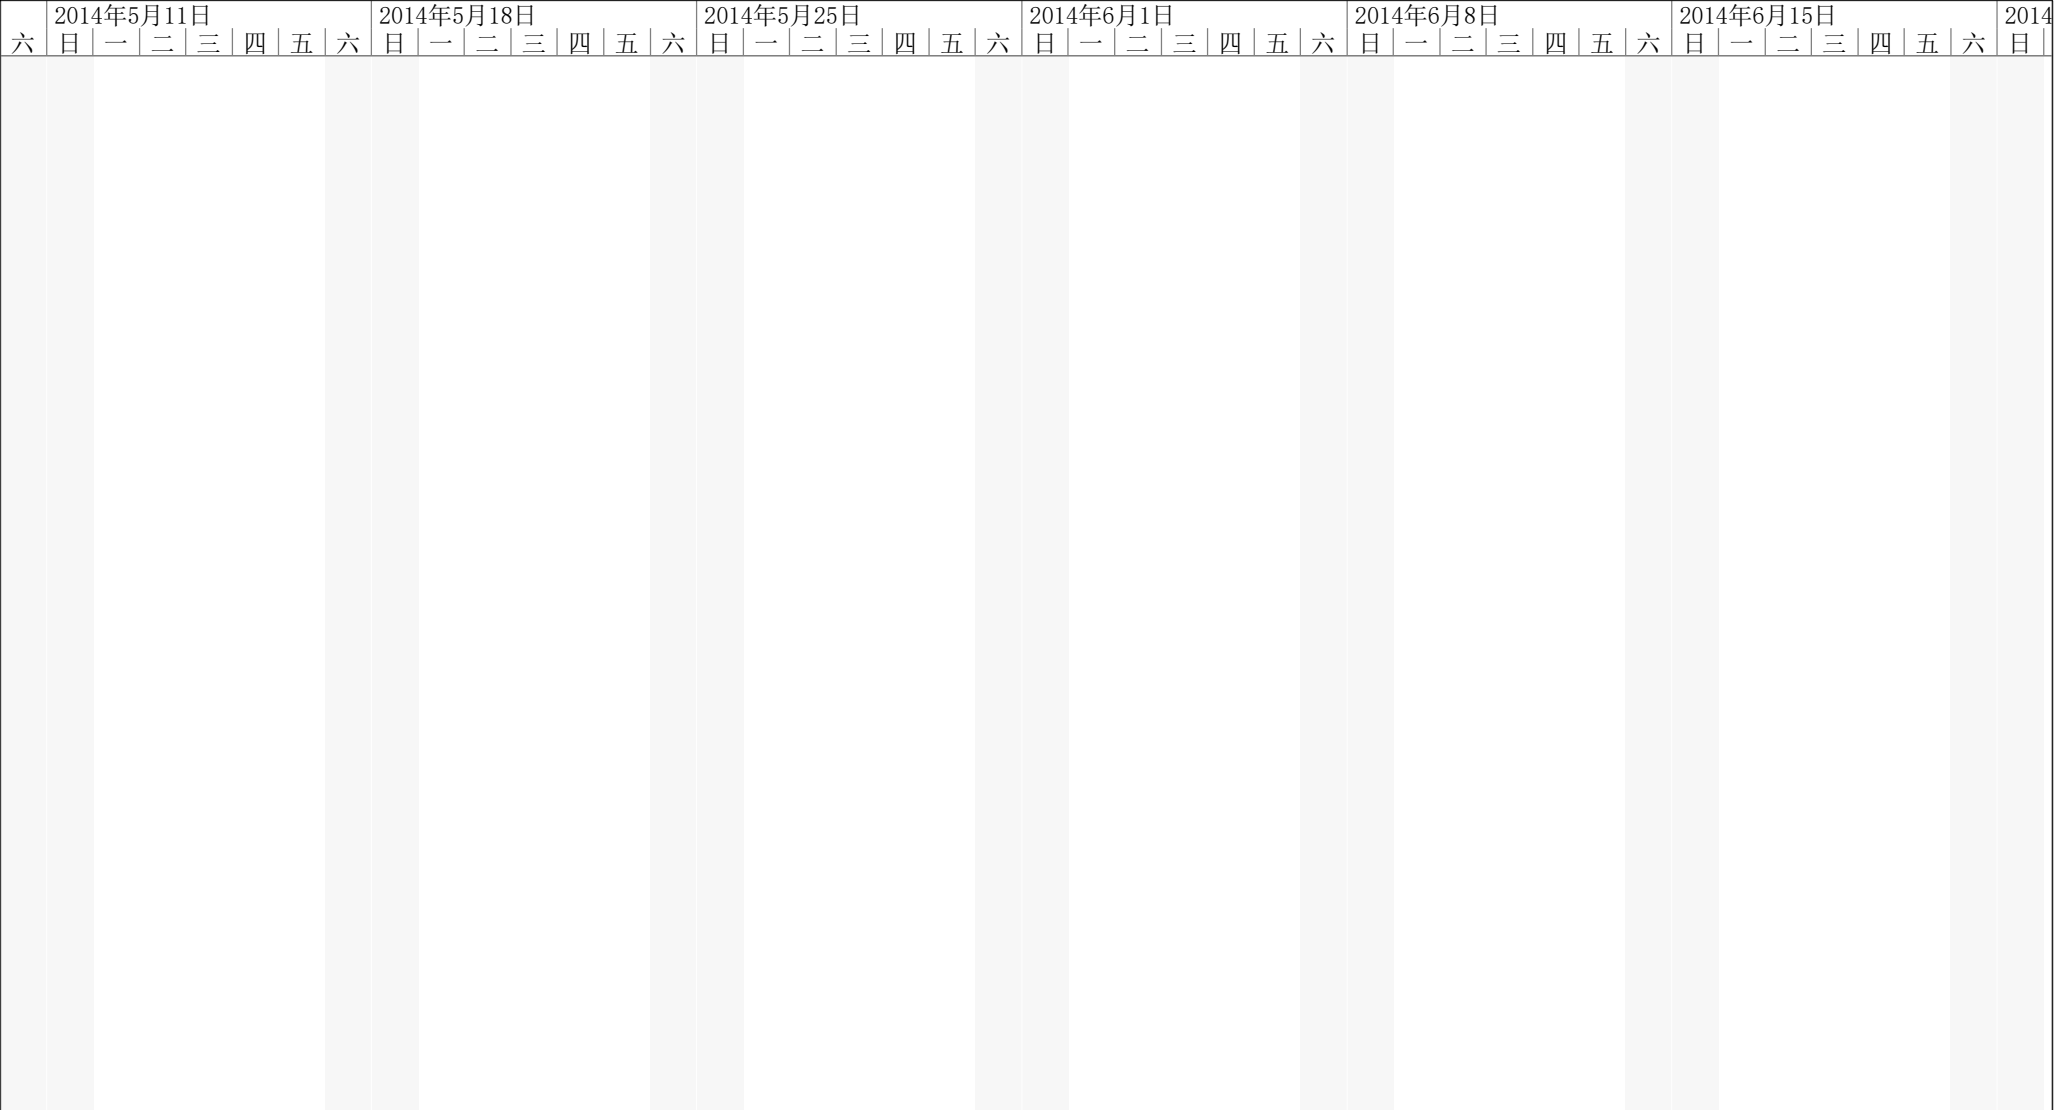

项目：msproj11  
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要


仅开始时间








仅完成时间

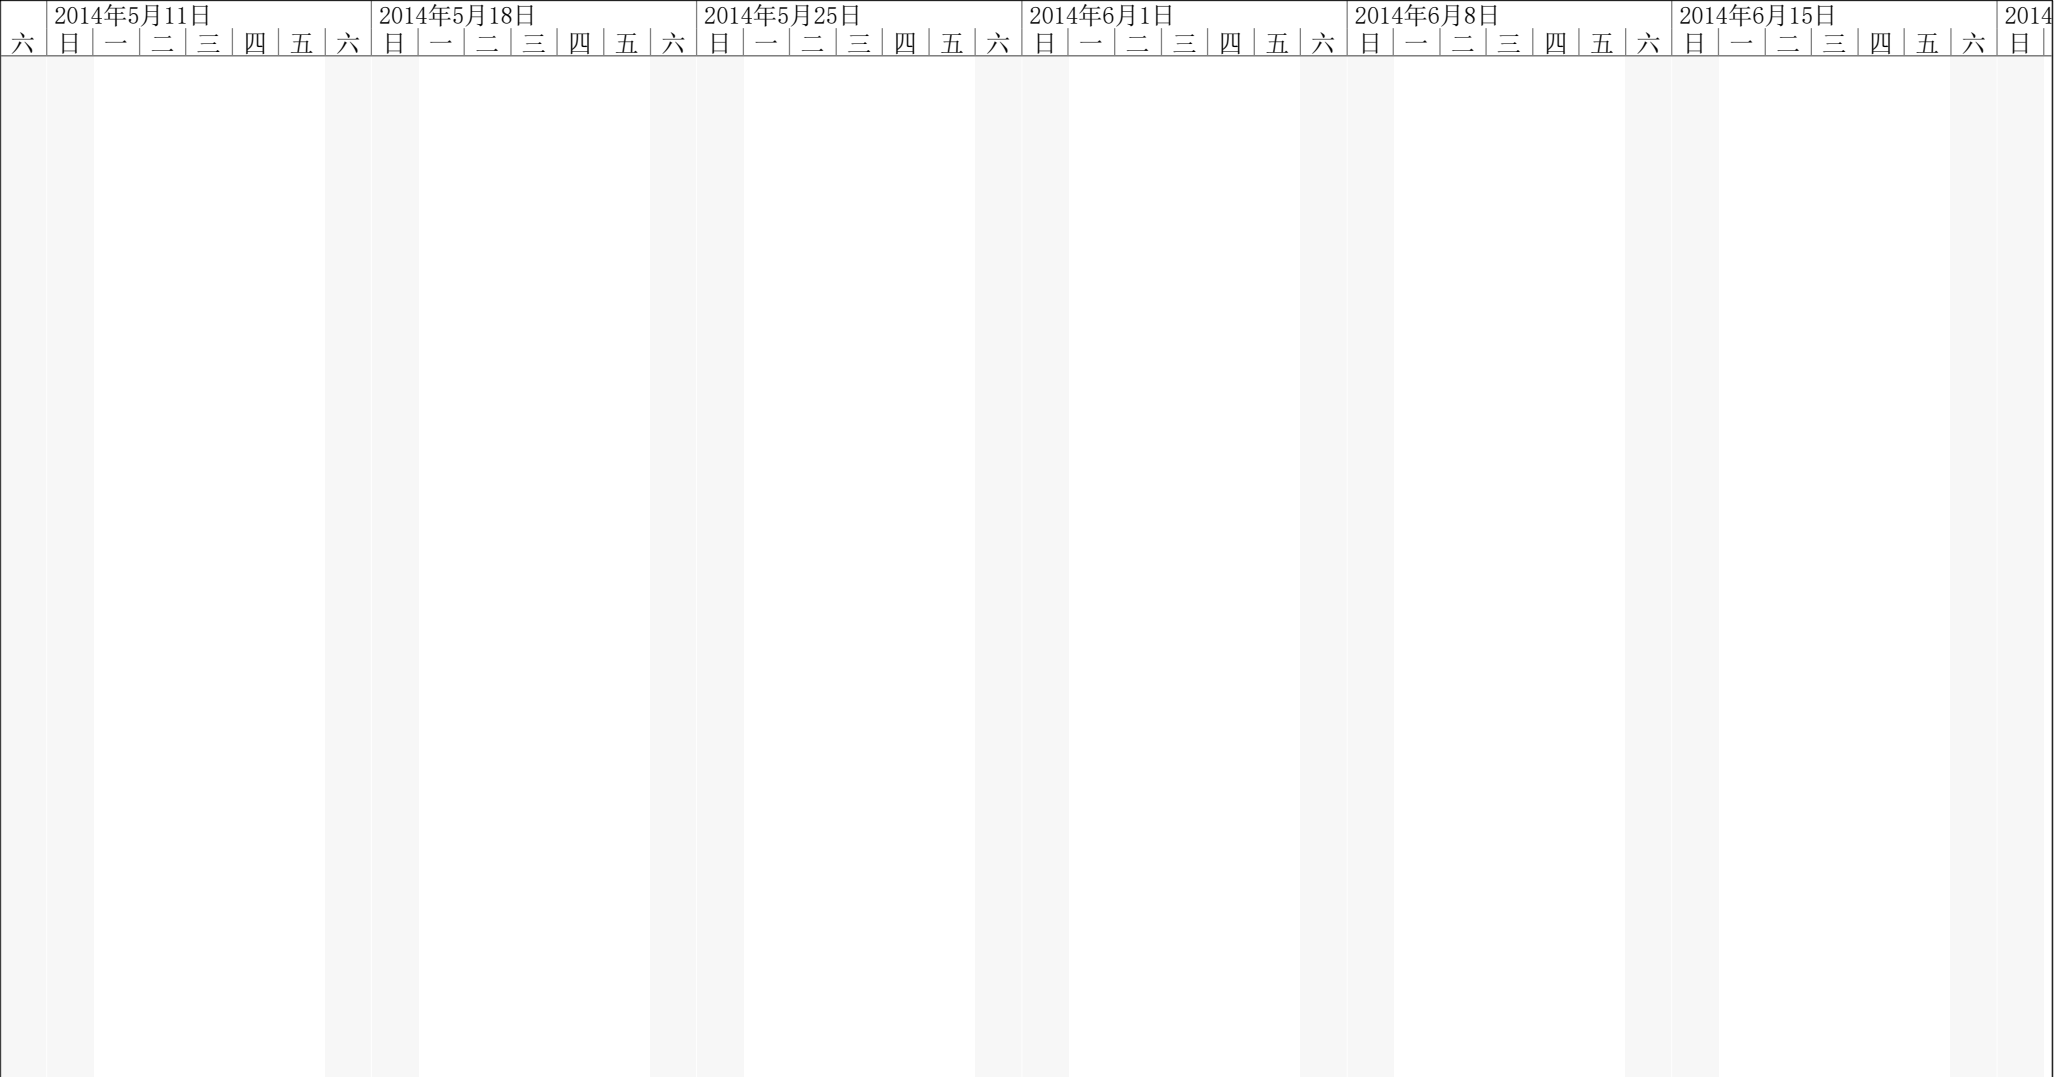
期限

进度

手动进度



项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			

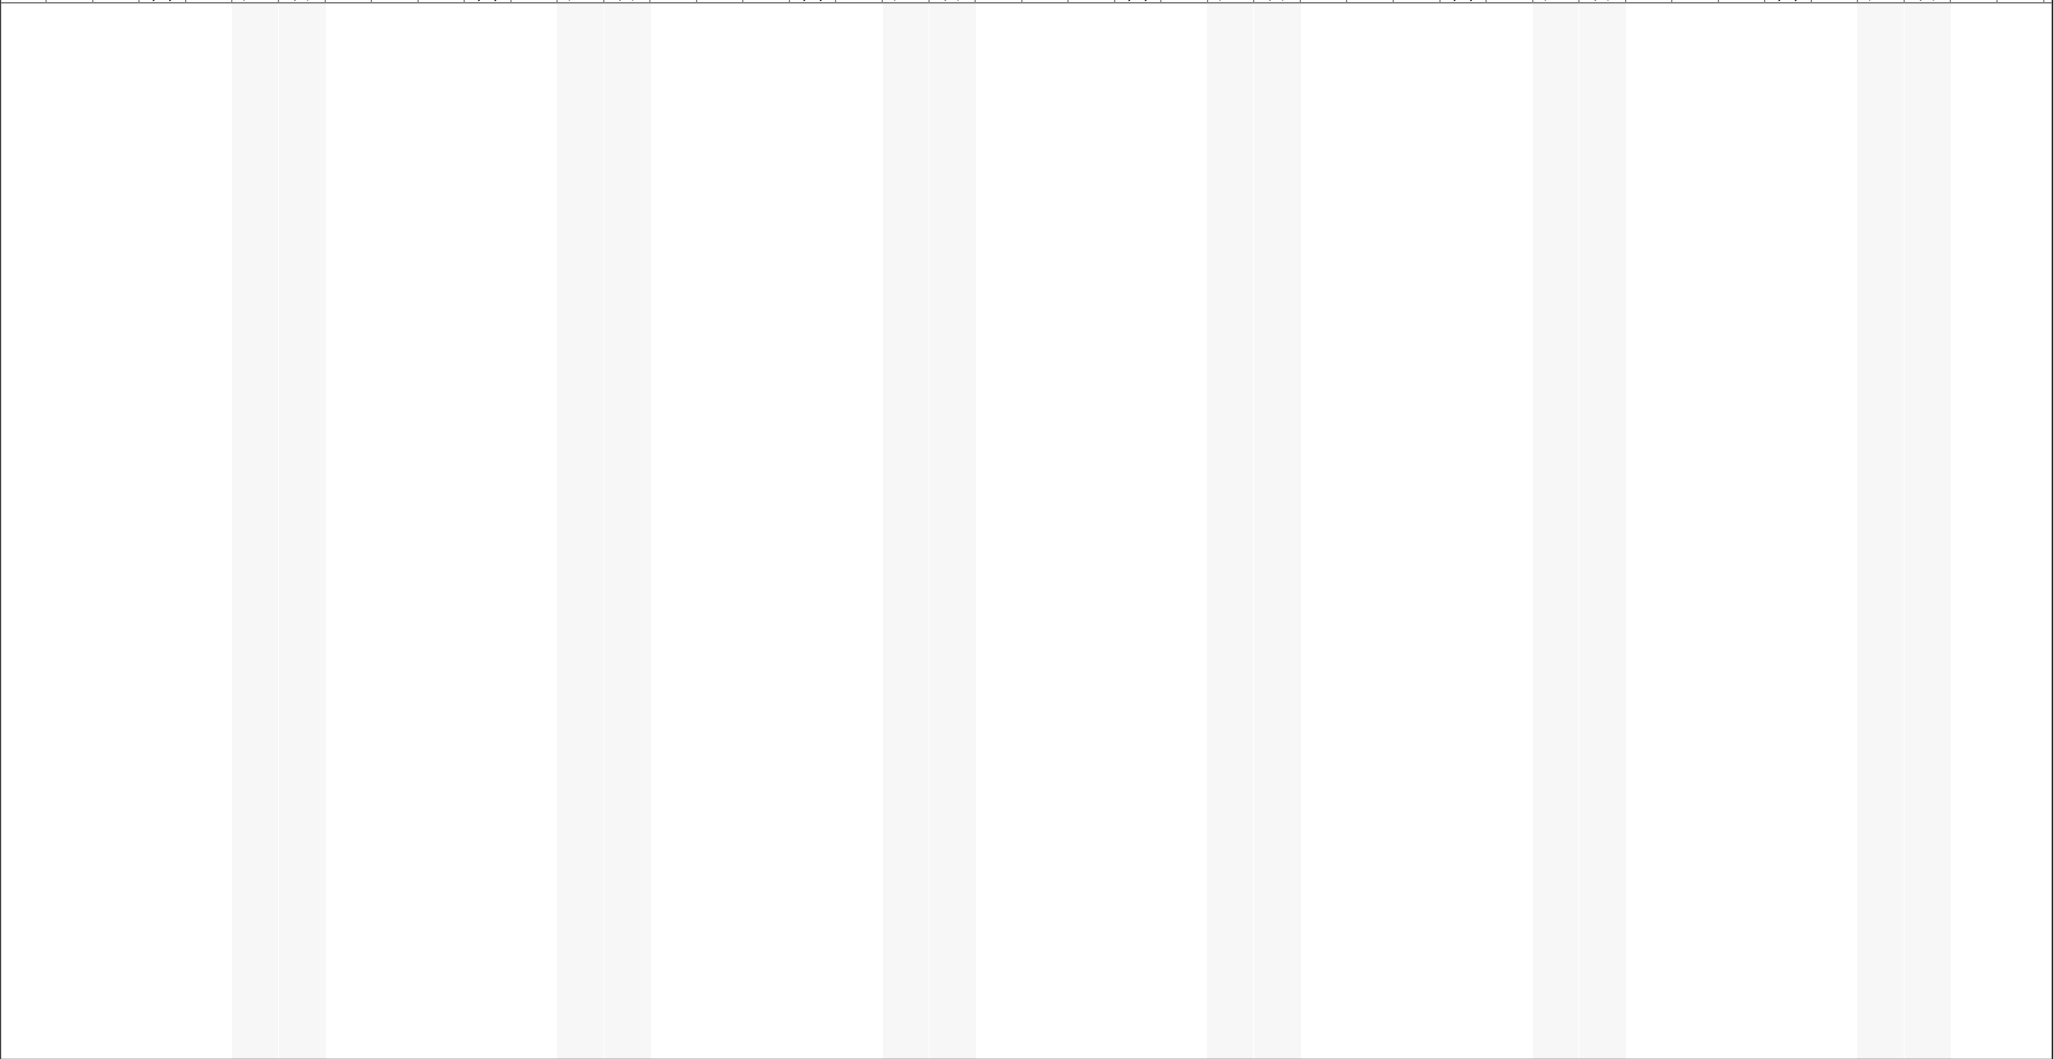

项目：msproj11  
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

期限

进度

手动进度




项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			



[illegible]

项目: msproj11 日期: 2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			

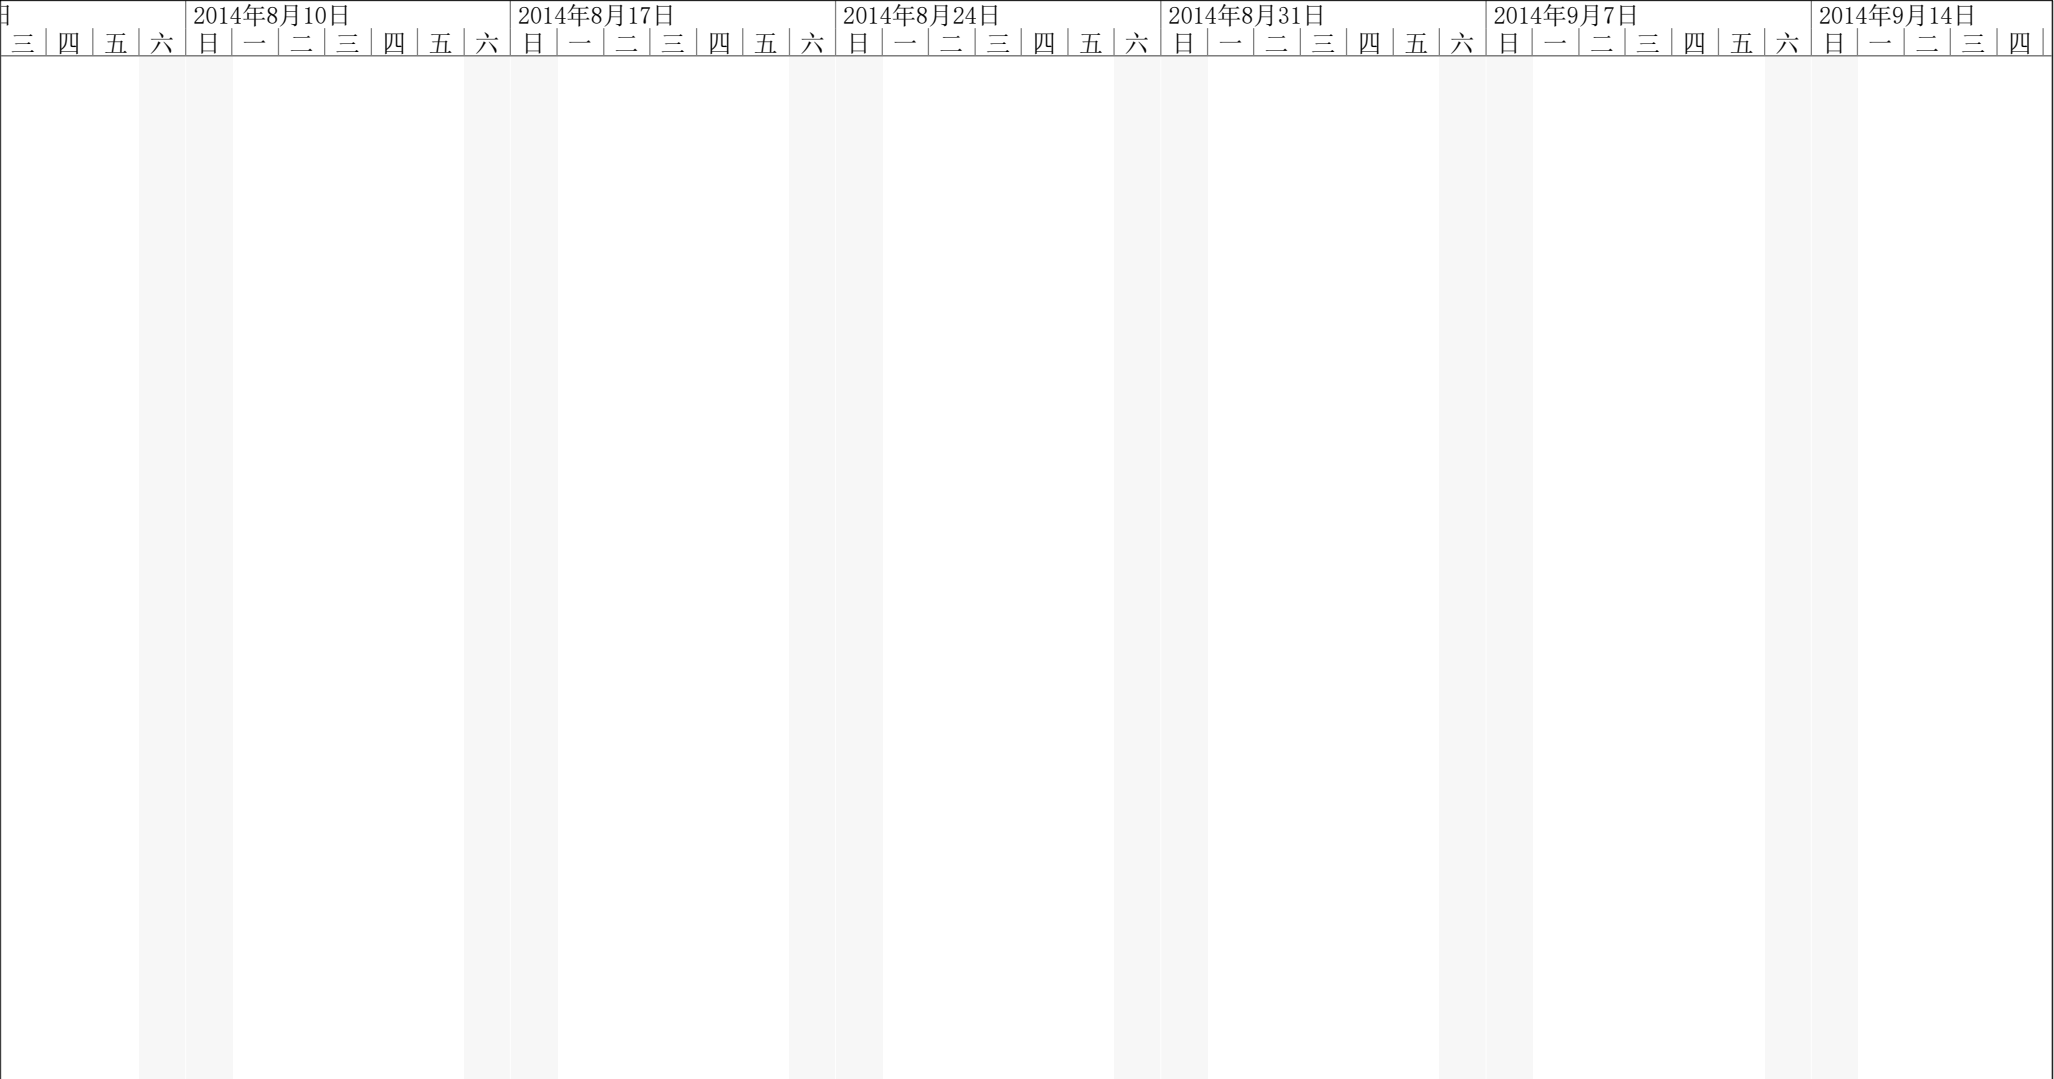

项目：msproj11  
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

期限

进度

手动进度

第 82 页

2014年9月21日							2014年9月28日							2014年10月5日							2014年10月12日							2014年10月19日							2014年10月26日						
五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六					
项目：msproj11 日期：2019年6月19日								任务		外部任务		手动任务		仅完成时间																											
								拆分		外部里程碑		仅工期		期限																											
								里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度																											
								摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度																											
								项目摘要		非活动摘要		仅开始时间																													
第 83 页																																									



















[illegible]

项目：msproj11  
日期：2019年6月19日



















任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			


[illegible]

项目: msproj11  
日期: 2019年6月19日

任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			



项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			





项目：msproj11  
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

◆

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

◇

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间


期限


进度

手动进度

↓





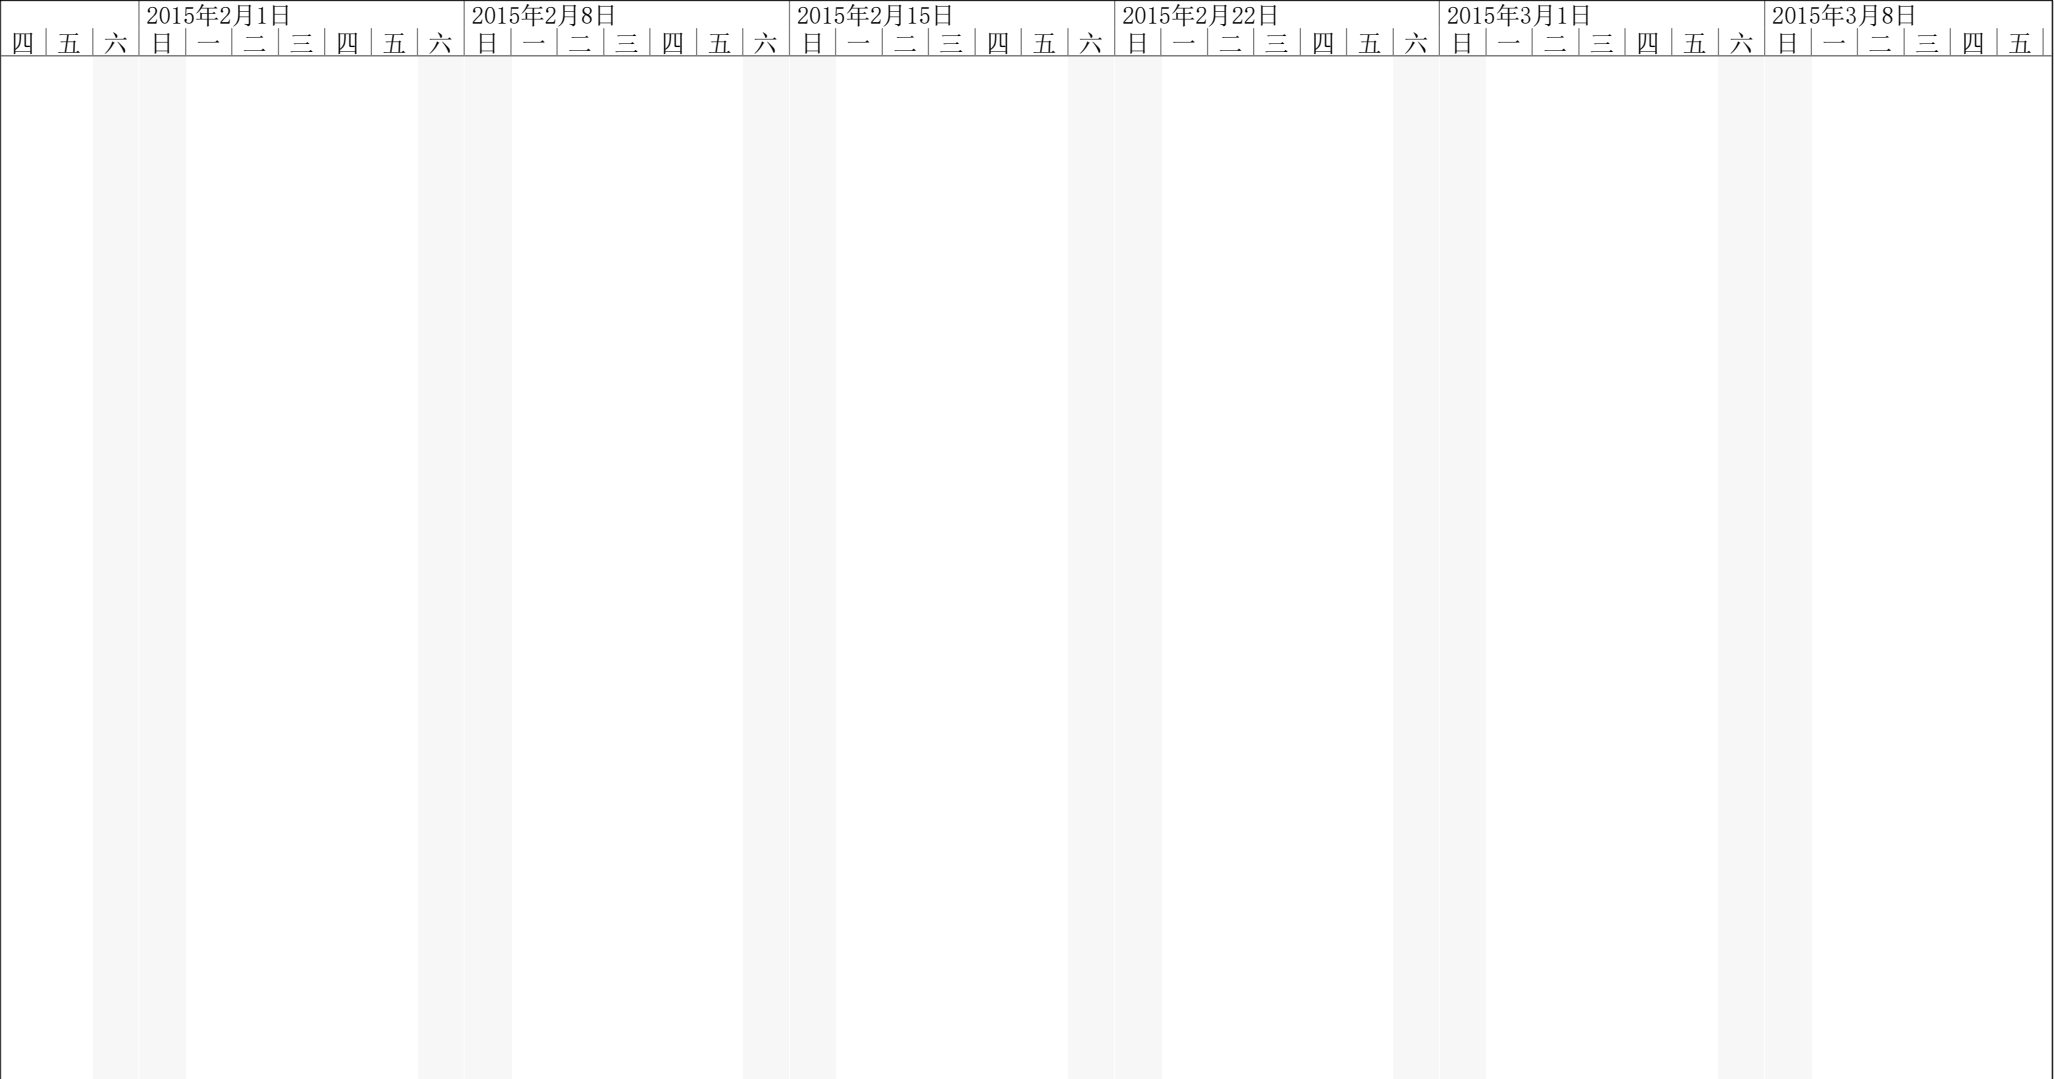

项目：msproj11  
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间


仅完成时间









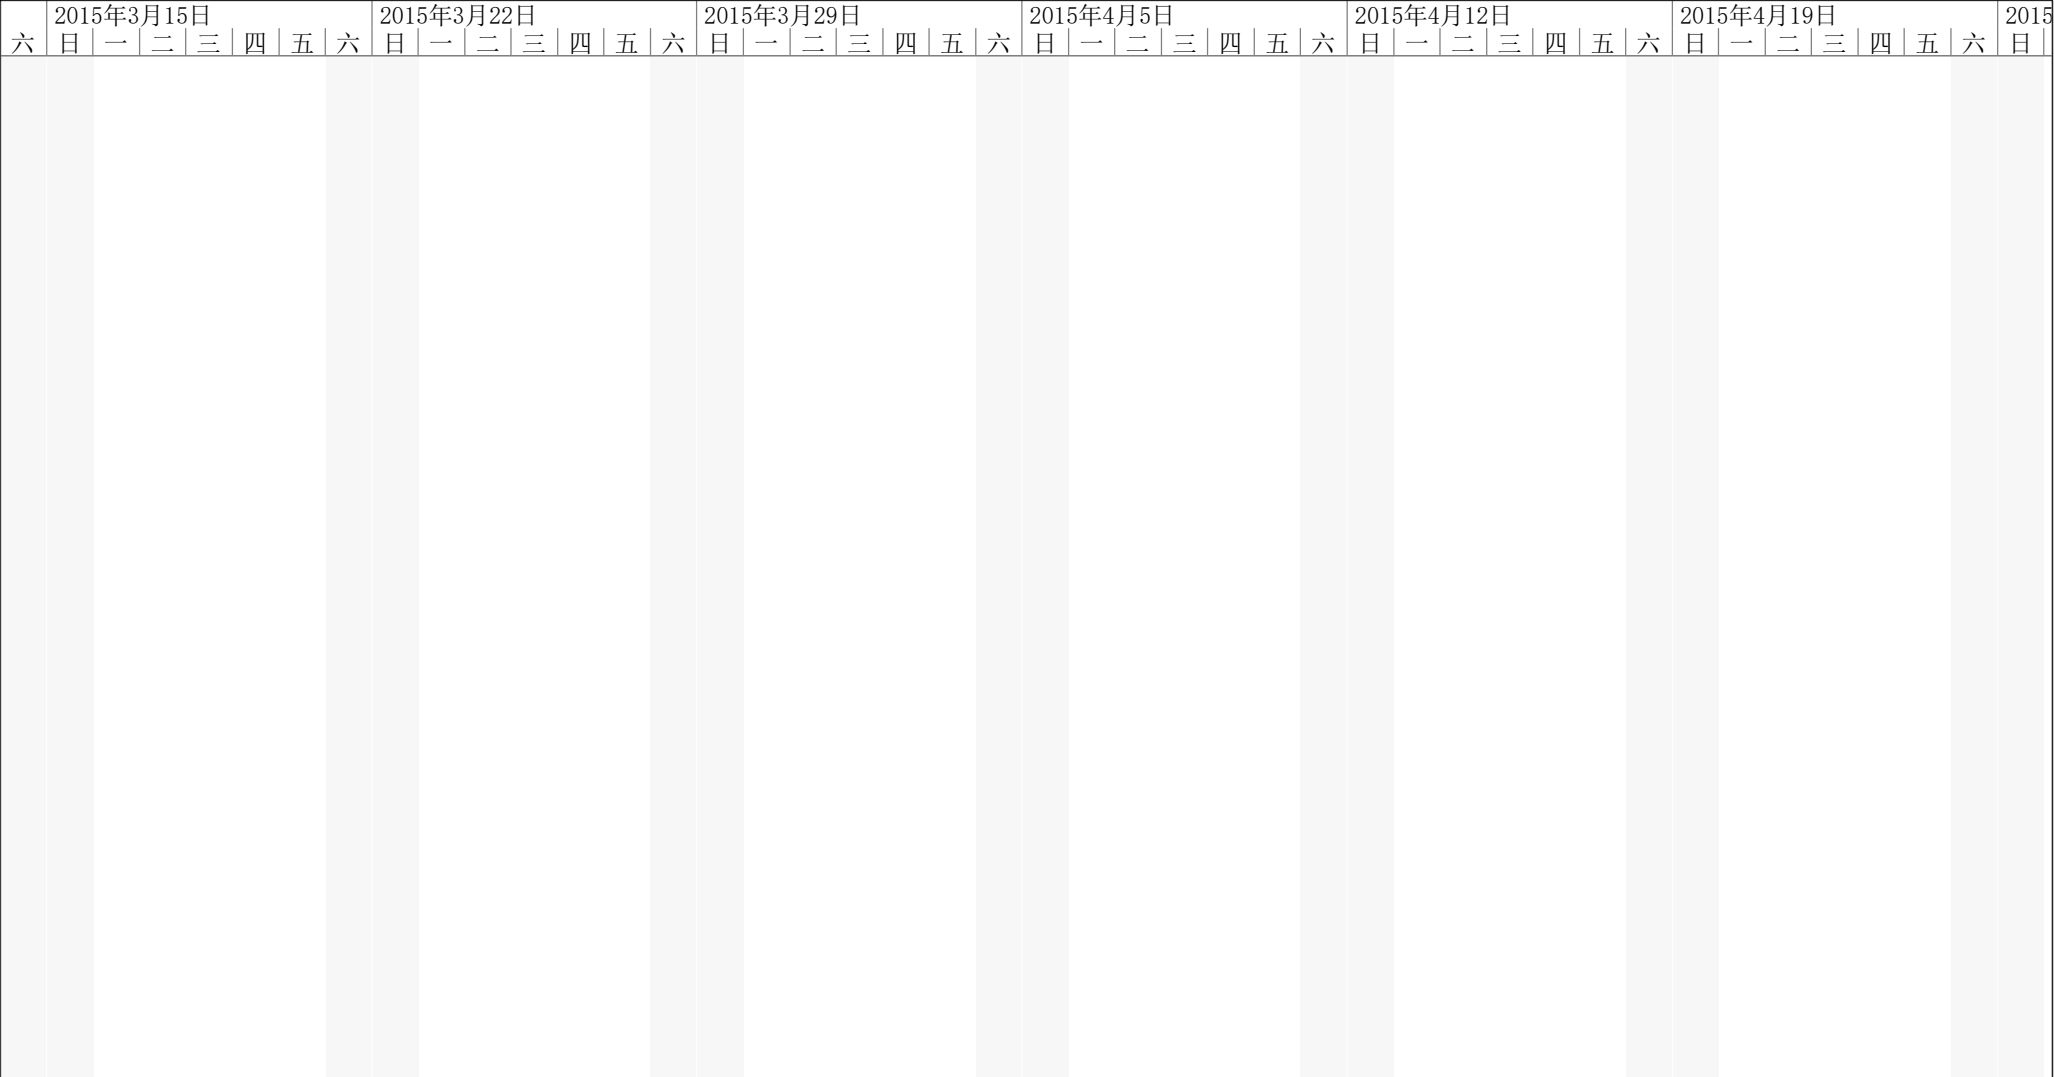




期限


进度

手动进度

























项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			





项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			



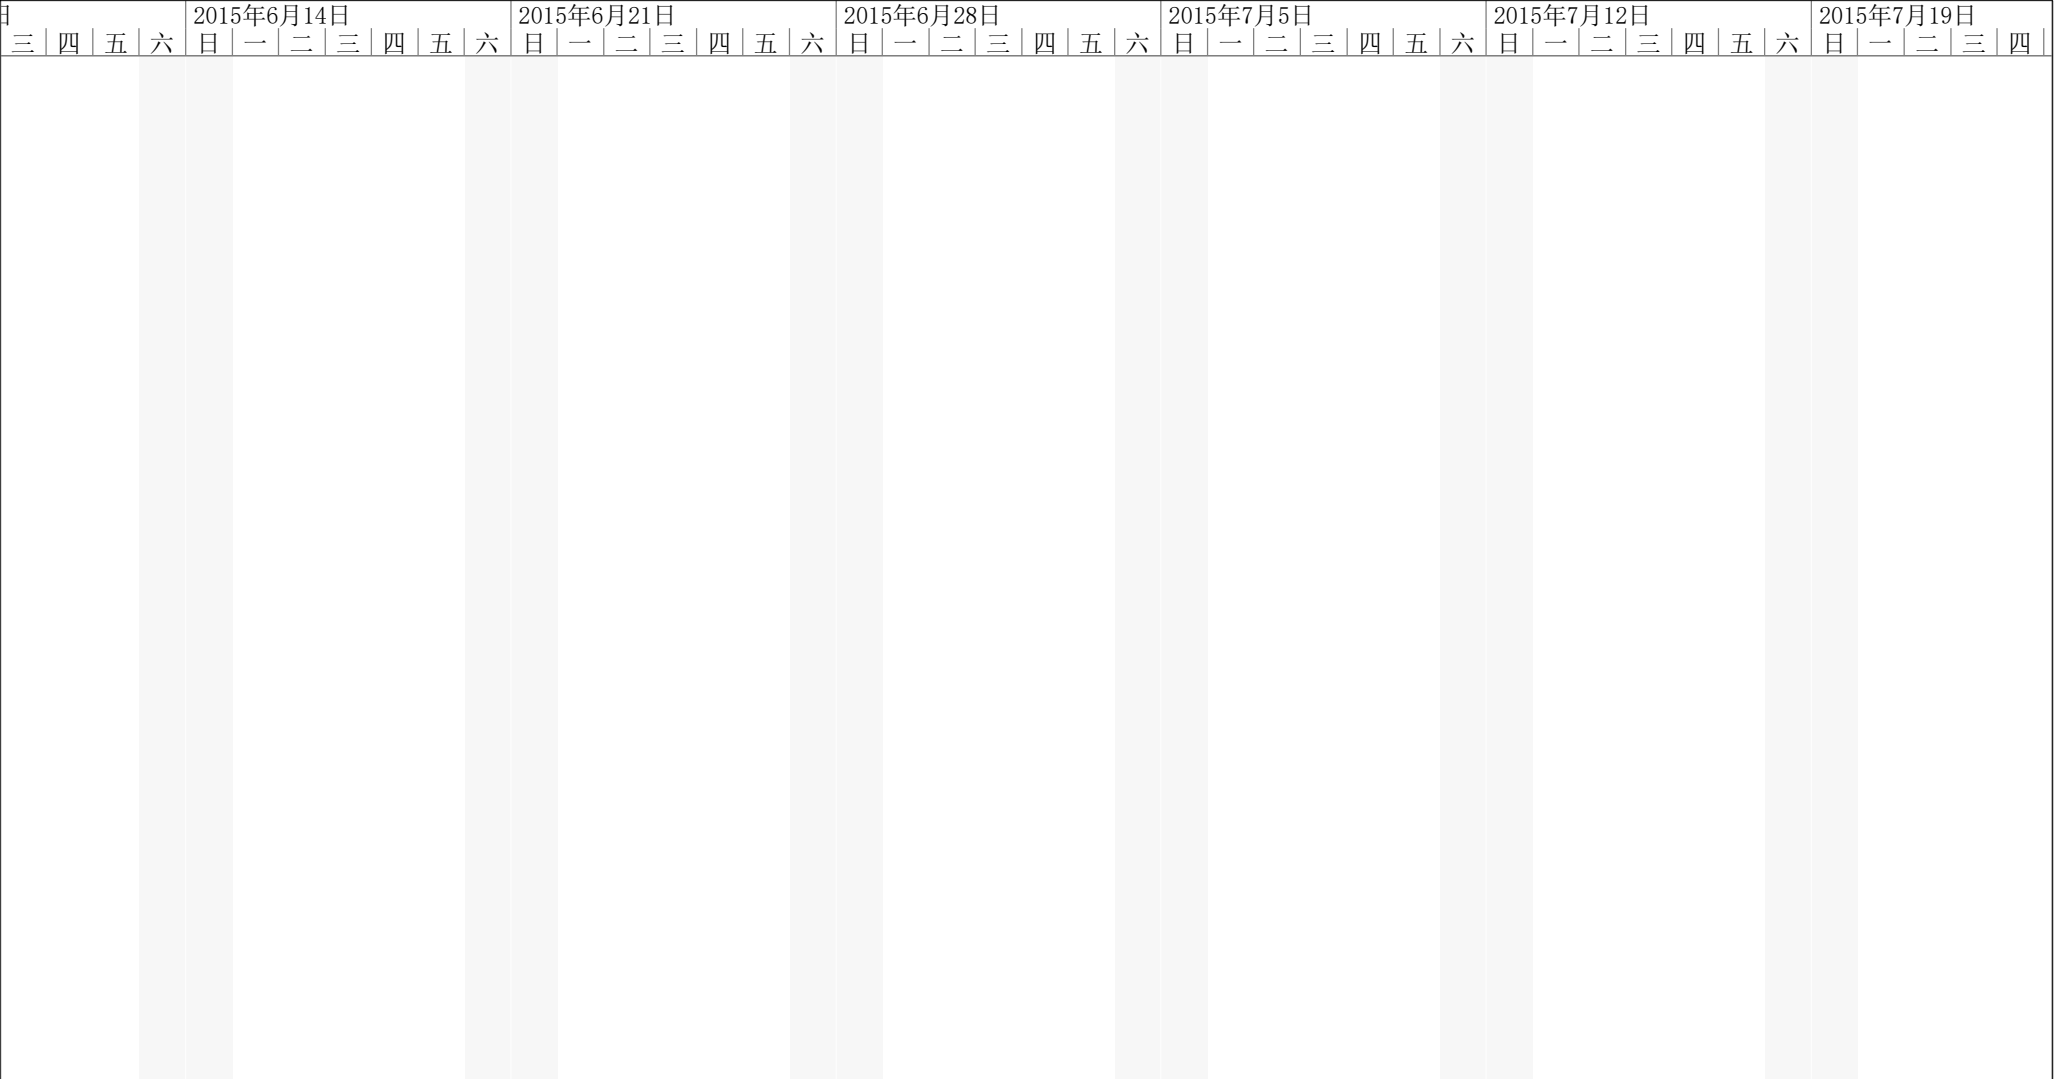

项目：msproj11  
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

◆

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

◇

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间


期限

进度

手动进度



2015年7月26日							2015年8月2日							2015年8月9日							2015年8月16日							2015年8月23日							2015年8月30日						
五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六					
项目：msproj11 日期：2019年6月19日								任务		外部任务		手动任务		仅完成时间																											
								拆分		外部里程碑		仅工期		期限																											
								里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度																											
								摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度																											
								项目摘要		非活动摘要		仅开始时间																													
第 97 页																																									

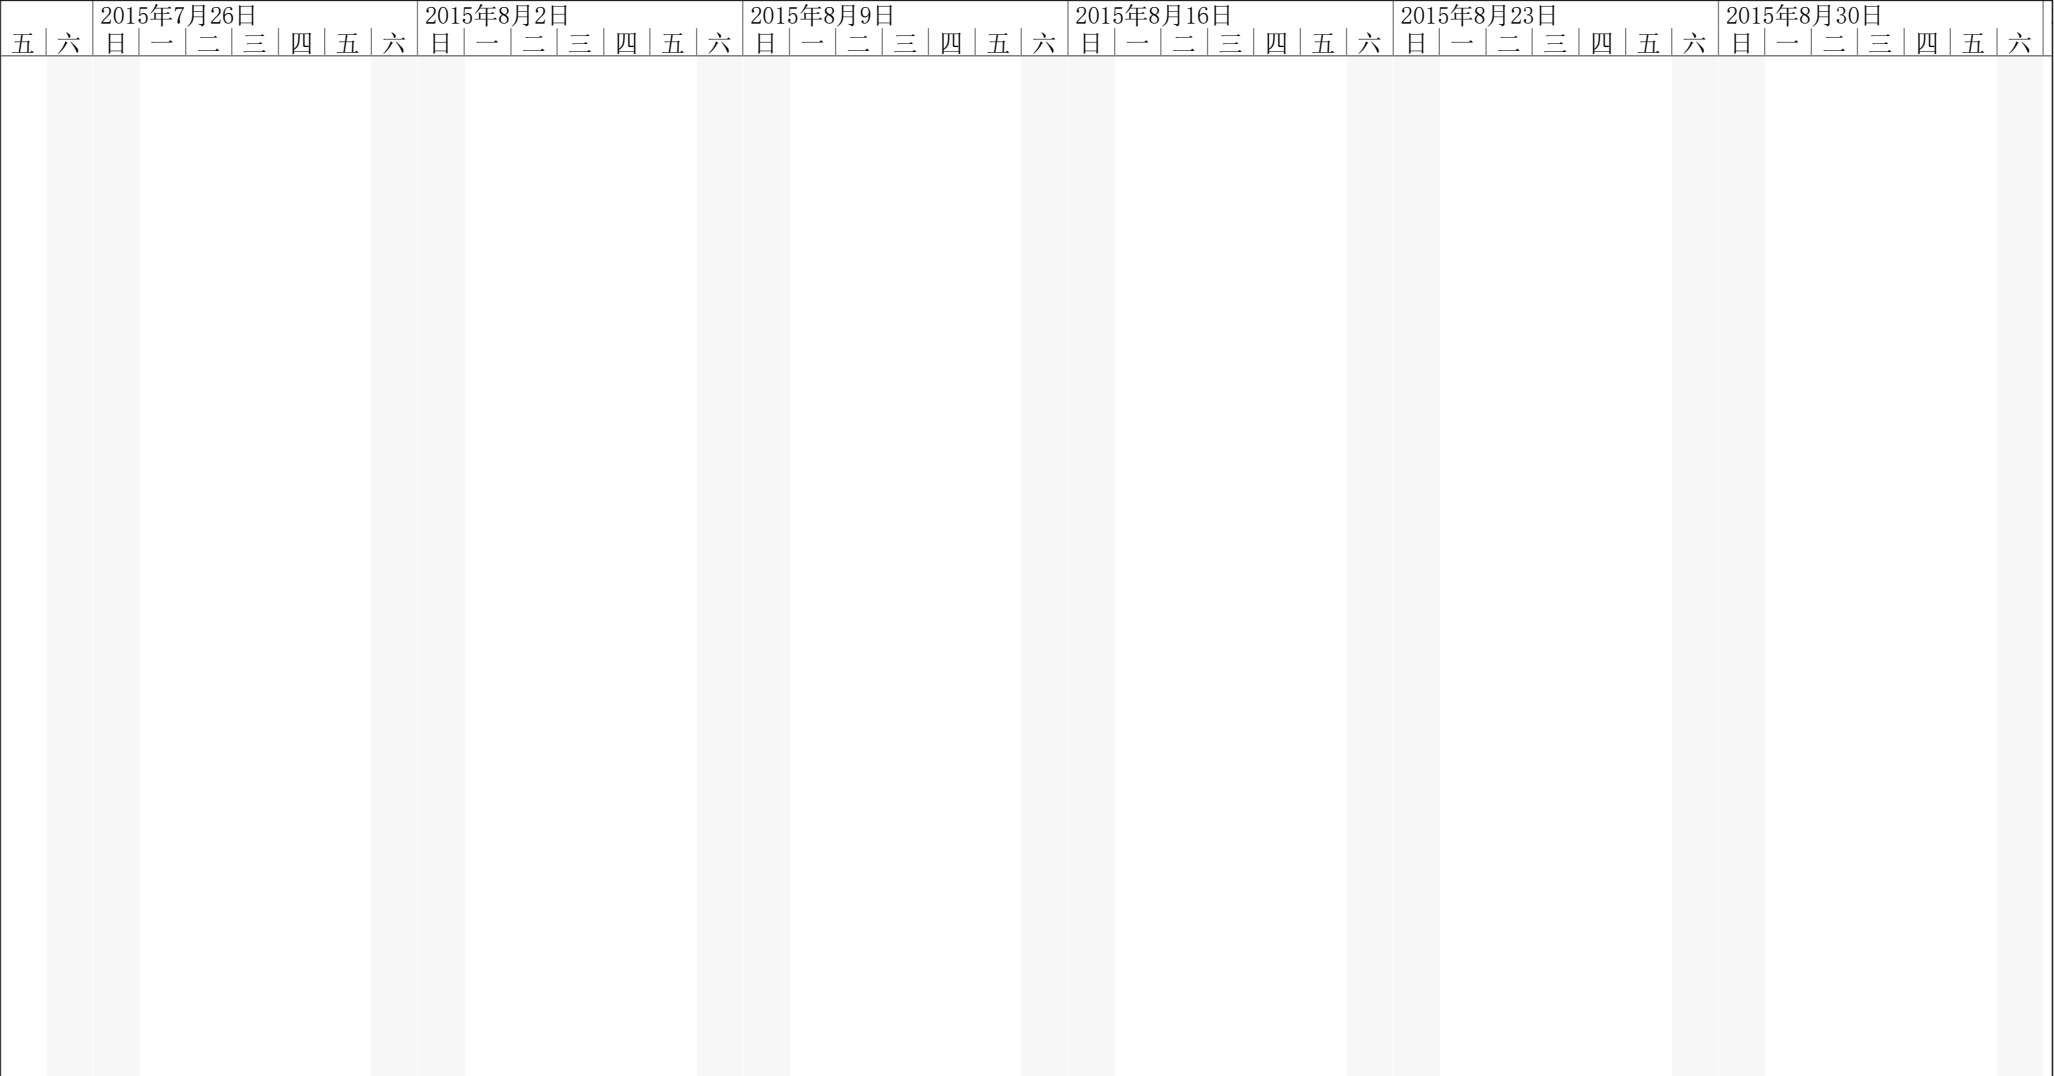

项目：msproj11  
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

期限

进度

手动进度



项目：msproj11  
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间



















仅完成时间


期限

进度

手动进度



项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			





项目：msproj11  
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间


期限

进度

手动进度

[illegible]


项目: msproj11 日期: 2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			

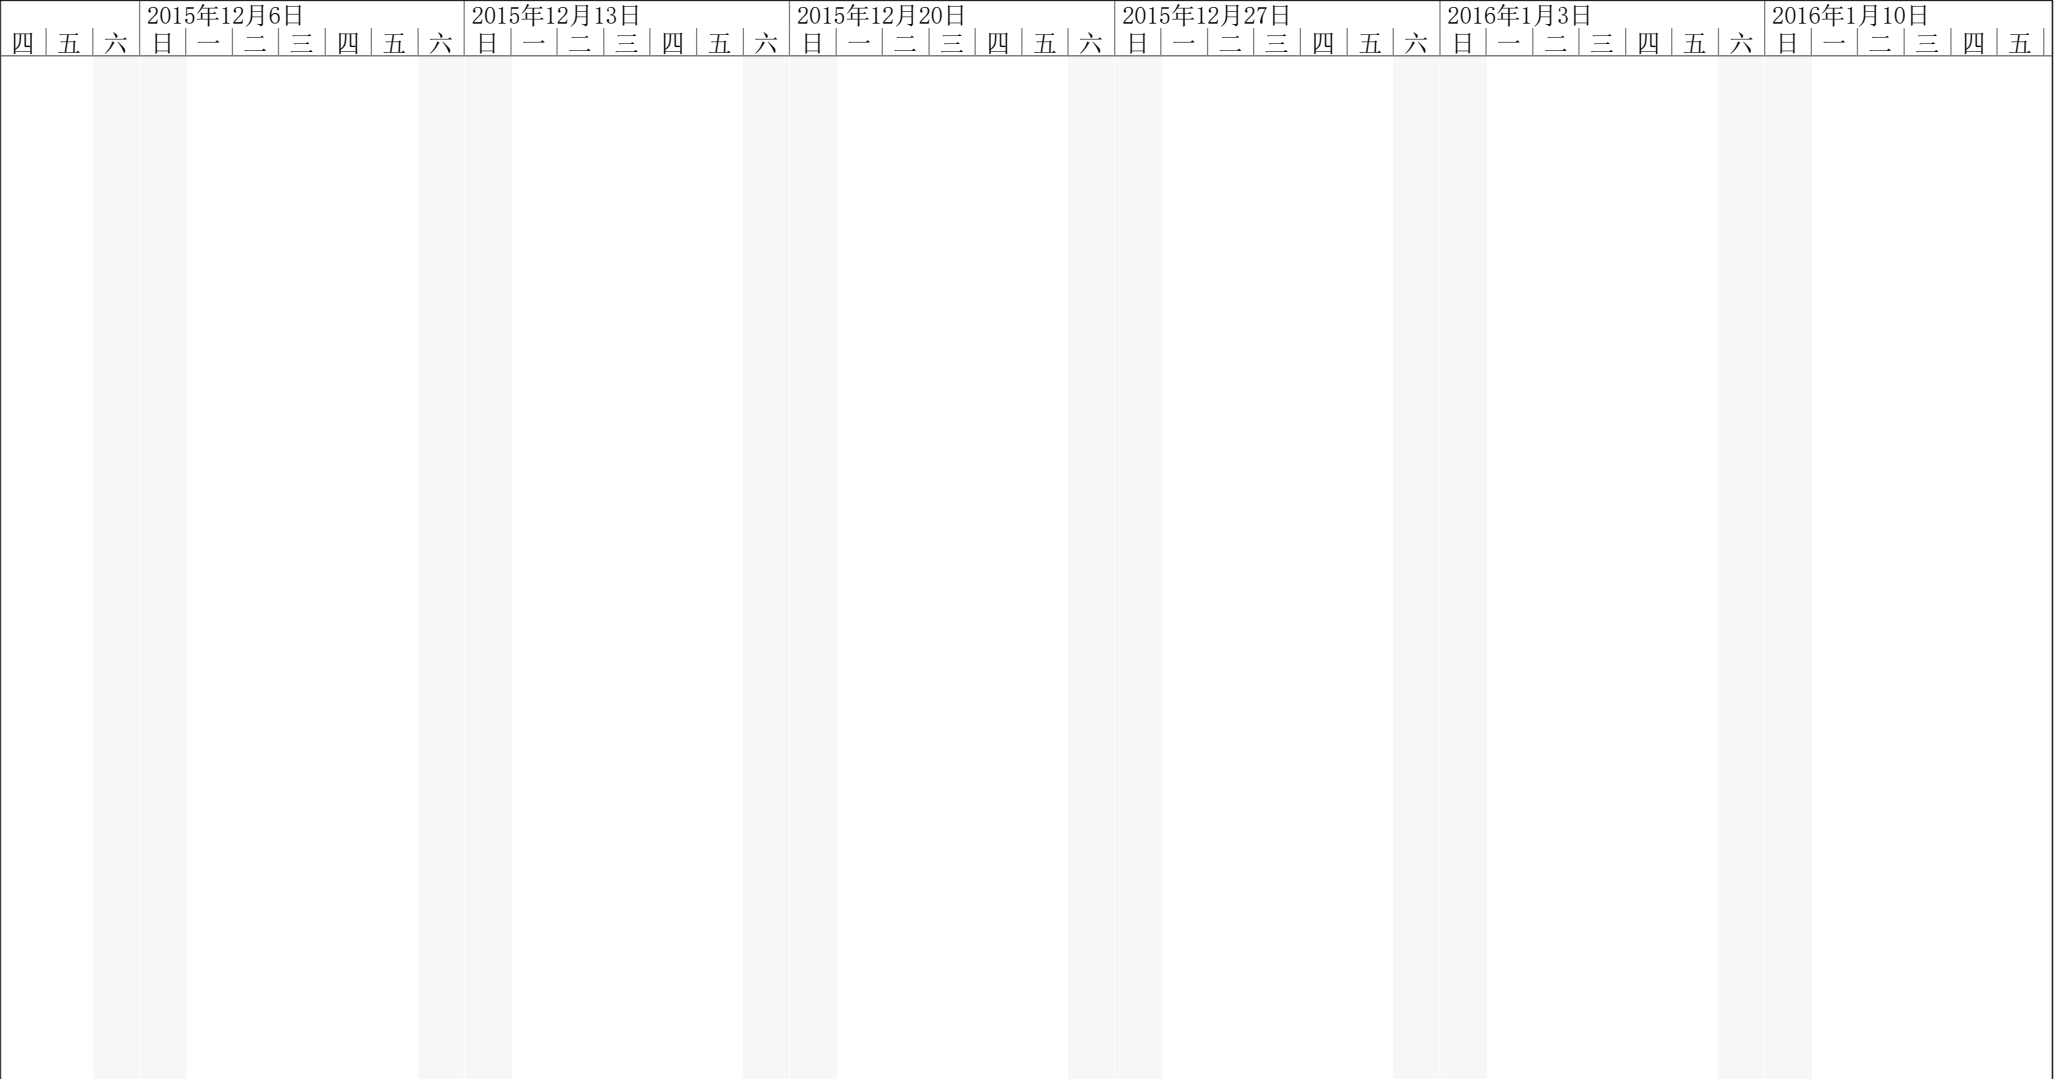

项目：msproj11  
日期：2019年6月19日

任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			



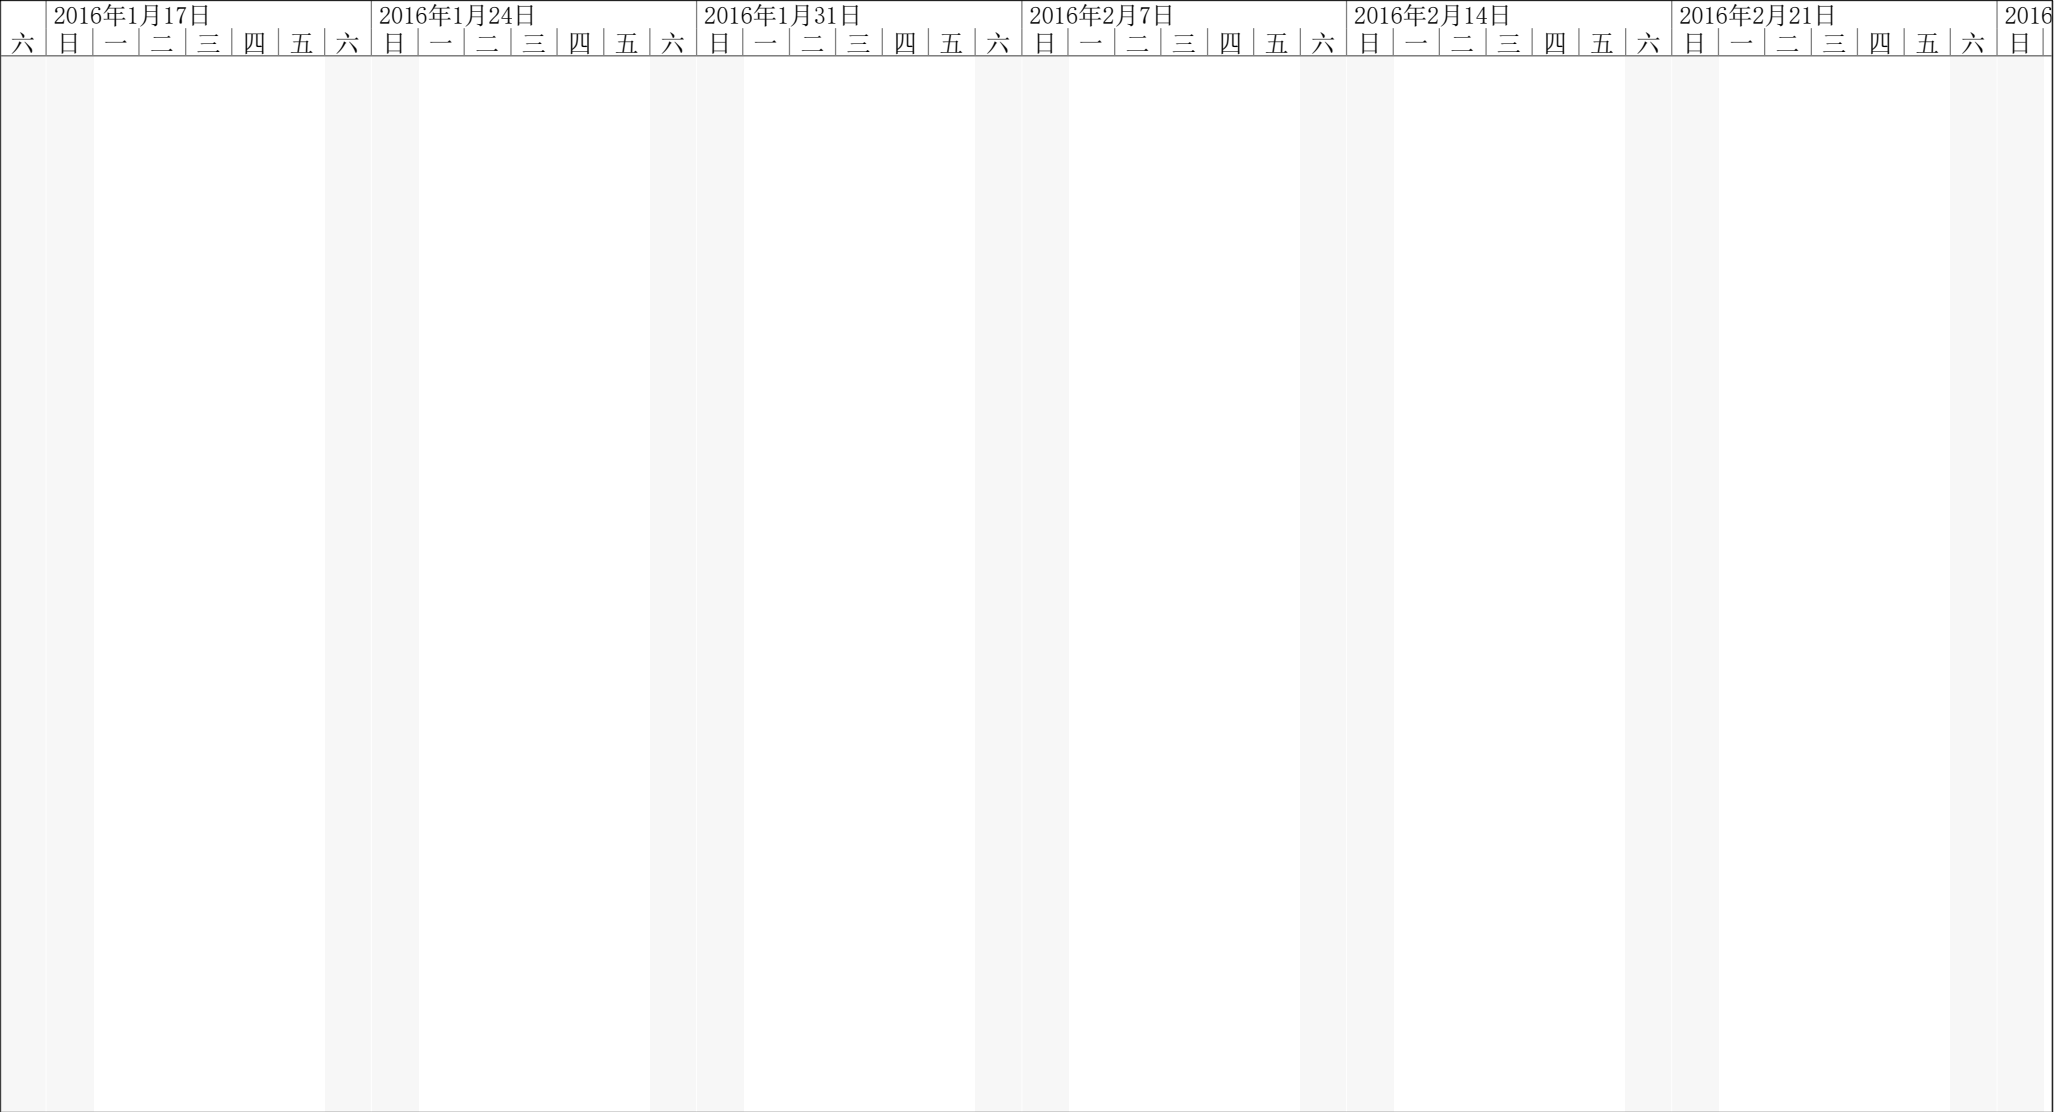

项目：msproj11  
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要


仅开始时间









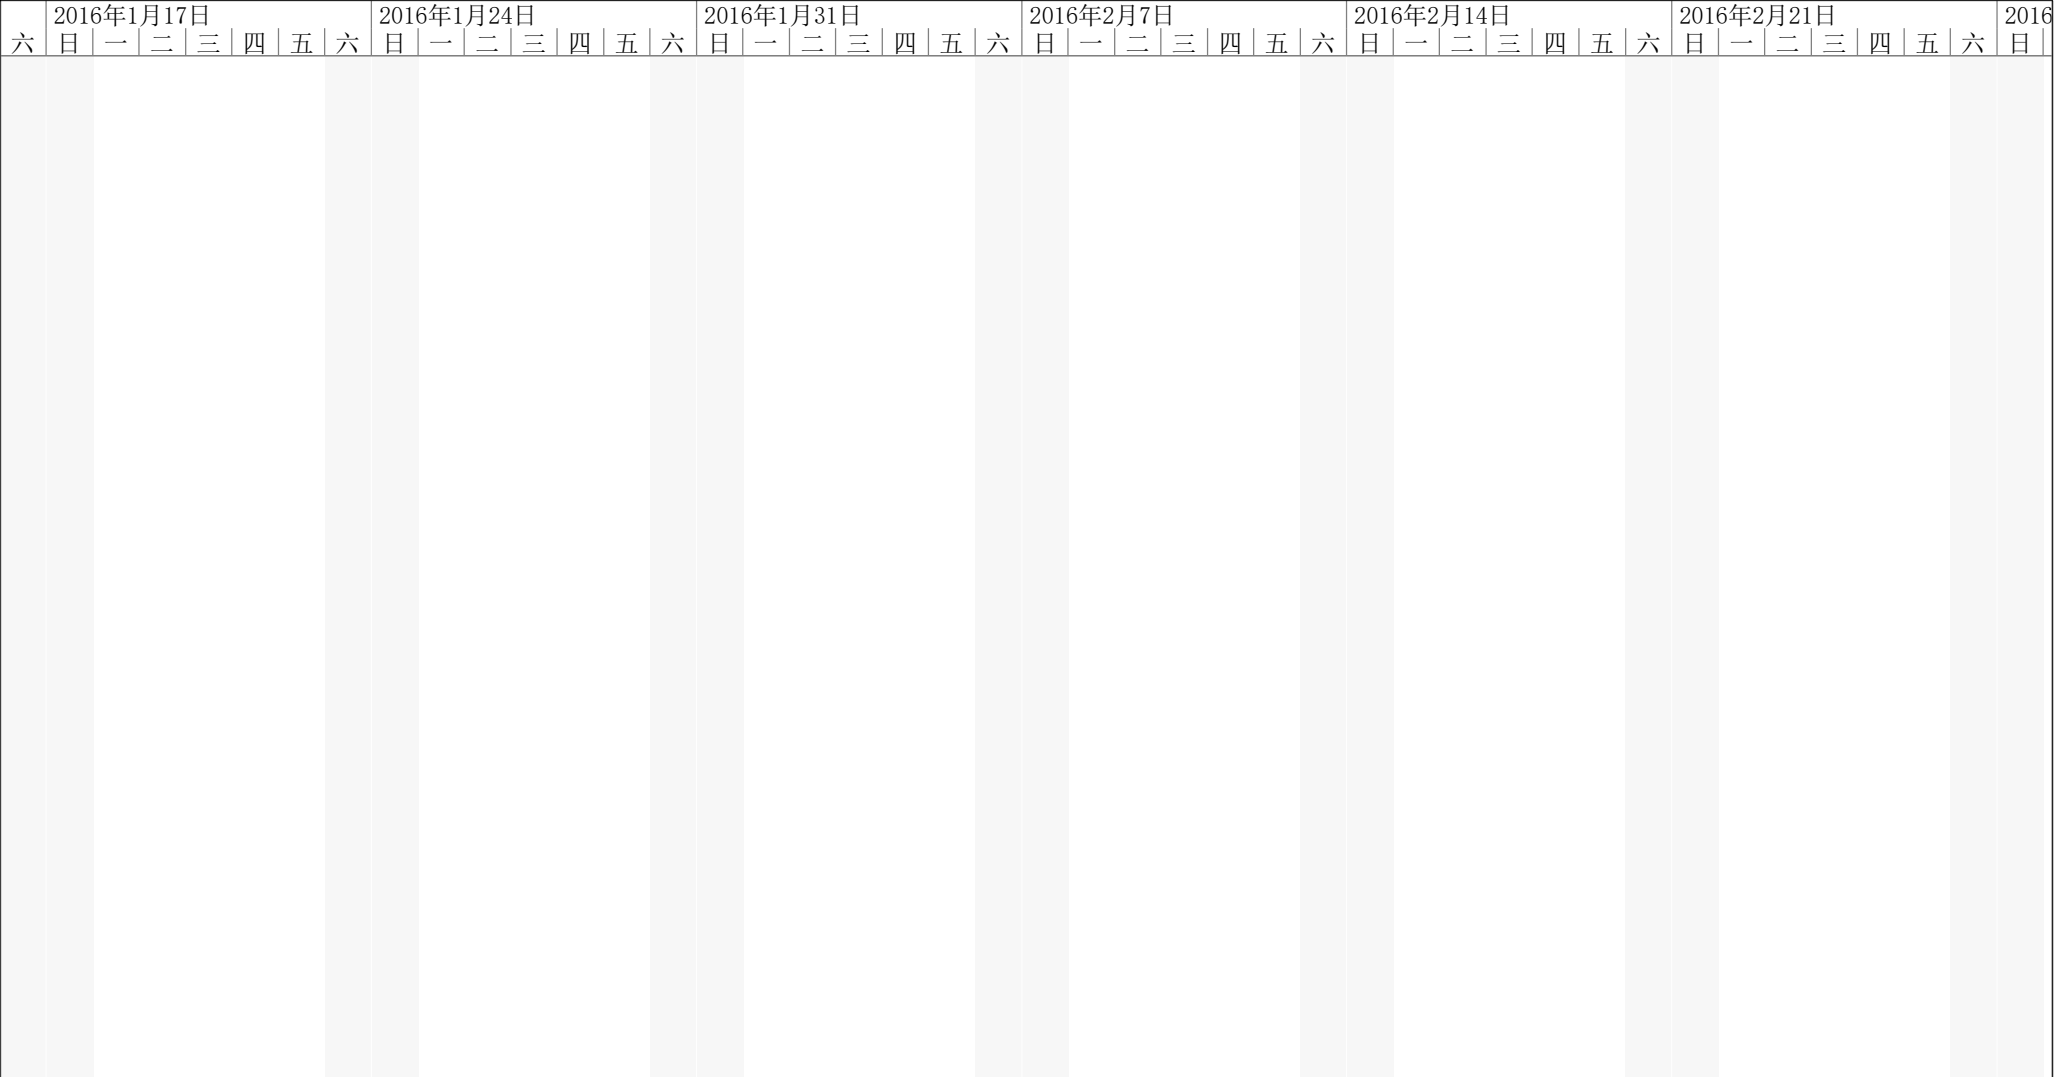

仅完成时间

期限

进度

手动进度



项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			



项目：msproj11  
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

◆

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

◆

◇

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

期限

进度

手动进度

┌

└

↓



项目：msproj11  
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

期限

进度

手动进度

第 108 页

[illegible]

项目：msproj11

日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要


仅开始时间

仅完成时间

期限

进度

手动进度

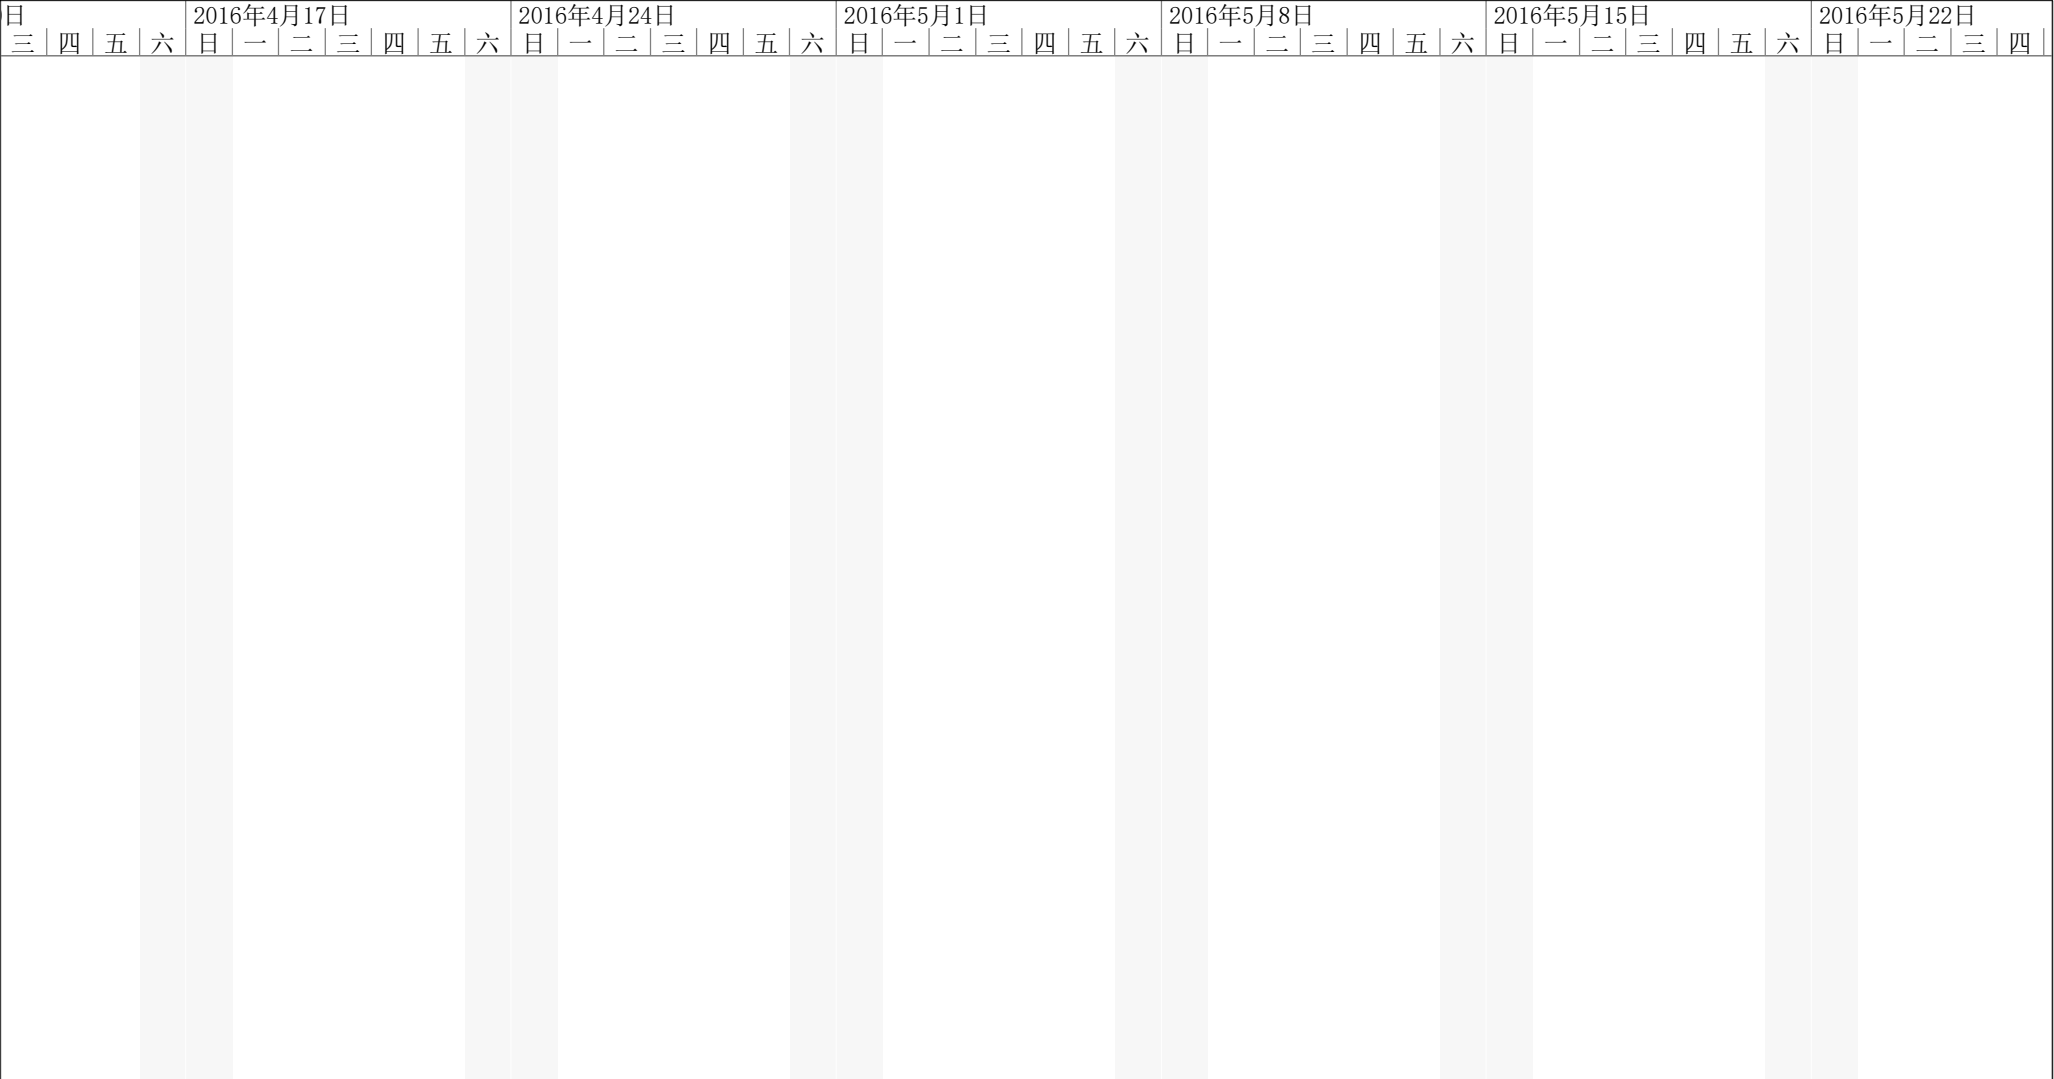

项目：msproj11  
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要


仅开始时间

仅完成时间

期限

进度

手动进度












五	六	2016年5月29日						2016年6月5日						2016年6月12日						2016年6月19日						2016年6月26日						2016年7月3日					
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六			

项目：msproj11  
日期：2019年6月19日





任务	外部任务	手动任务	仅完成时间
拆分	外部里程碑	仅工期	期限
里程碑	非活动任务	手动摘要总成	进度
摘要	非活动里程碑	手动摘要	手动进度
项目摘要	非活动摘要	仅开始时间	






项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			



项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			

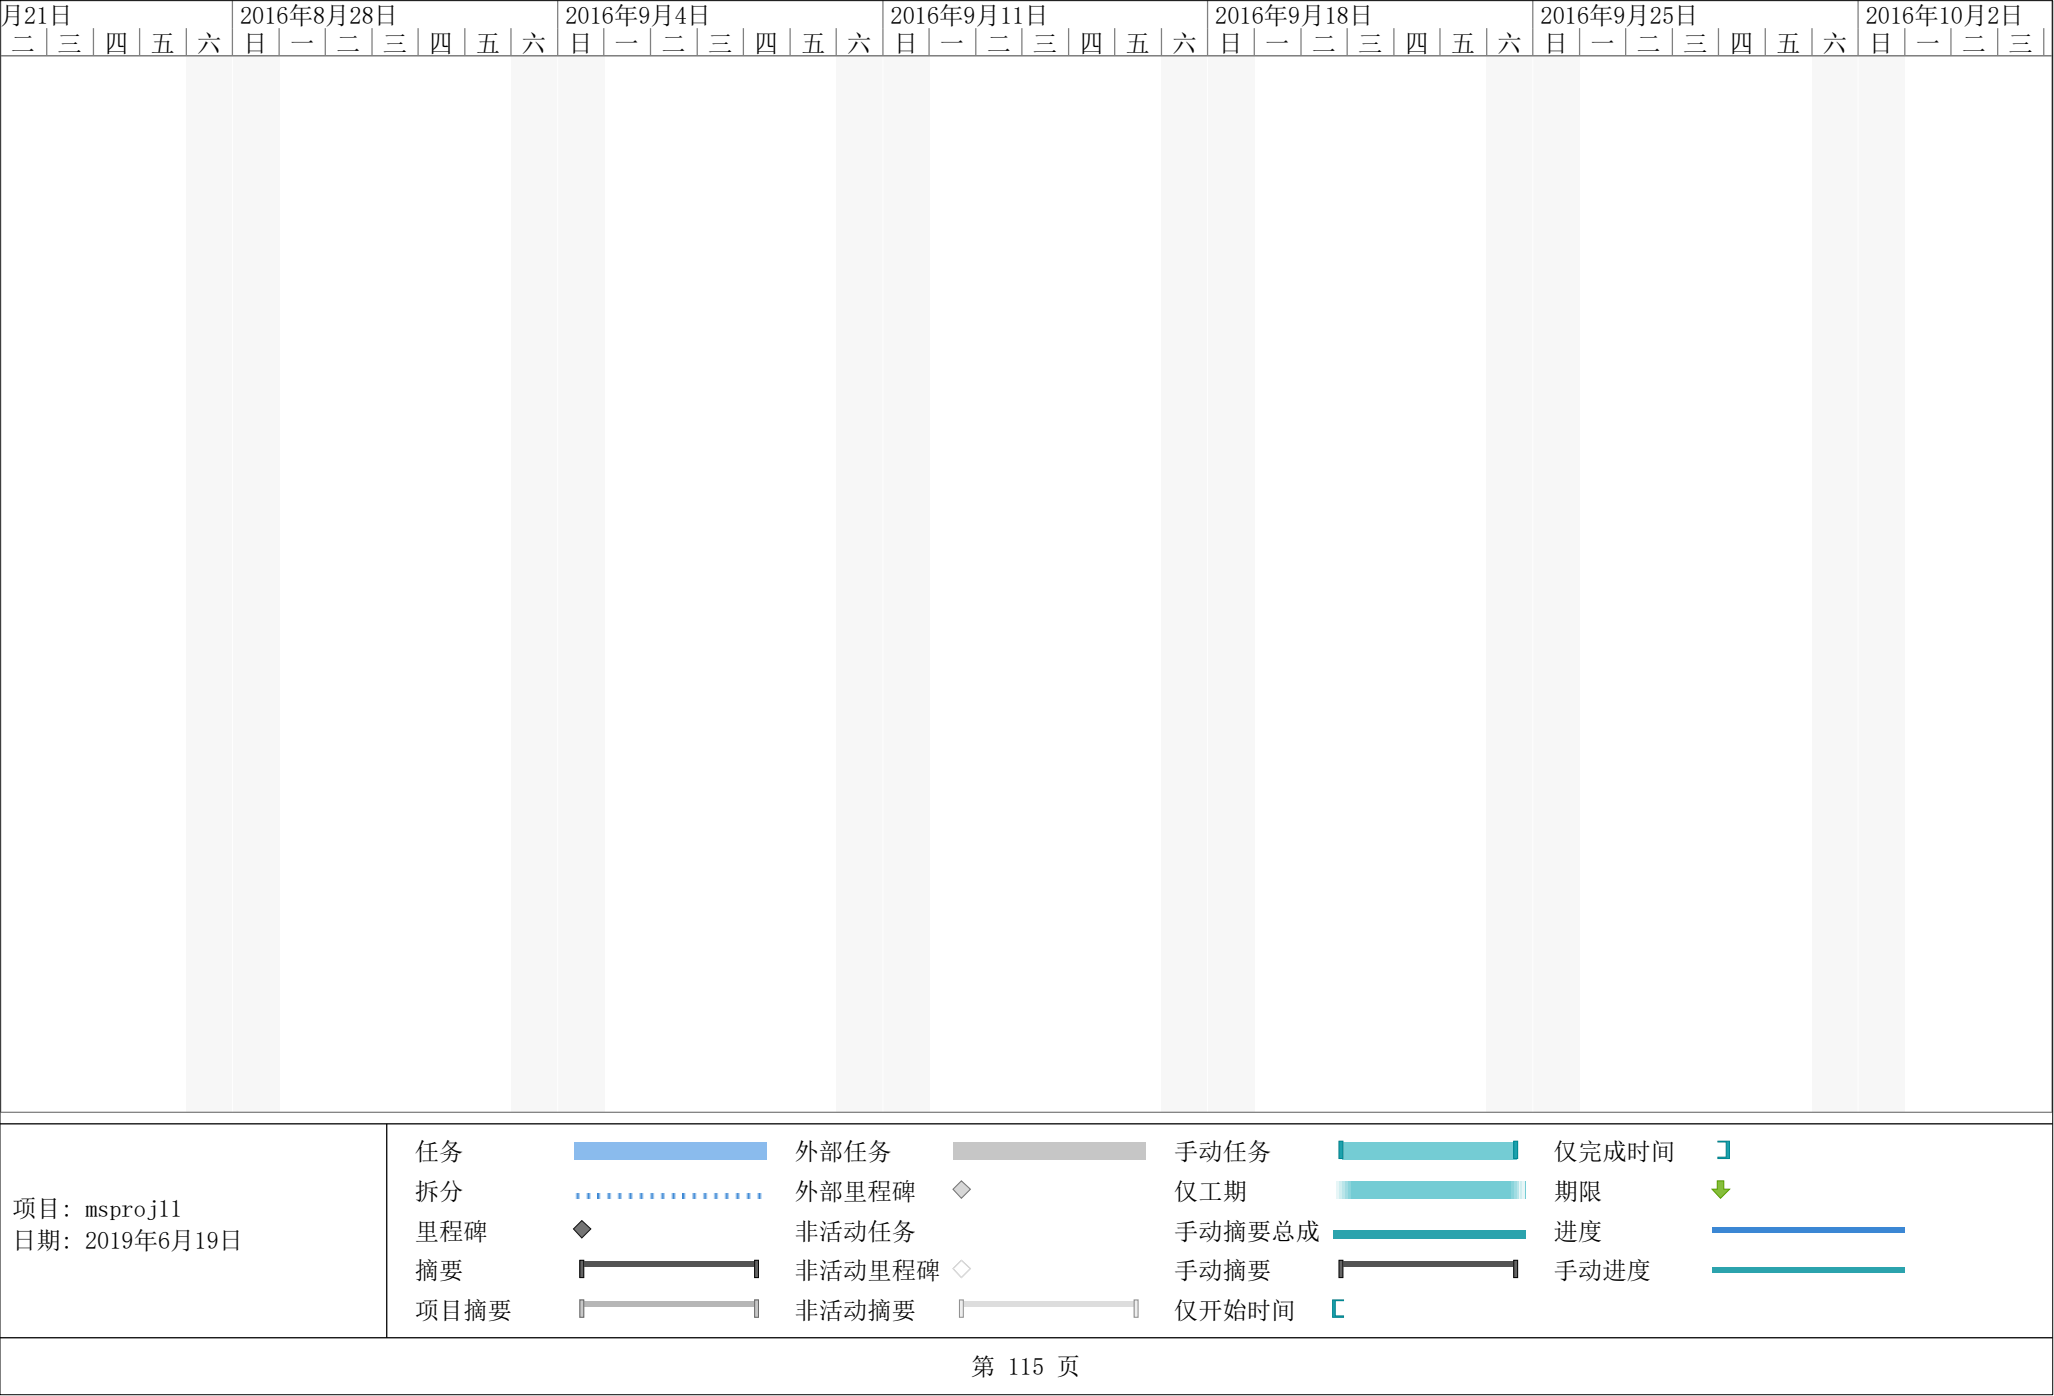



项目：msproj11  
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

◆

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

◇

◇

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间


仅完成时间


期限

进度

手动进度

↓

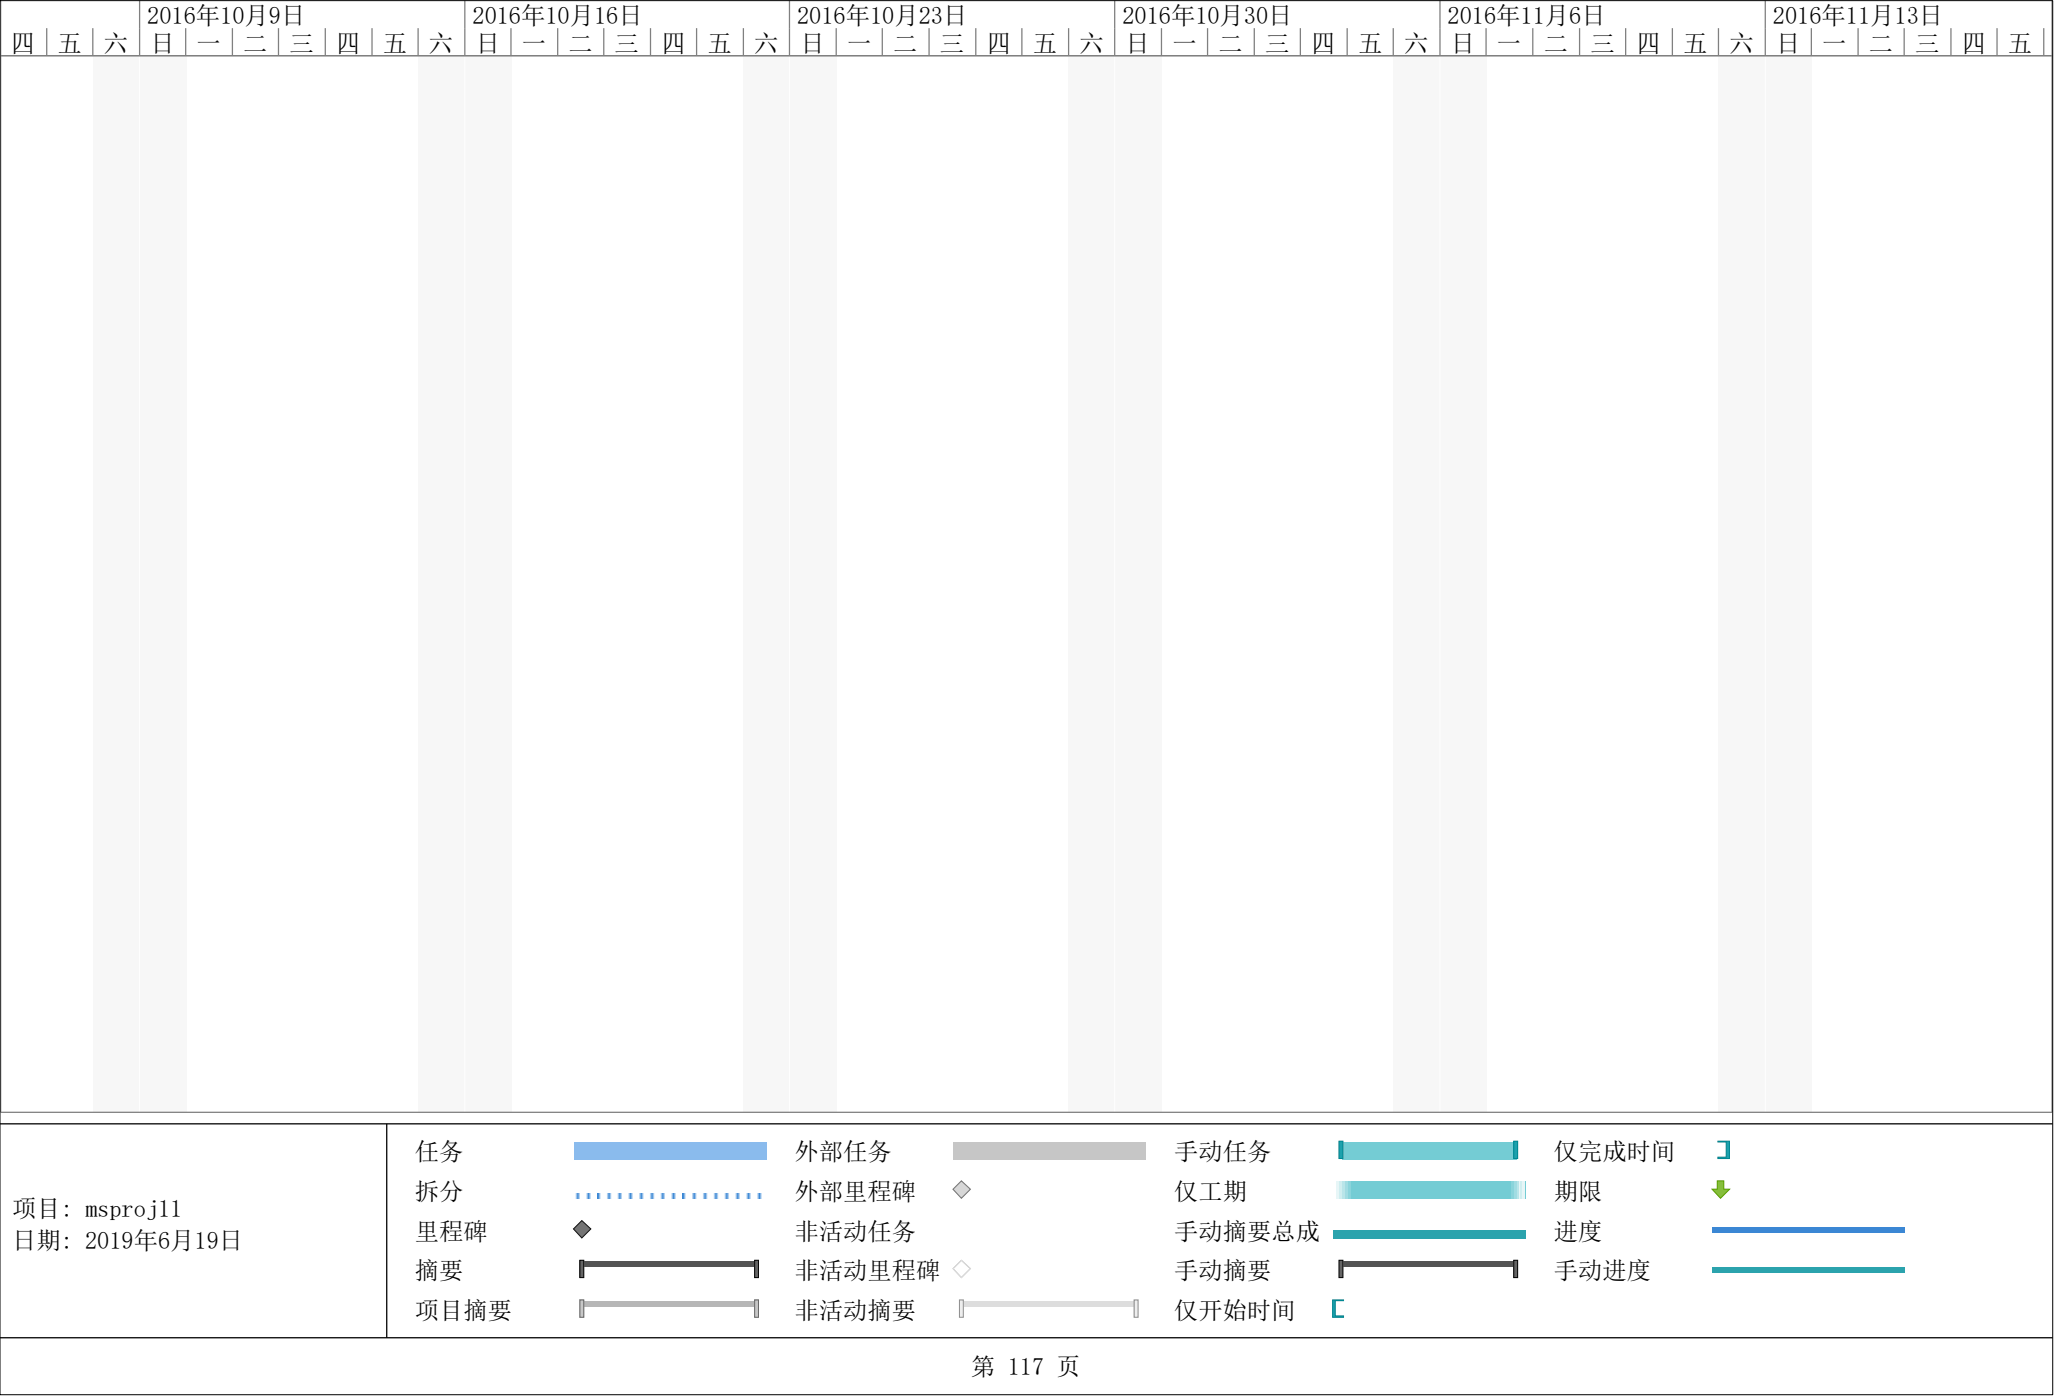

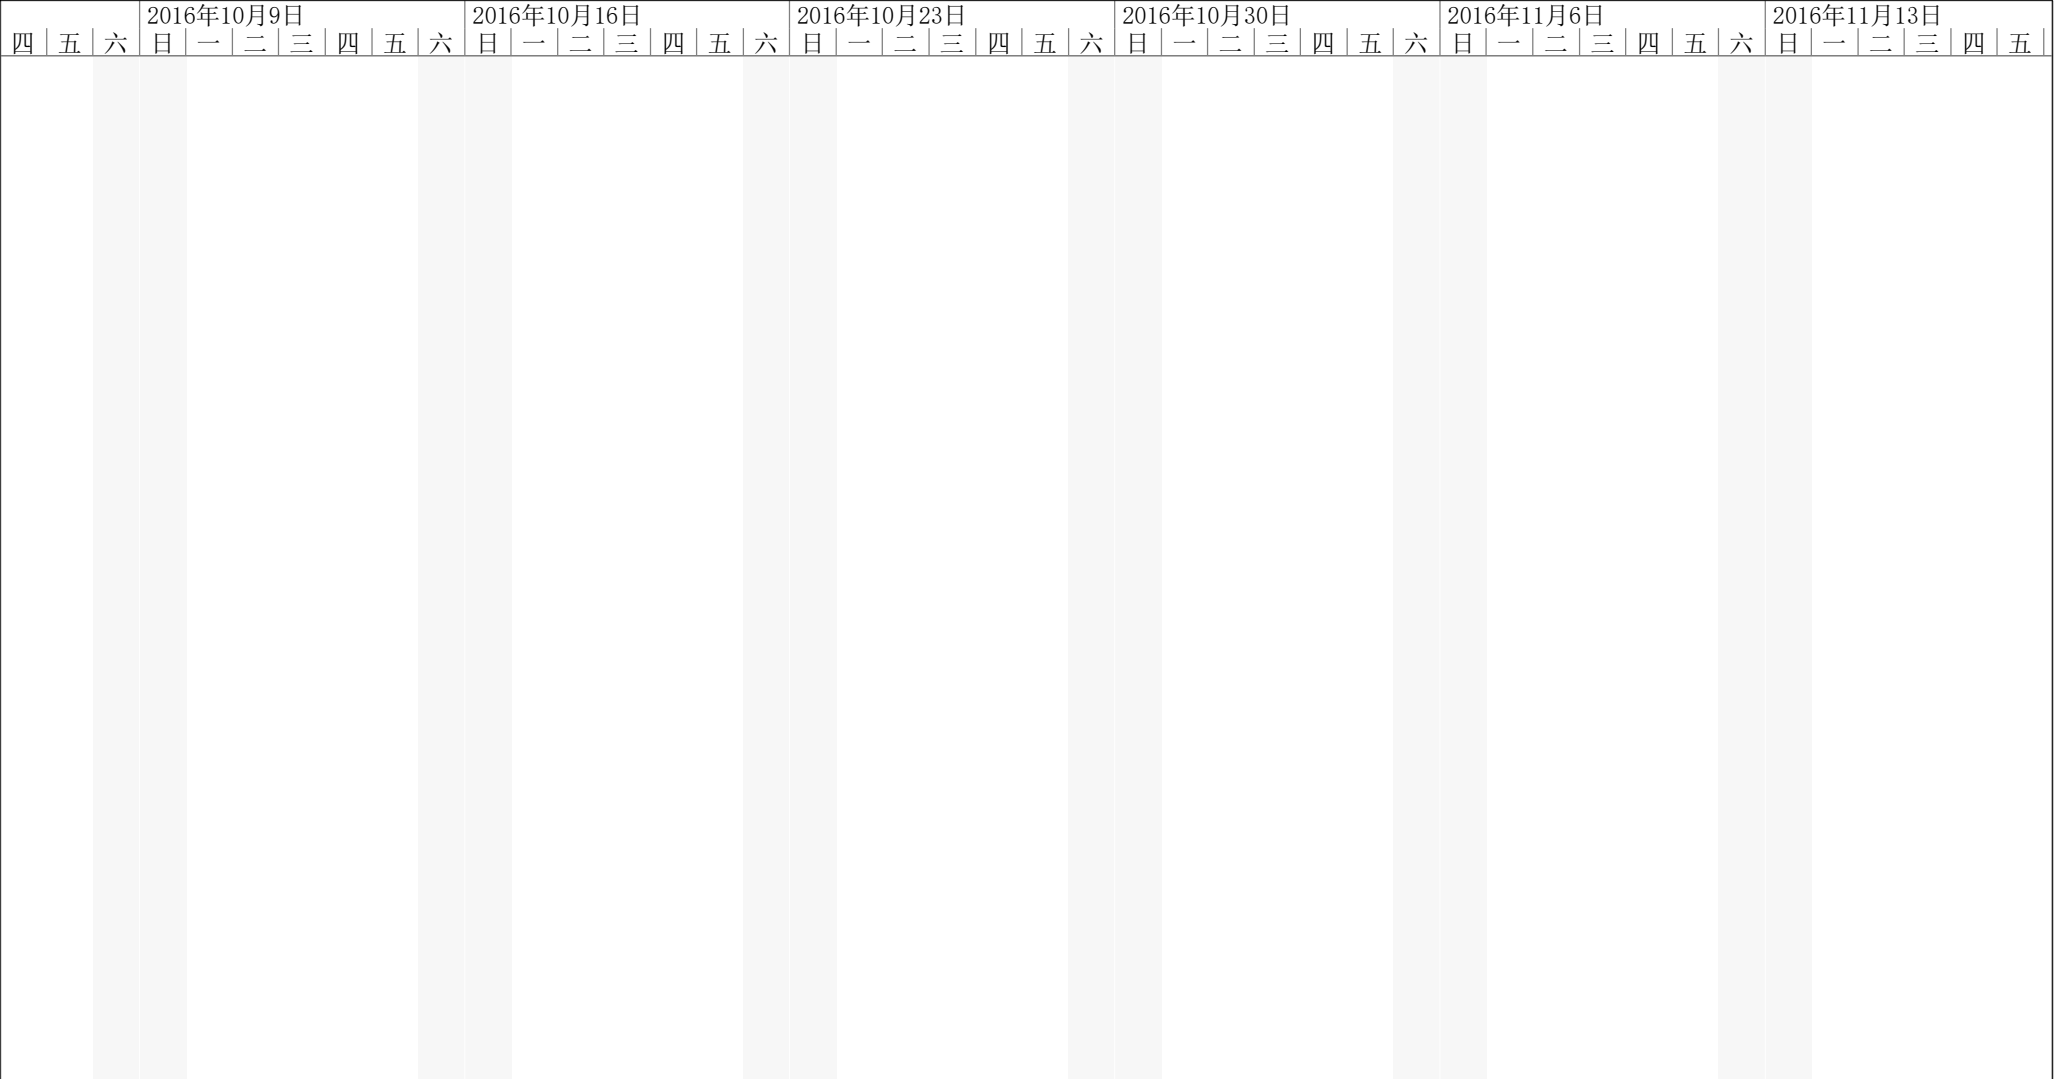

项目：msproj11  
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

◆

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

◇

◇

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

期限

进度

手动进度


手动任务

仅工期


手动摘要总成





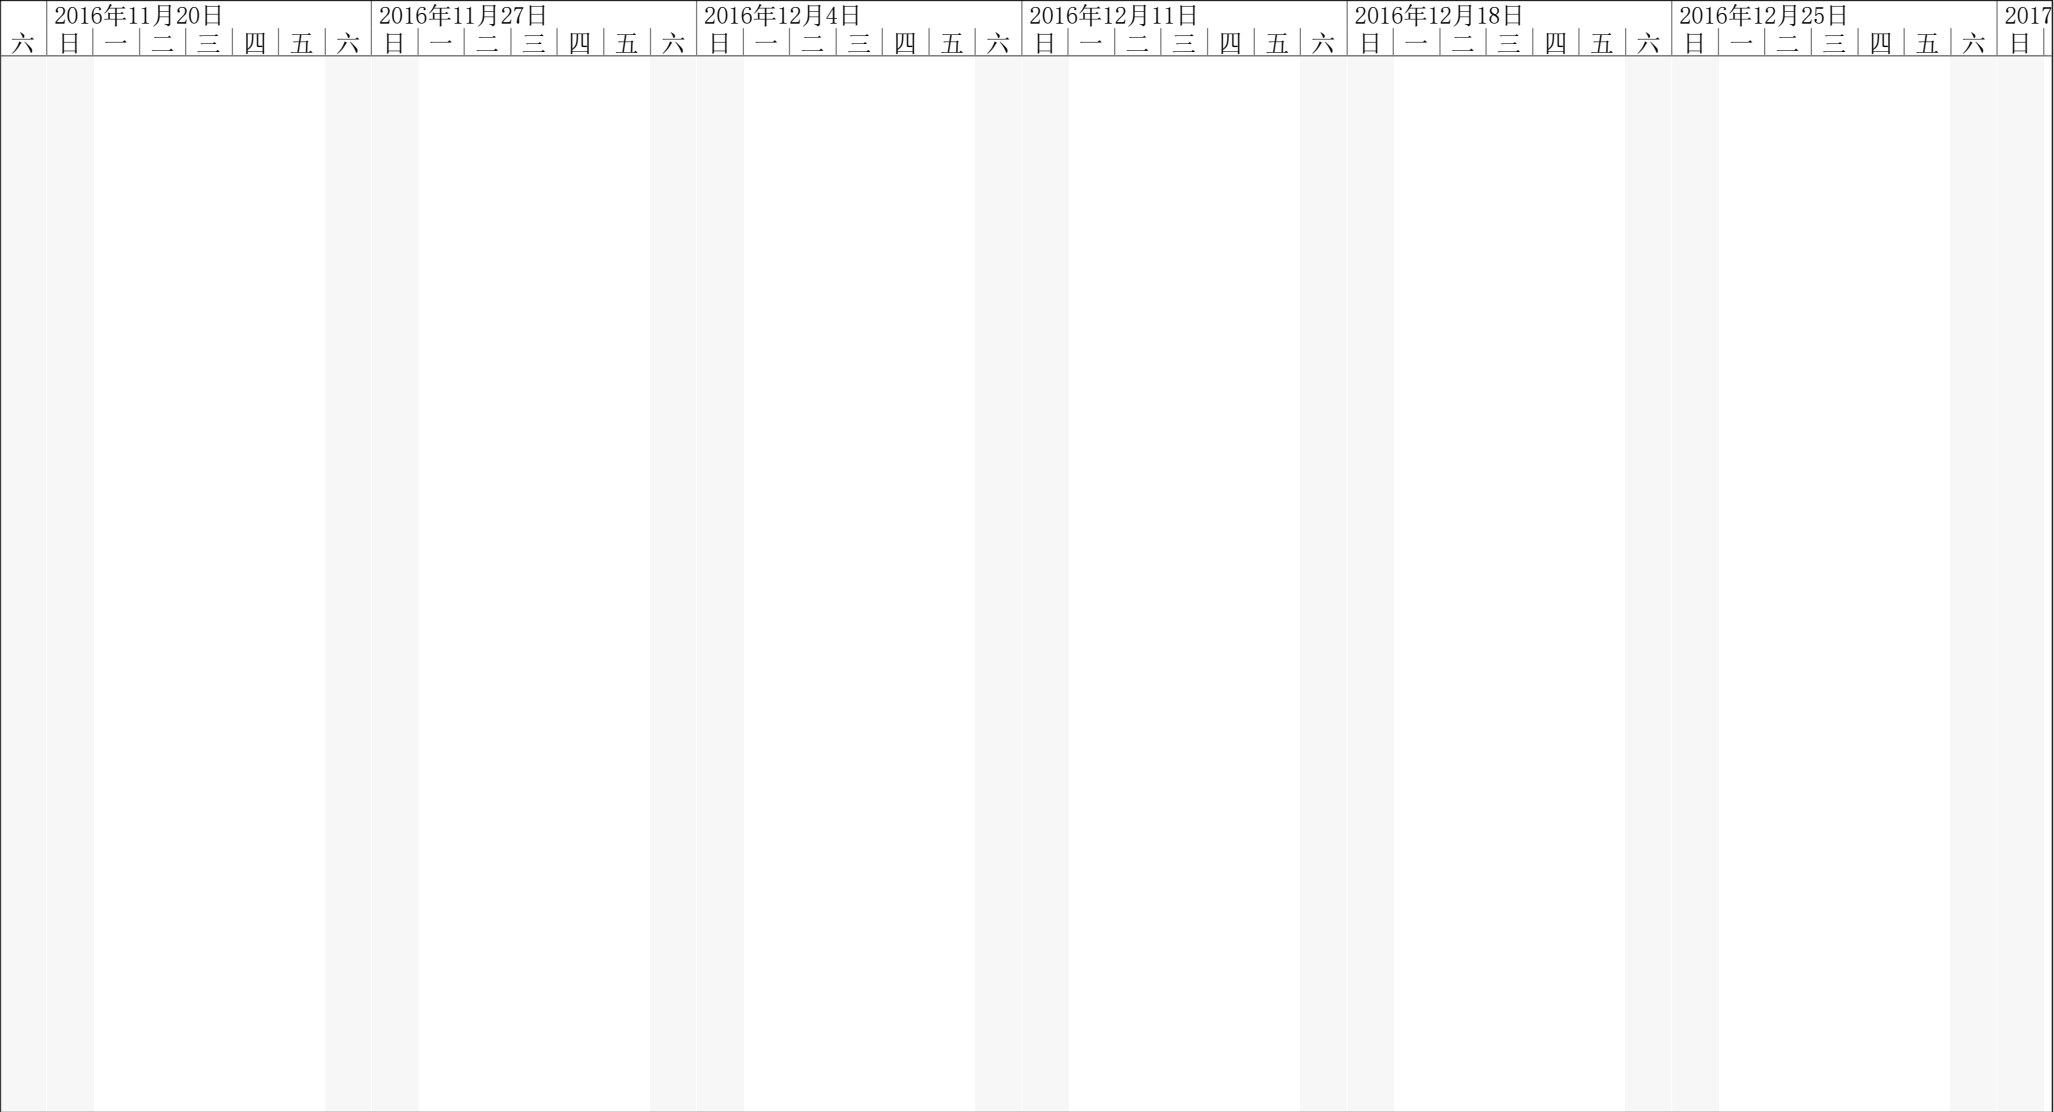



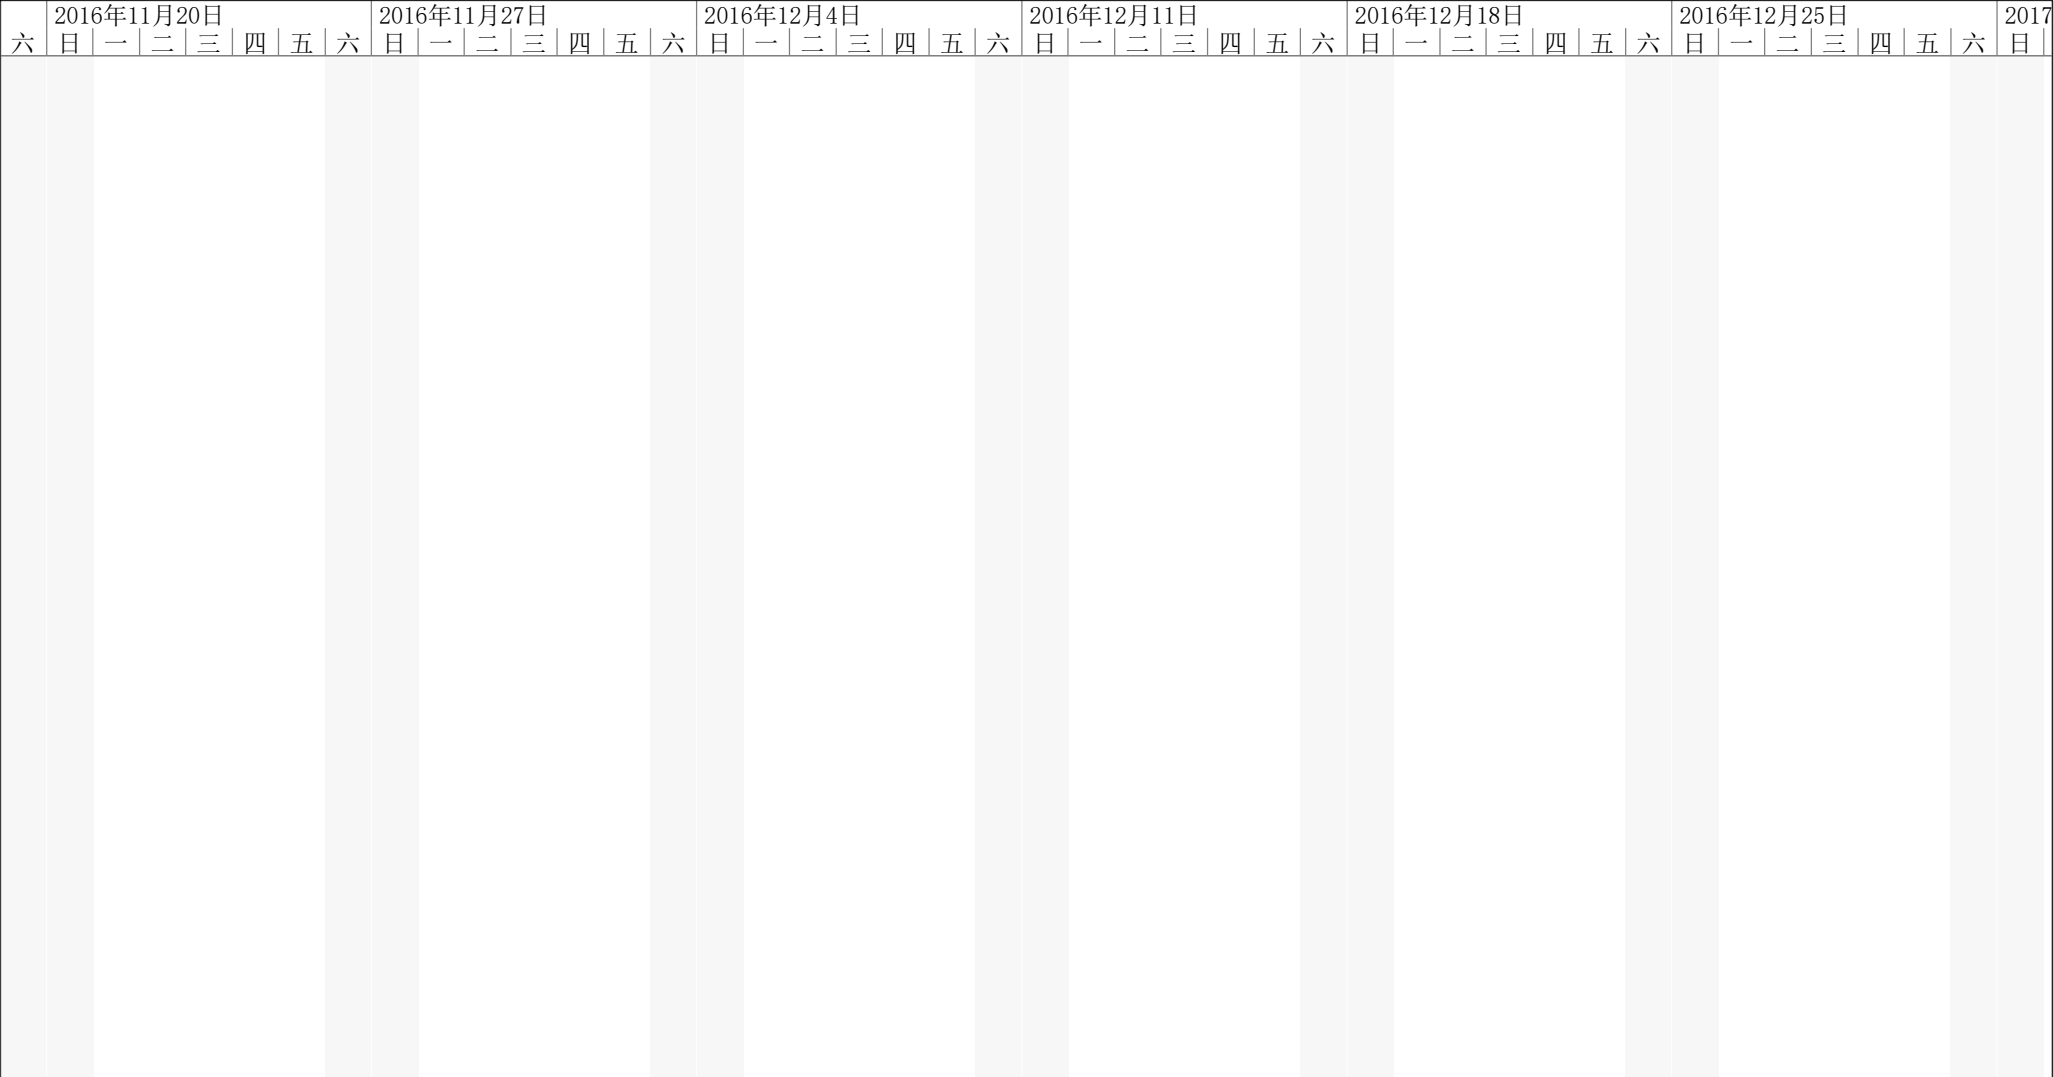





手动摘要

仅开始时间



项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			





















项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			






项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			



项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			

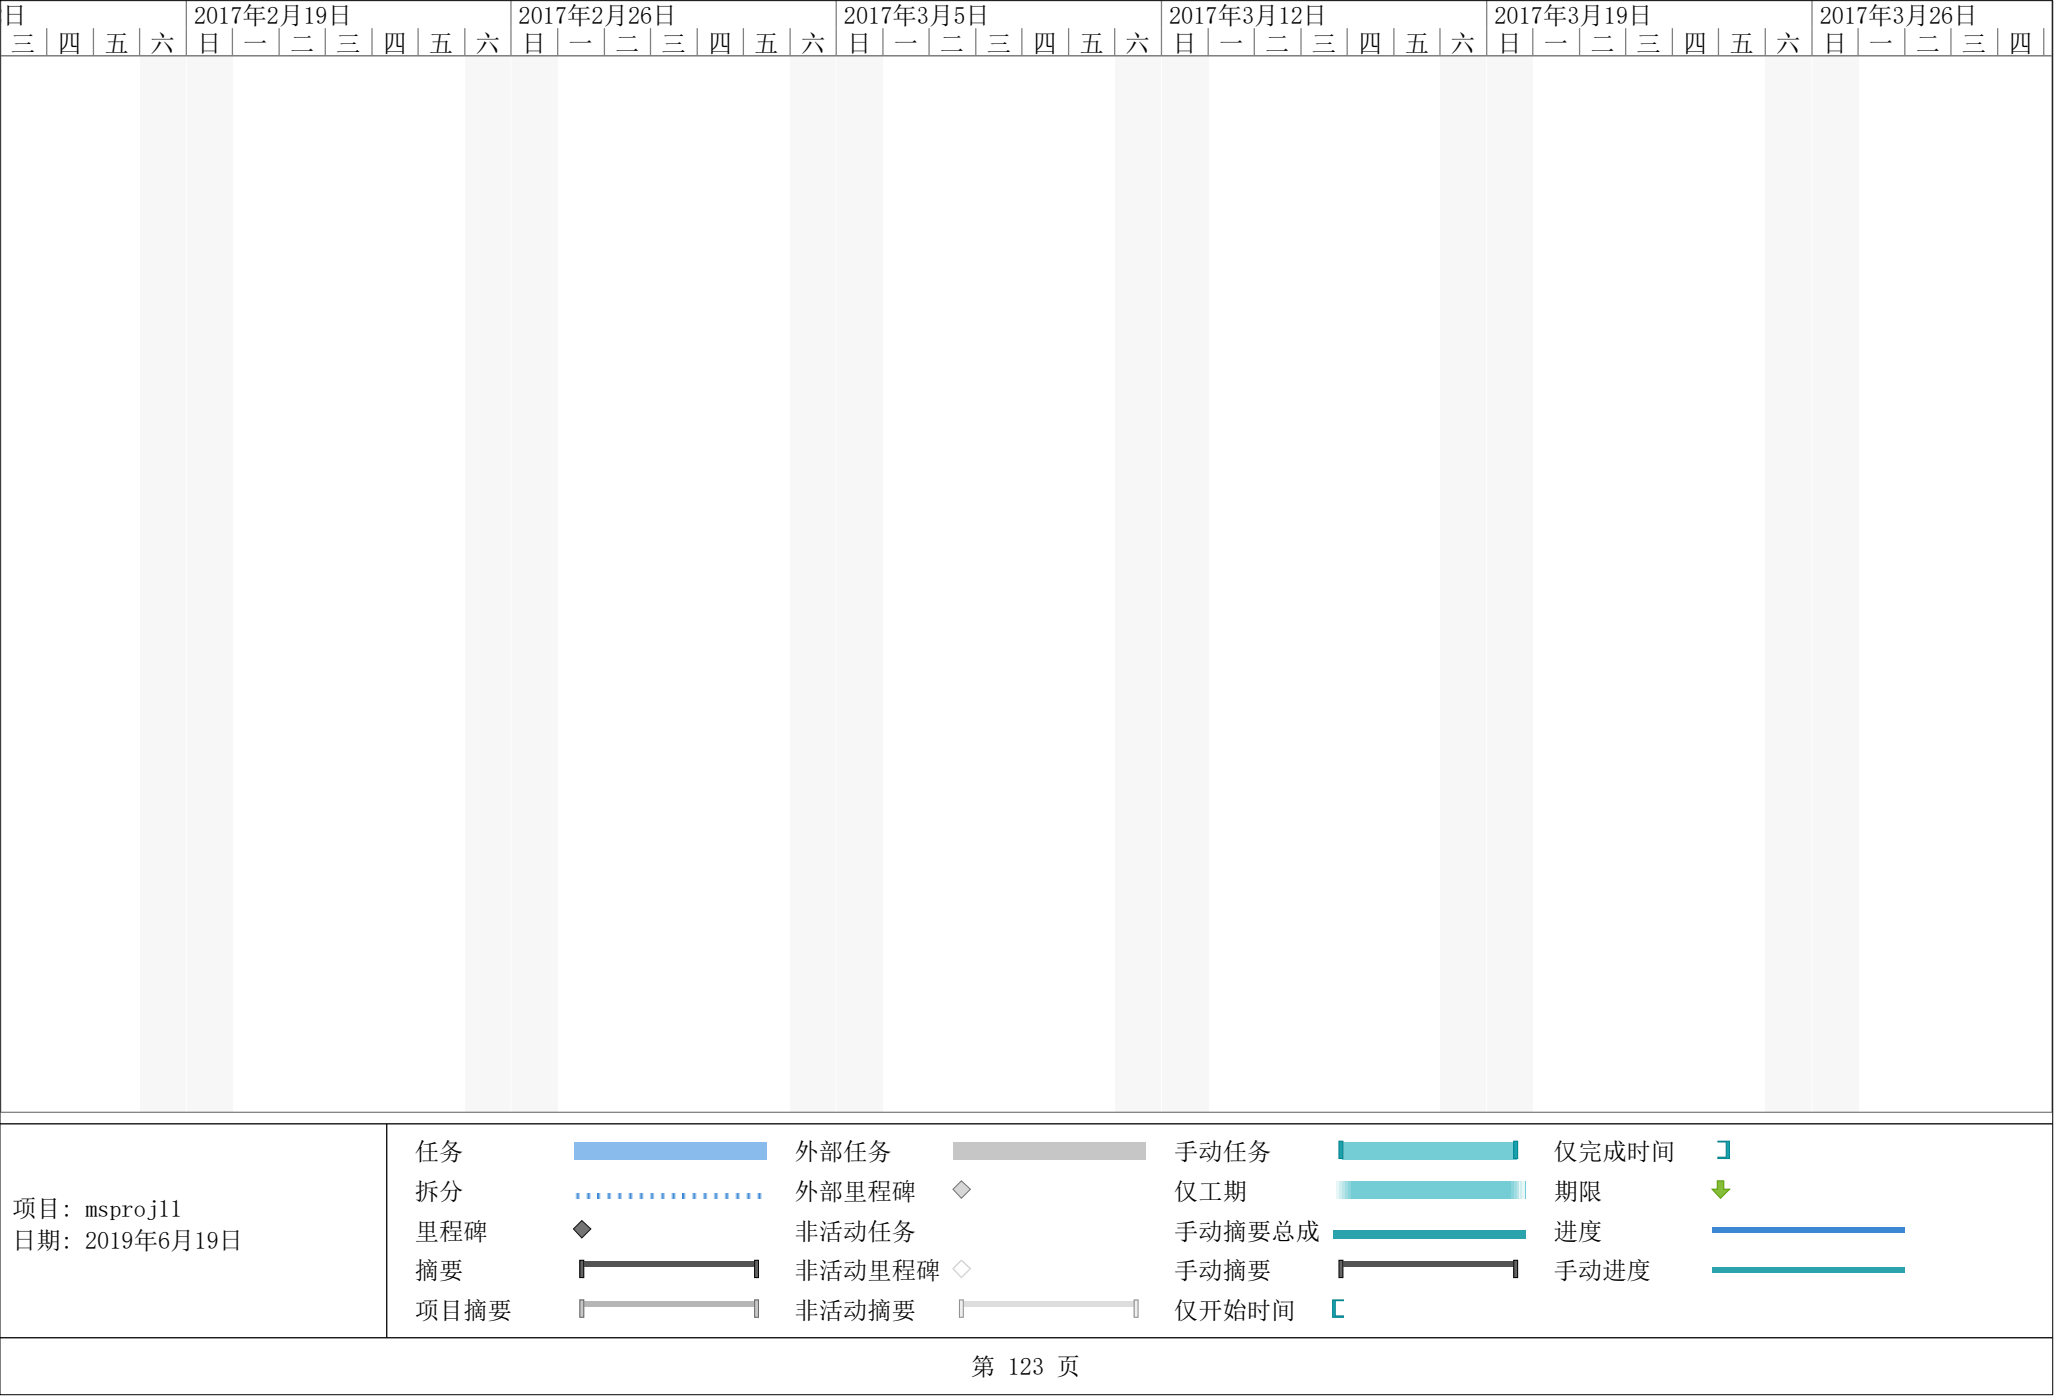



项目：msproj11  
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要


仅开始时间

仅完成时间

期限

进度

手动进度

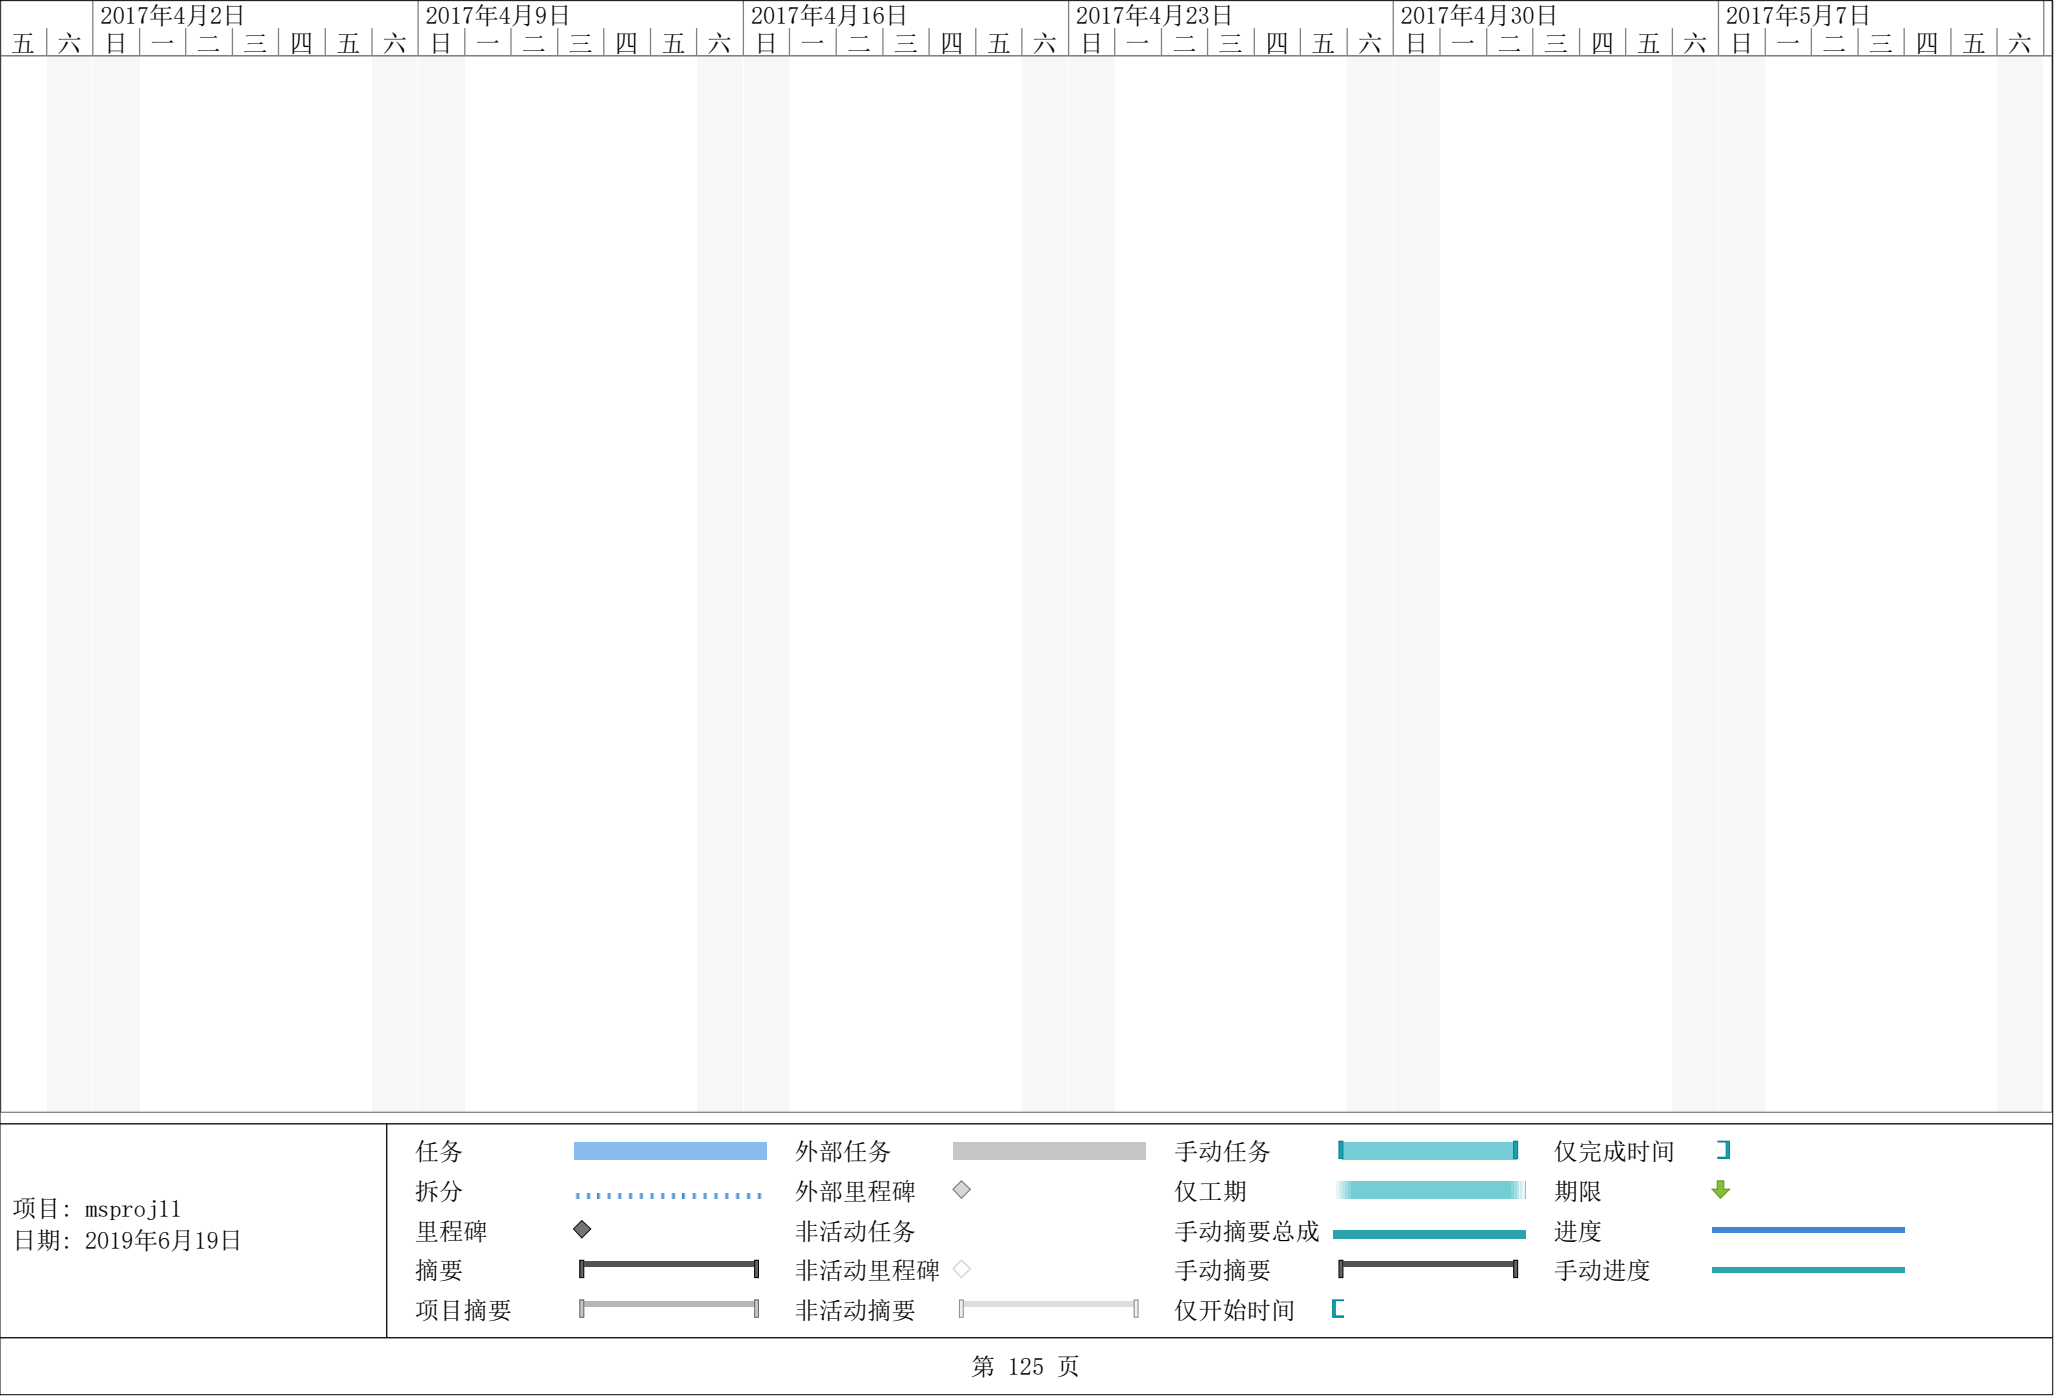

[illegible]















项目：msproj11  
日期：2019年6月19日

任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			




项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			



项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			






















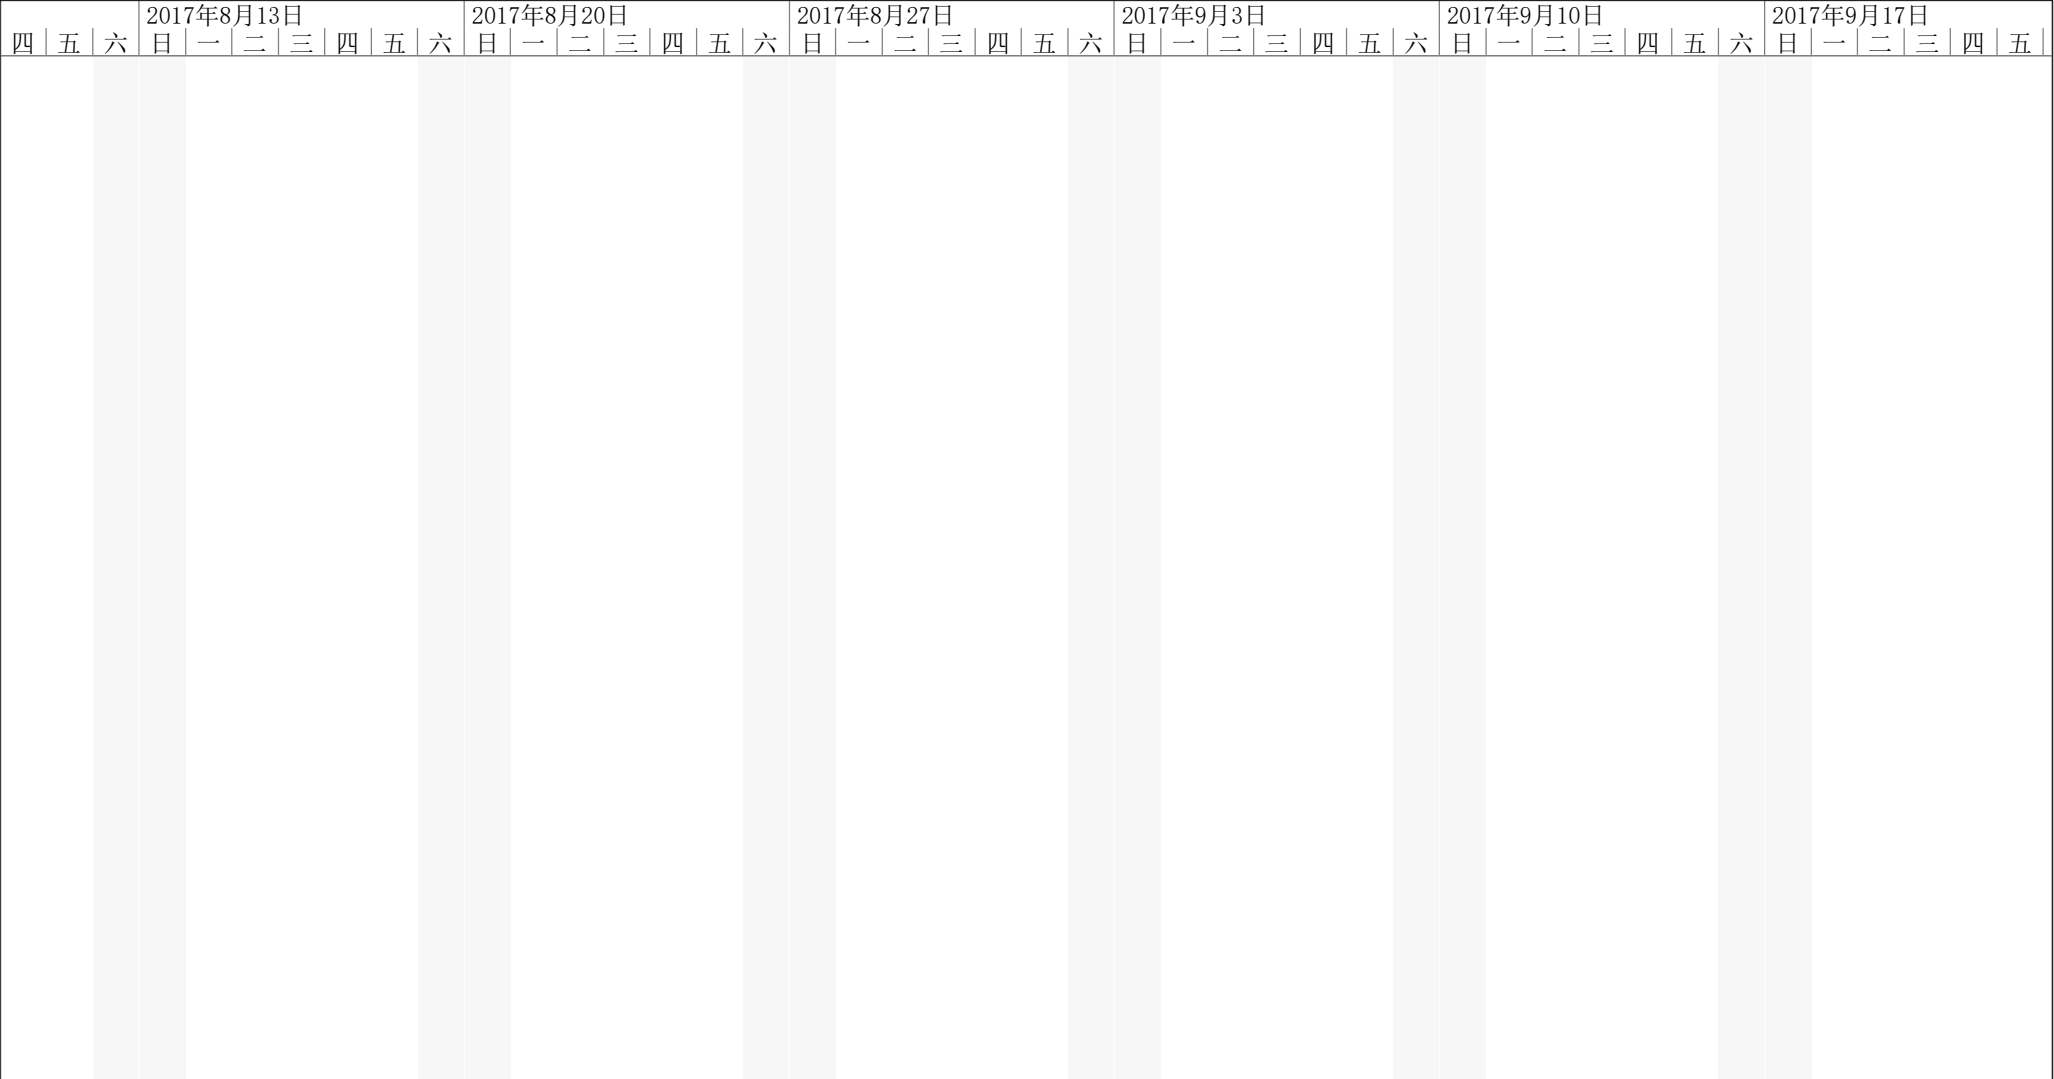




项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			

[illegible]

项目: msproj11 日期: 2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			



项目：msproj11  
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

◆

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

◇

◇

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间


仅完成时间







期限

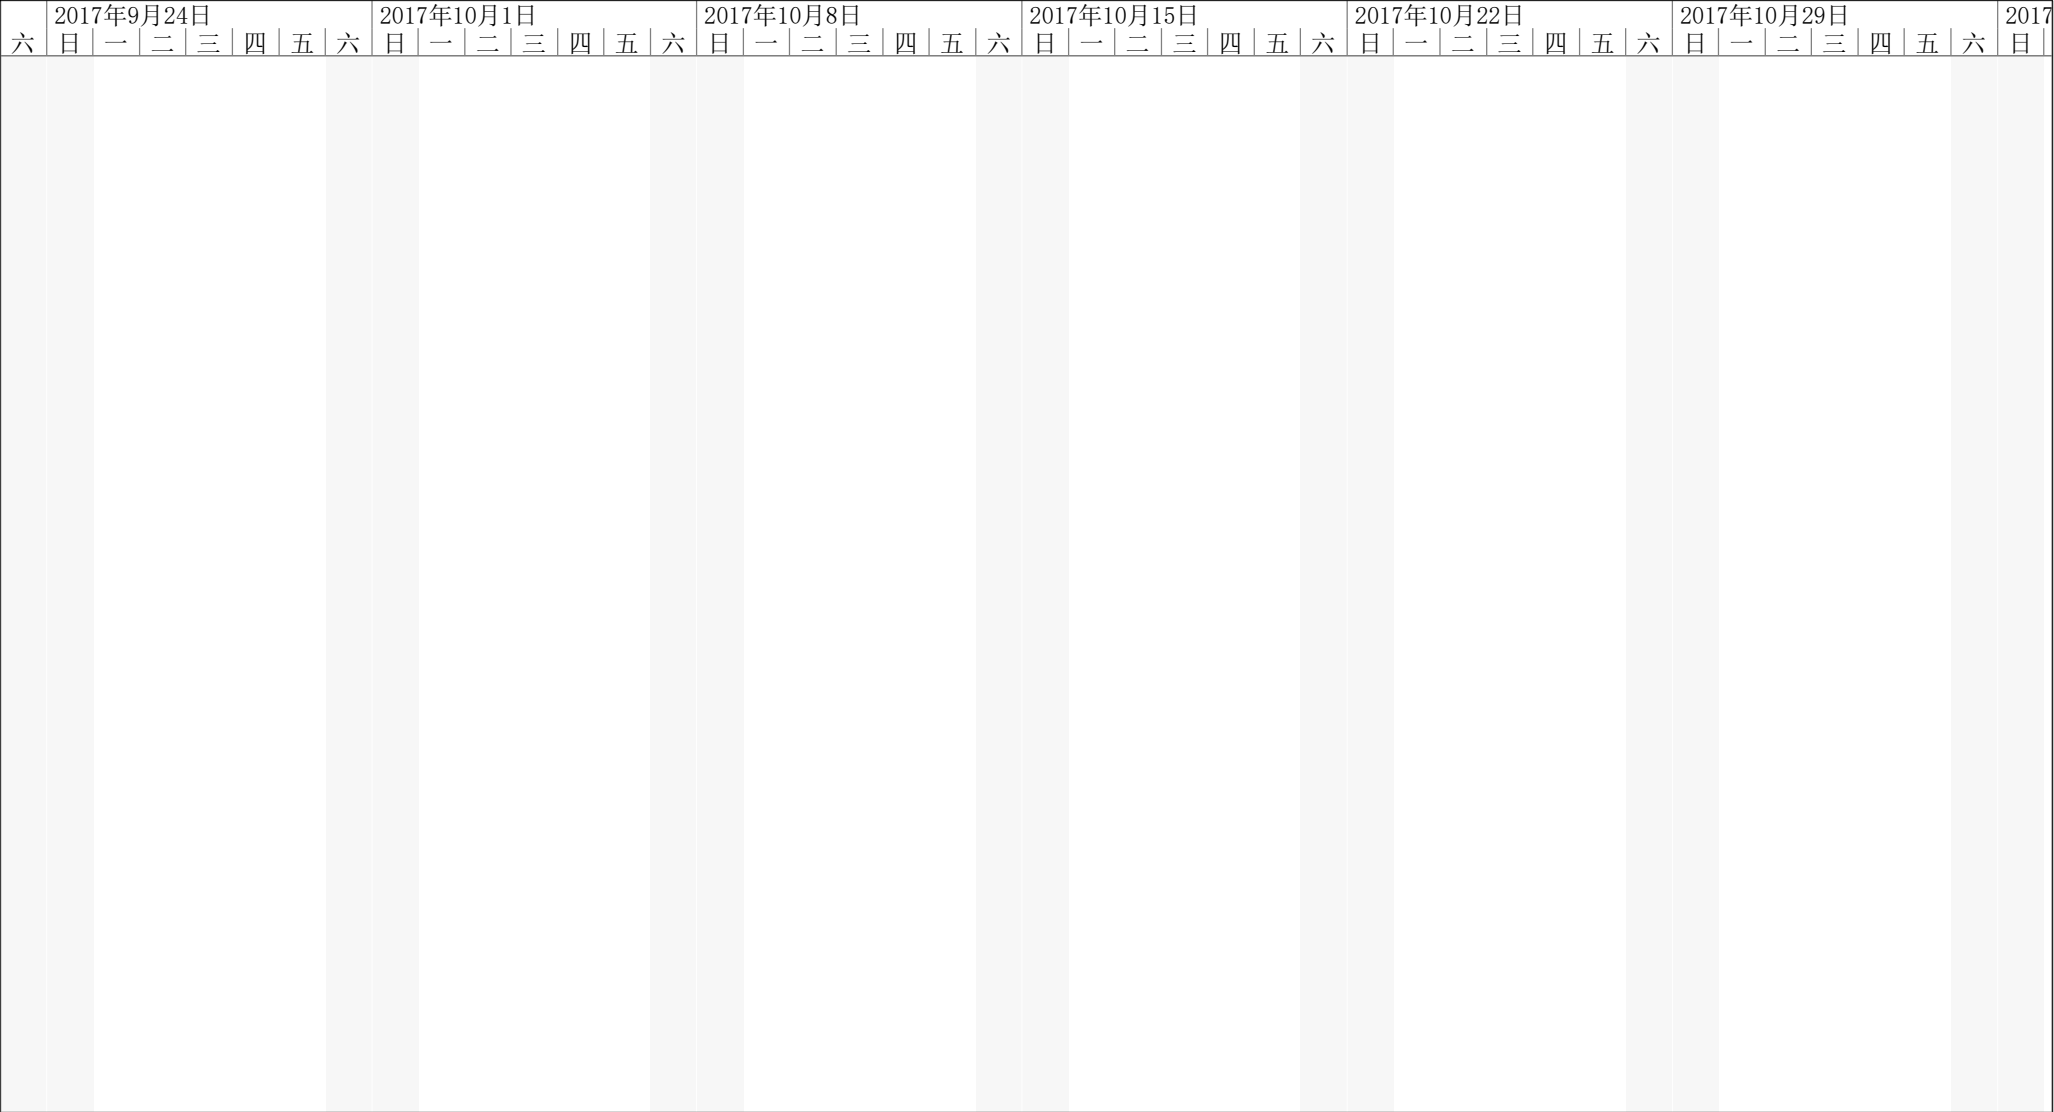
进度









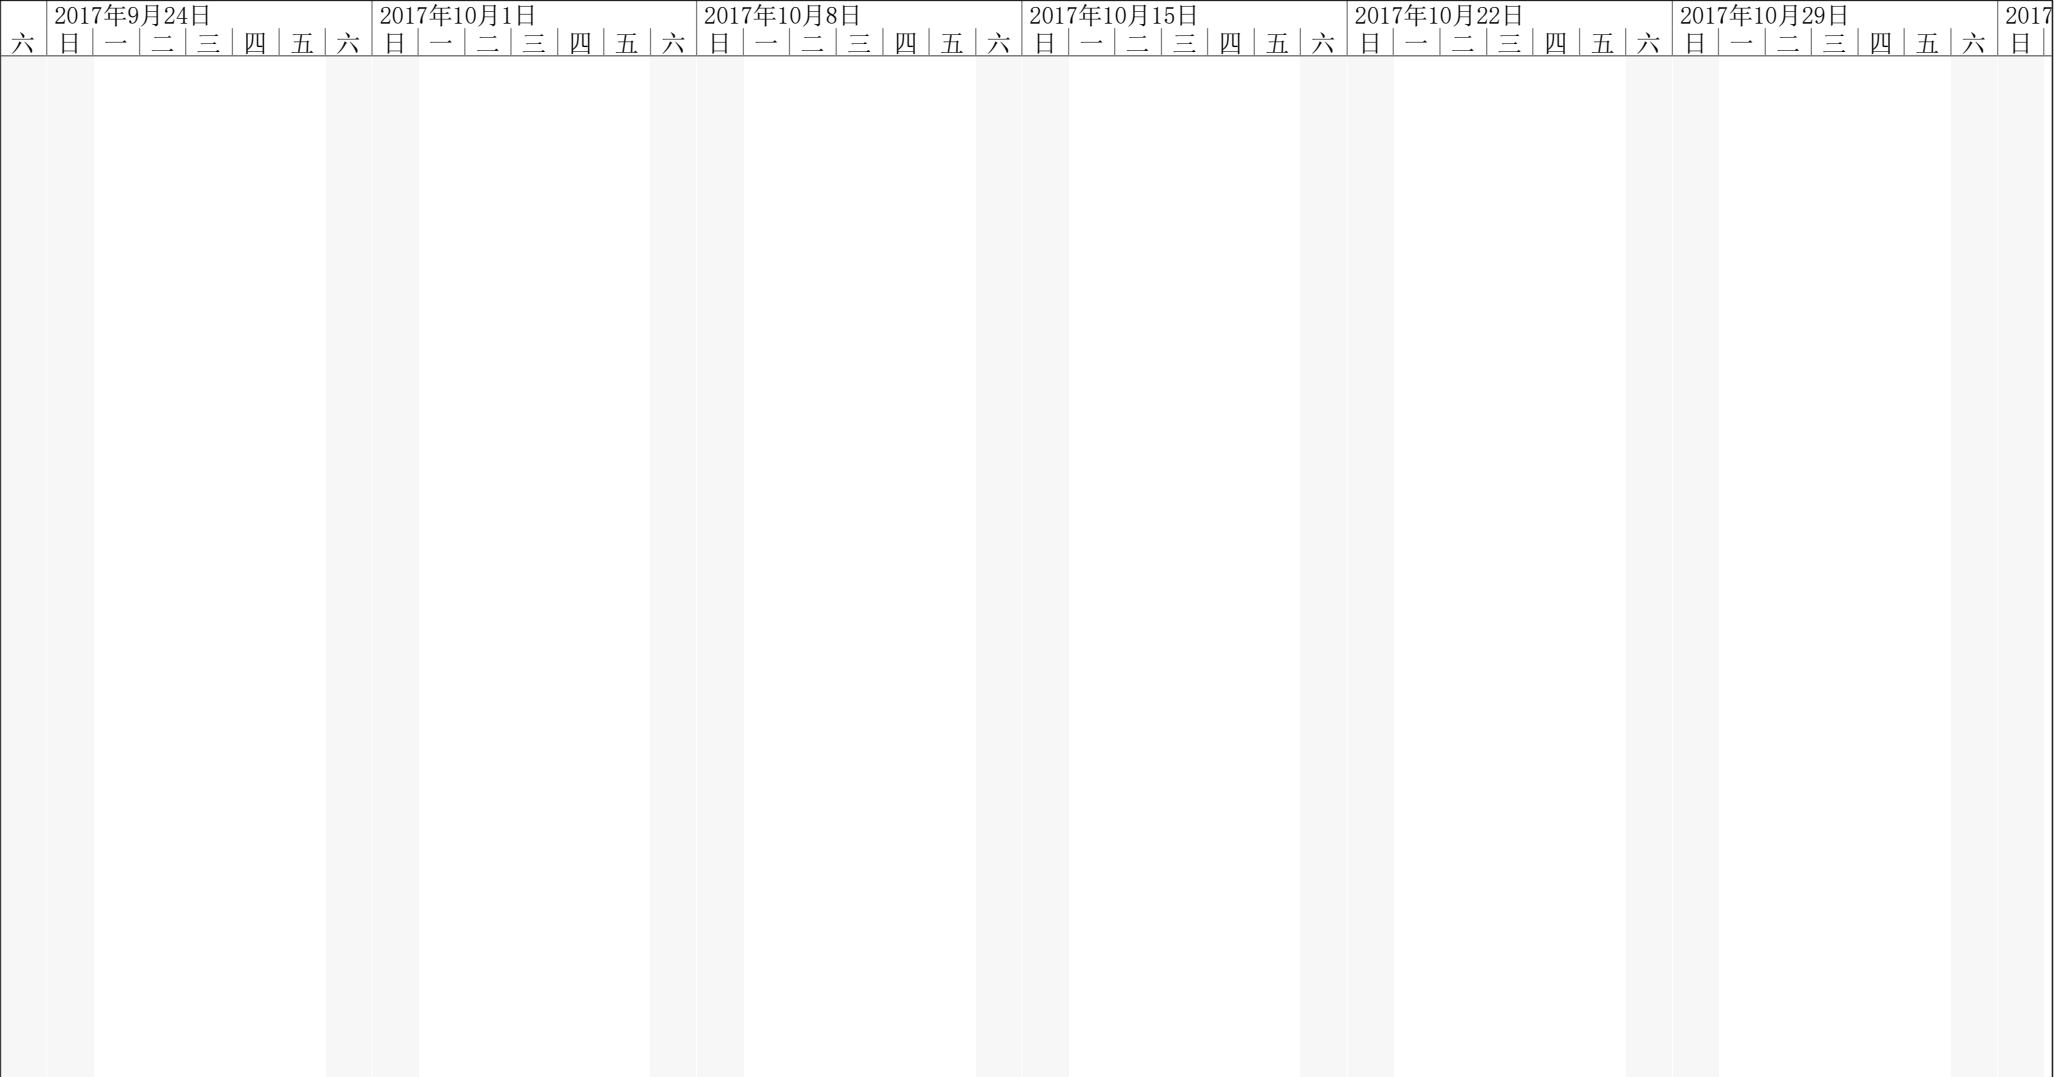









手动进度

↓



项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			



项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			



项目：msproj11  
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

◆

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

◆

◇

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

期限



















进度

手动进度


┌

↓

[illegible]

项目: msproj11 日期: 2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			







项目：msproj11  
日期：2019年6月19日


任务


拆分


里程碑


摘要


项目摘要












外部任务


外部里程碑


非活动任务


非活动里程碑

非活动摘要










手动任务


仅工期


手动摘要总成


手动摘要


仅开始时间













仅完成时间


期限


进度

手动进度









[illegible]

五		六		2018年2月4日						2018年2月11日						2018年2月18日						2018年2月25日						2018年3月4日						2018年3月11日					
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六					

项目：msproj11  
日期：2019年6月19日

任务	外部任务	手动任务	仅完成时间
拆分	外部里程碑	仅工期	期限
里程碑	非活动任务	手动摘要总成	进度
摘要	非活动里程碑	手动摘要	手动进度
项目摘要	非活动摘要	仅开始时间	



项目：msproj11  
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间



















仅完成时间

期限

进度

手动进度

[illegible]

项目: msproj11 日期: 2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			





项目：msproj11  
日期：2019年6月19日


任务


拆分


里程碑


摘要


项目摘要












外部任务


外部里程碑


非活动任务


非活动里程碑


非活动摘要












手动任务


仅工期


手动摘要总成


手动摘要


仅开始时间













仅完成时间


期限


进度

手动进度













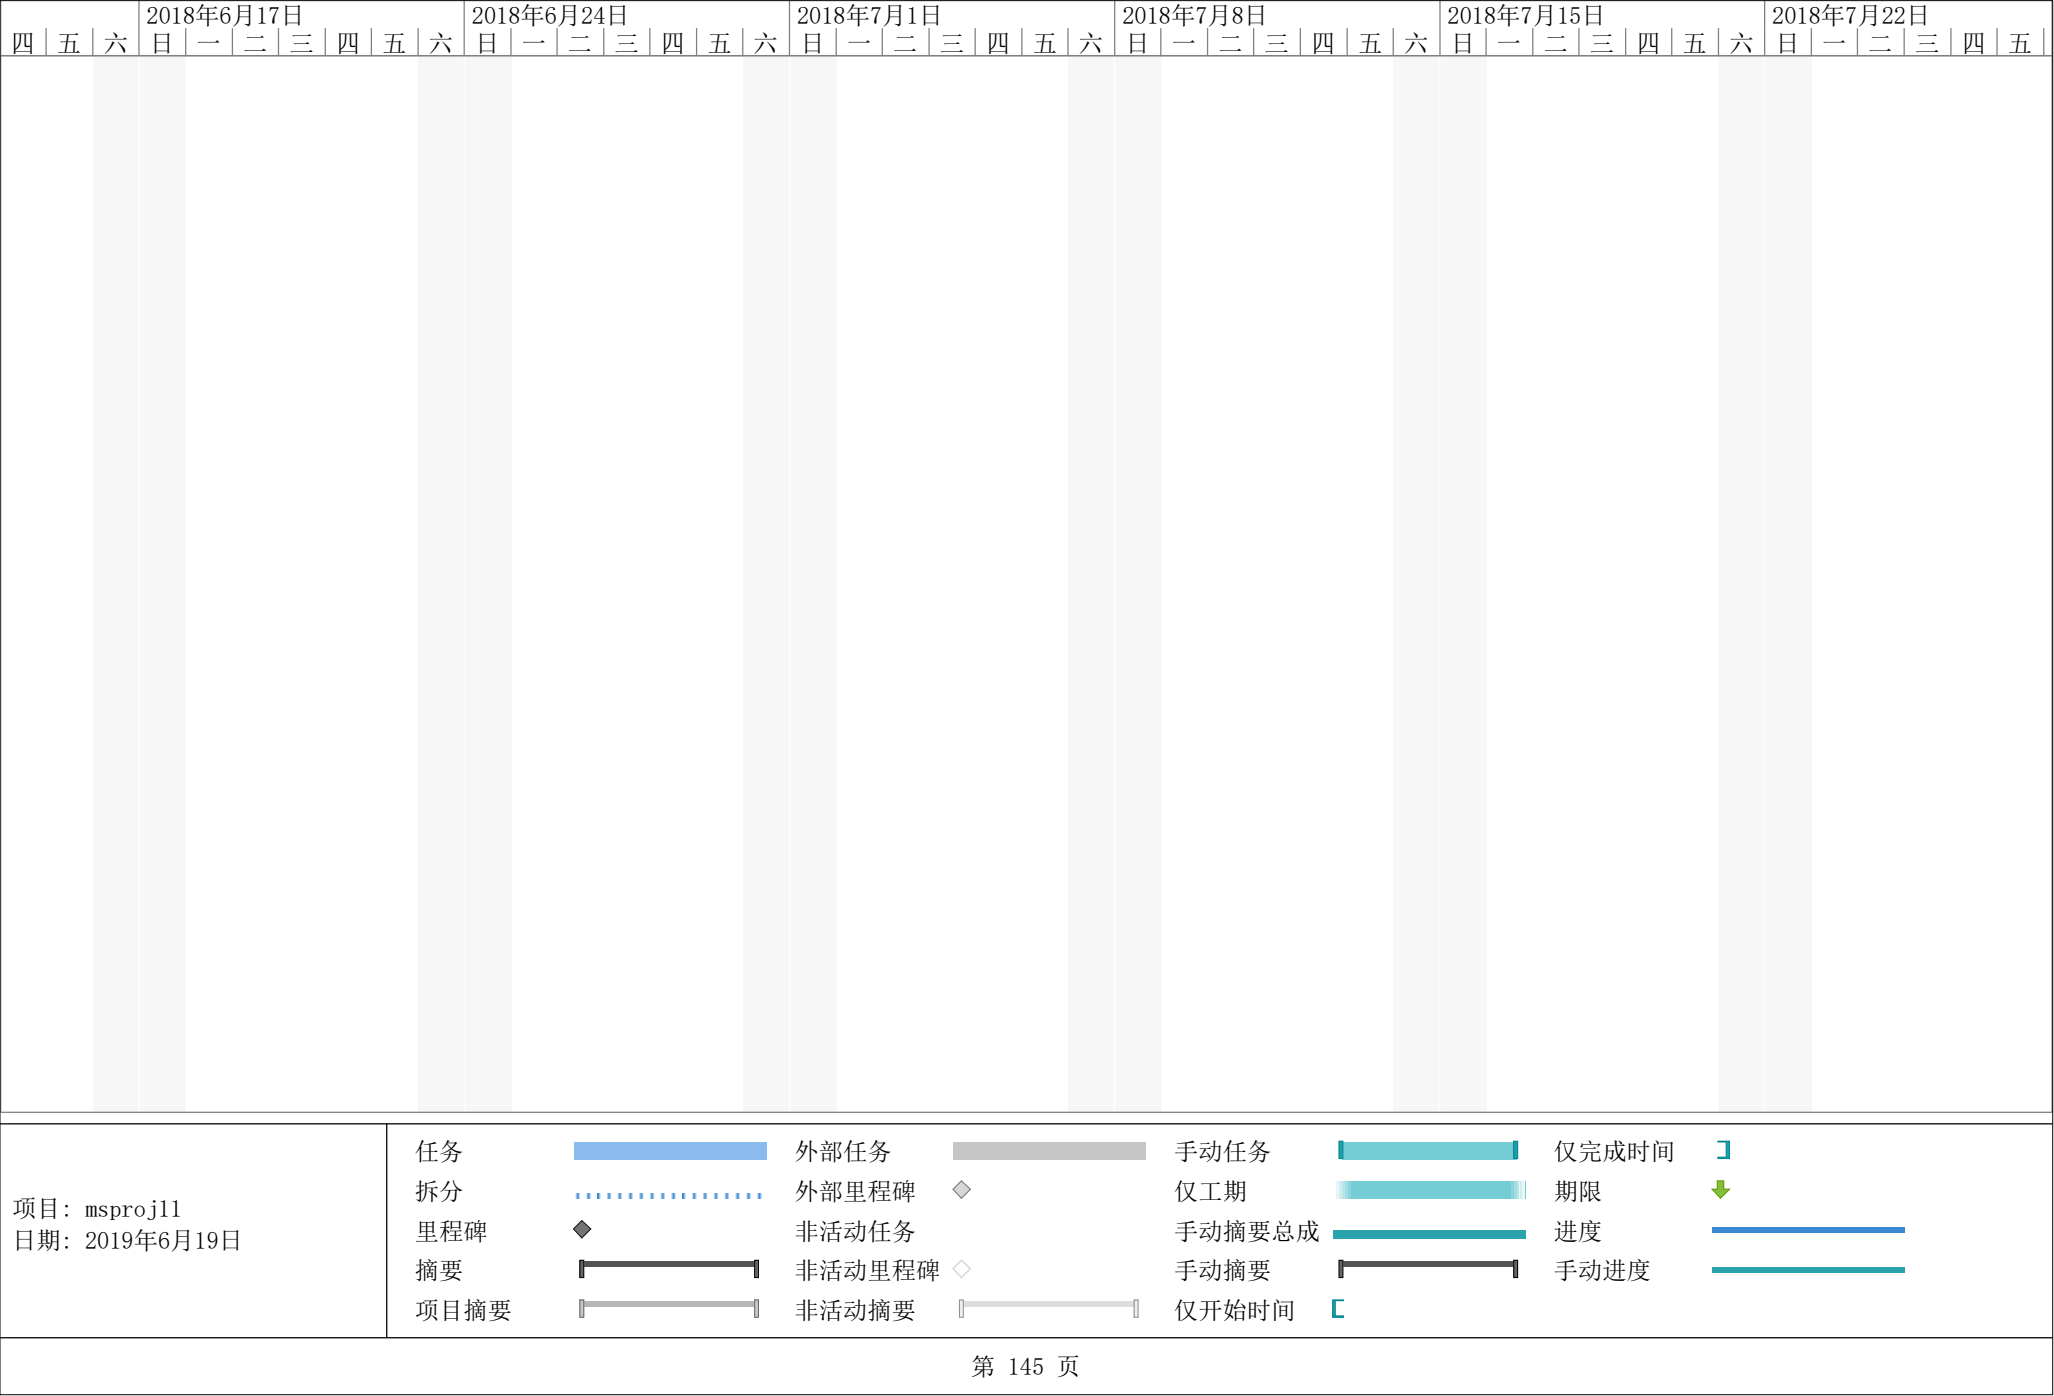

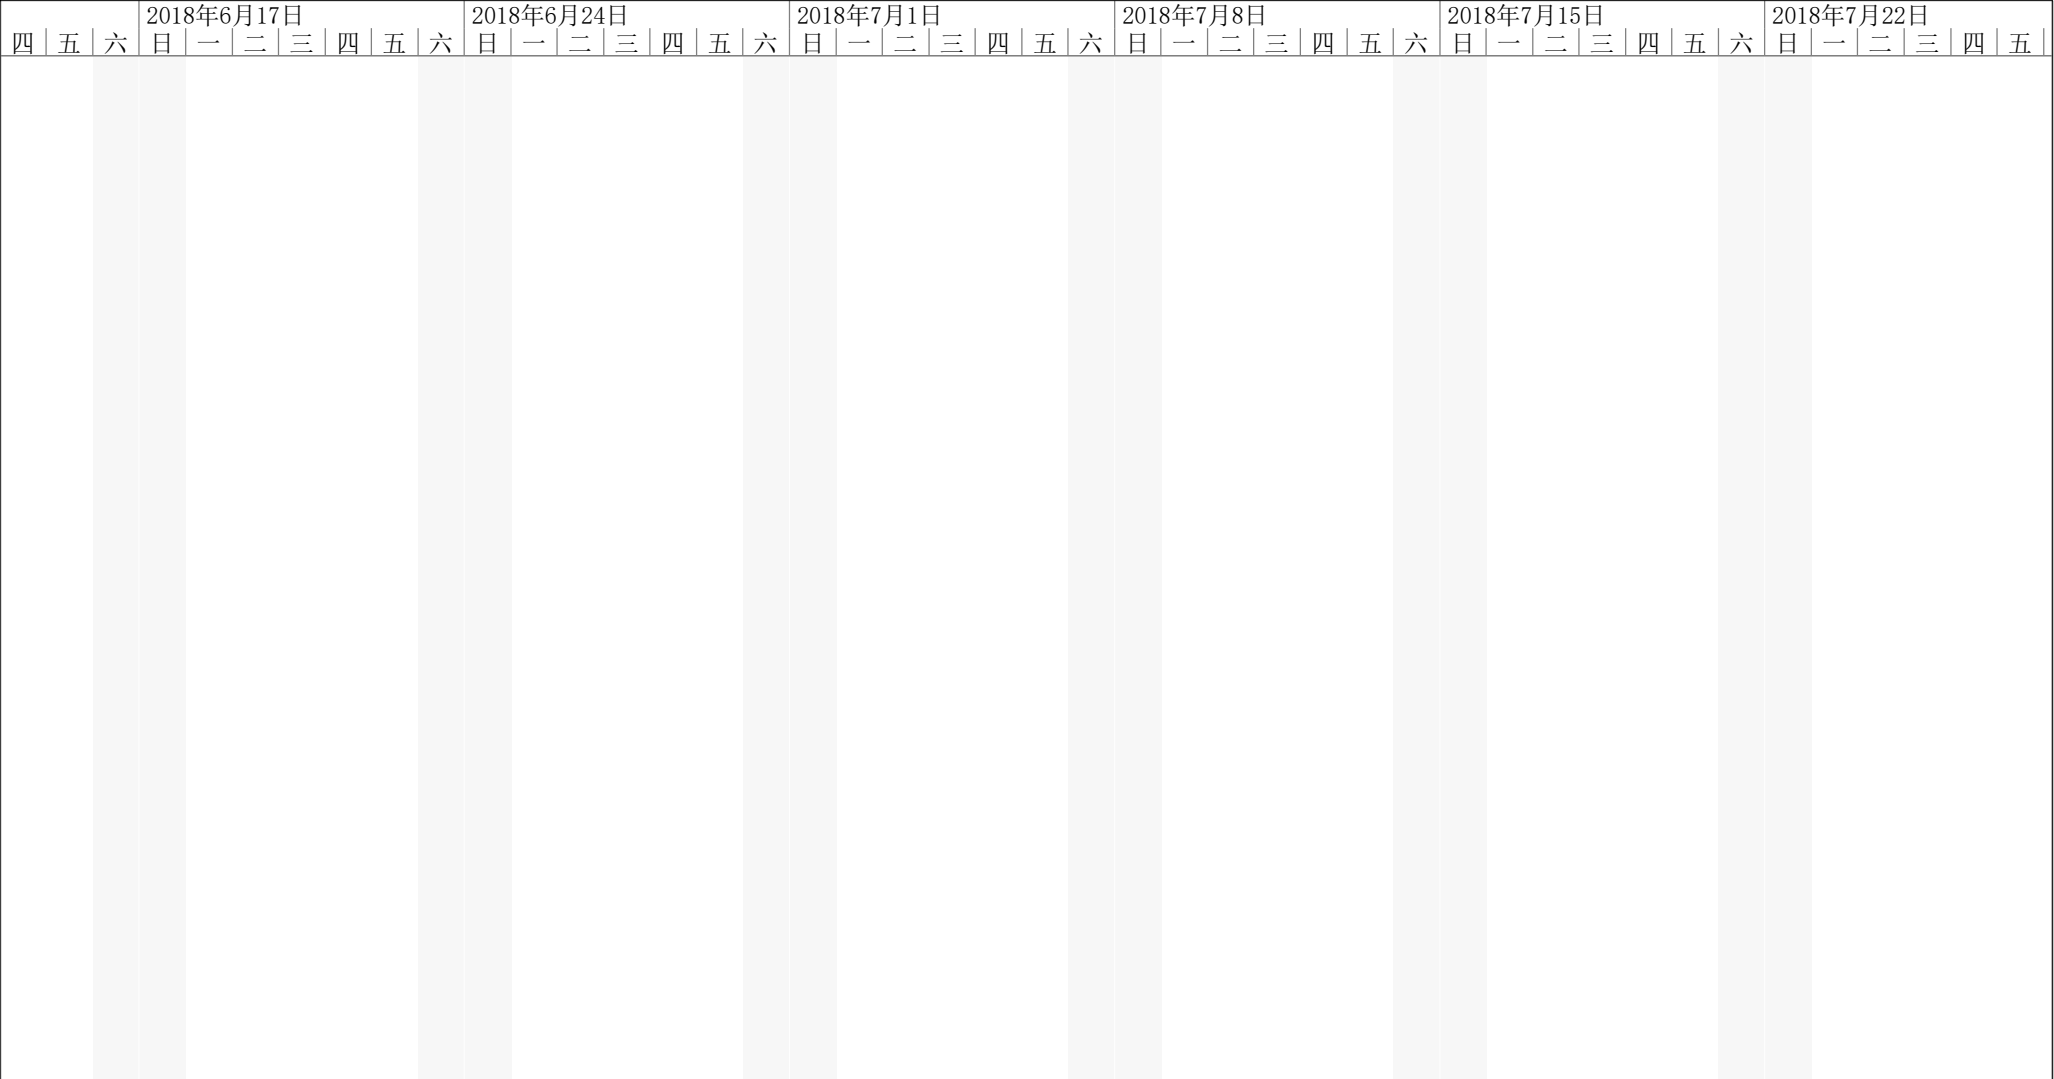

项目：msproj11  
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要


仅开始时间







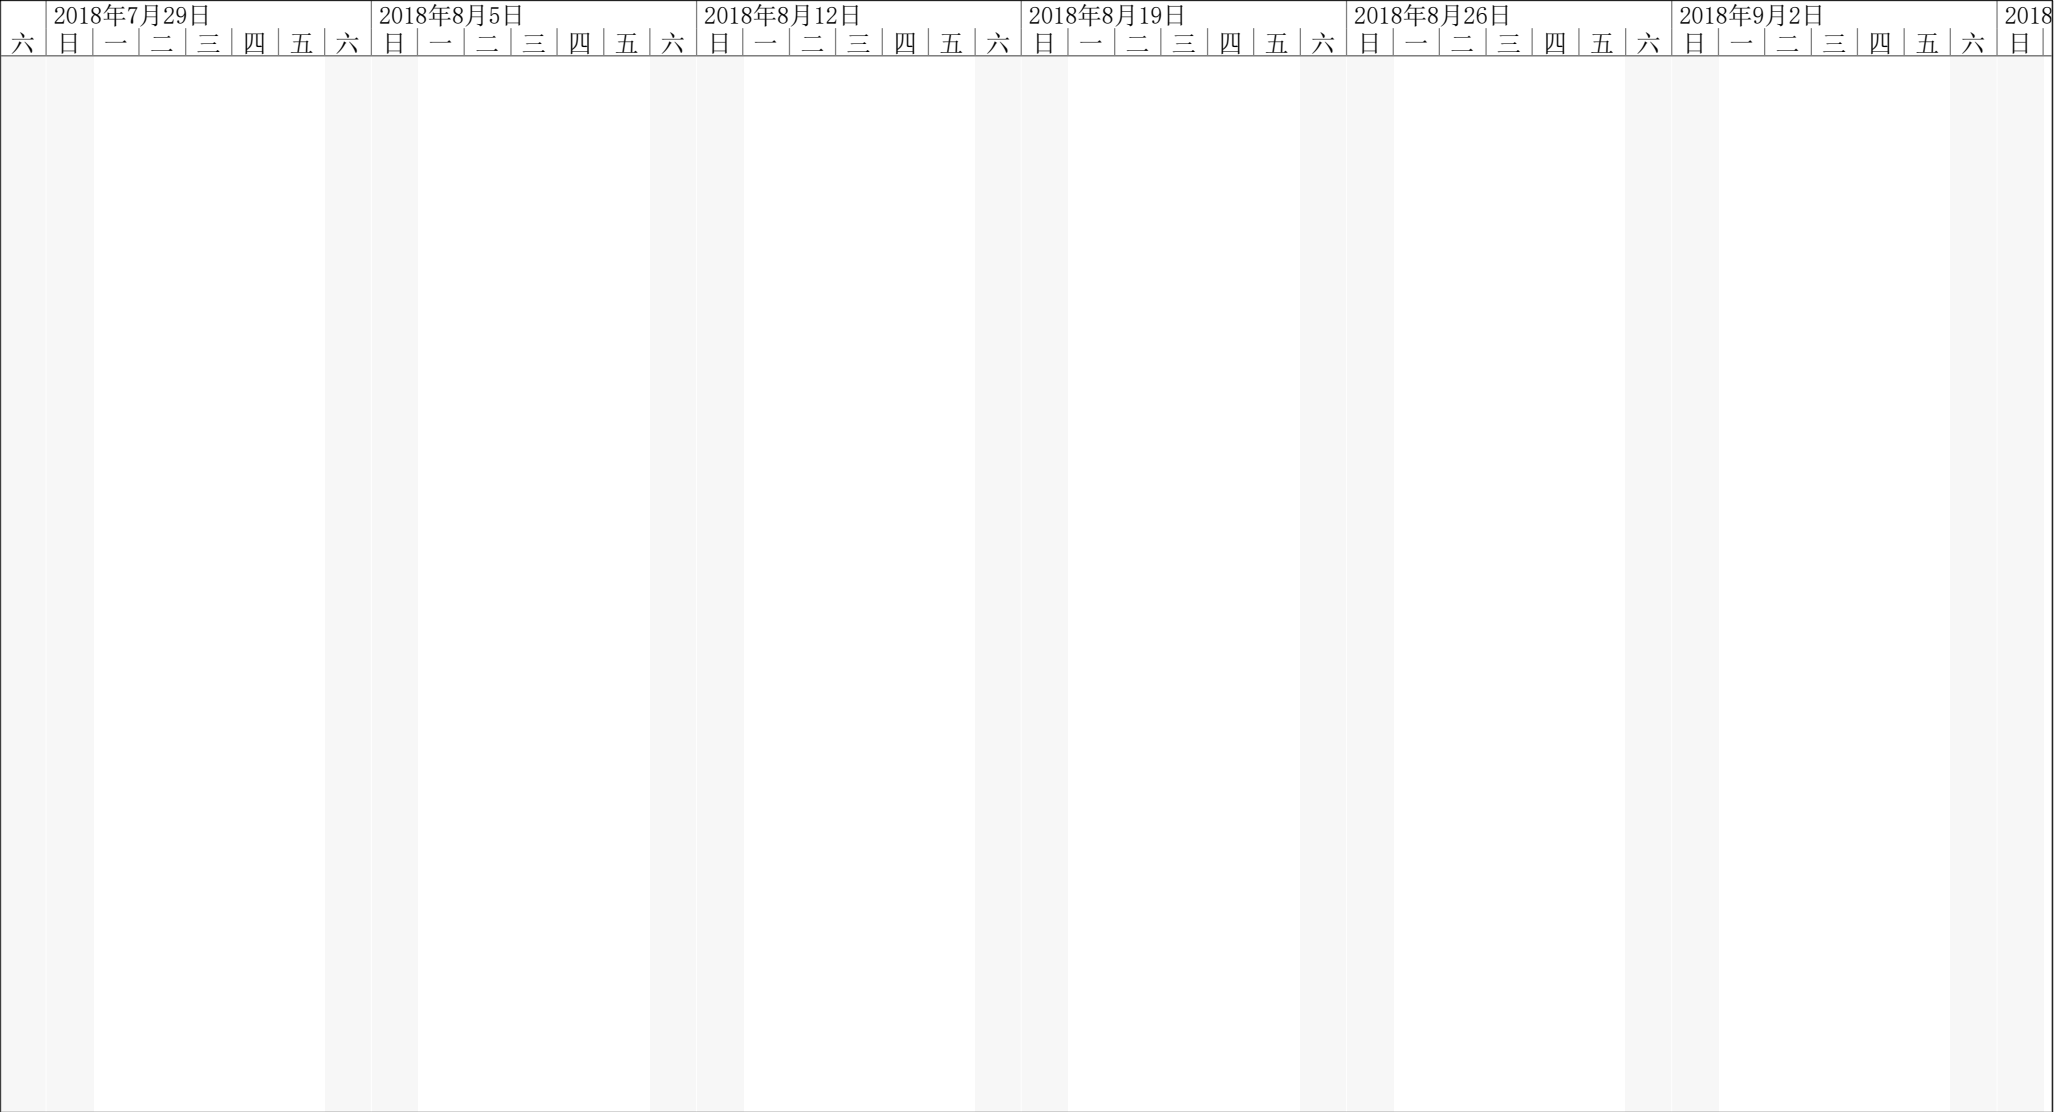


仅完成时间


期限

进度

手动进度



项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			

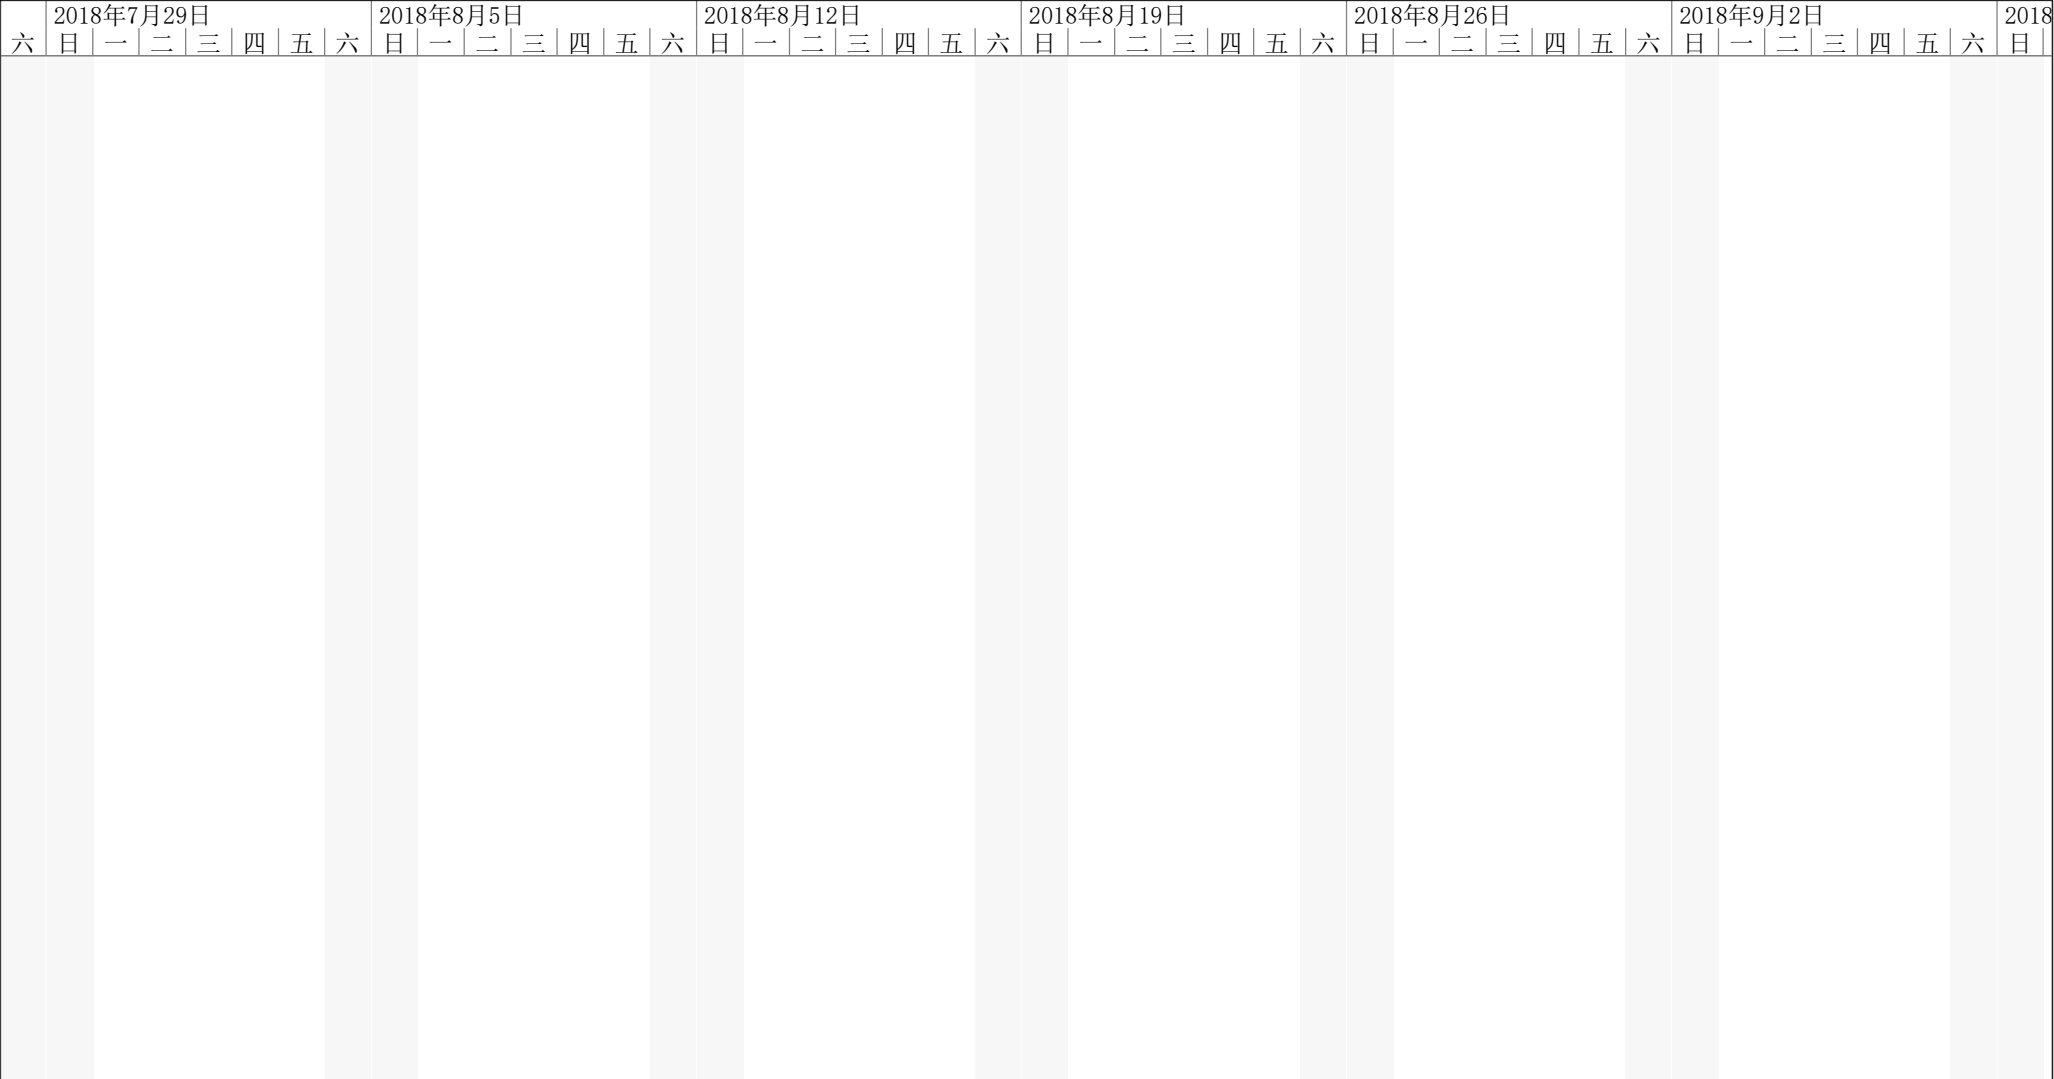

项目：msproj11  
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

◆

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

◆

◇

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

期限

进度

手动进度

┌

↓



项目：msproj11  
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要











外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要









手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间











仅完成时间


期限

进度

手动进度































项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			



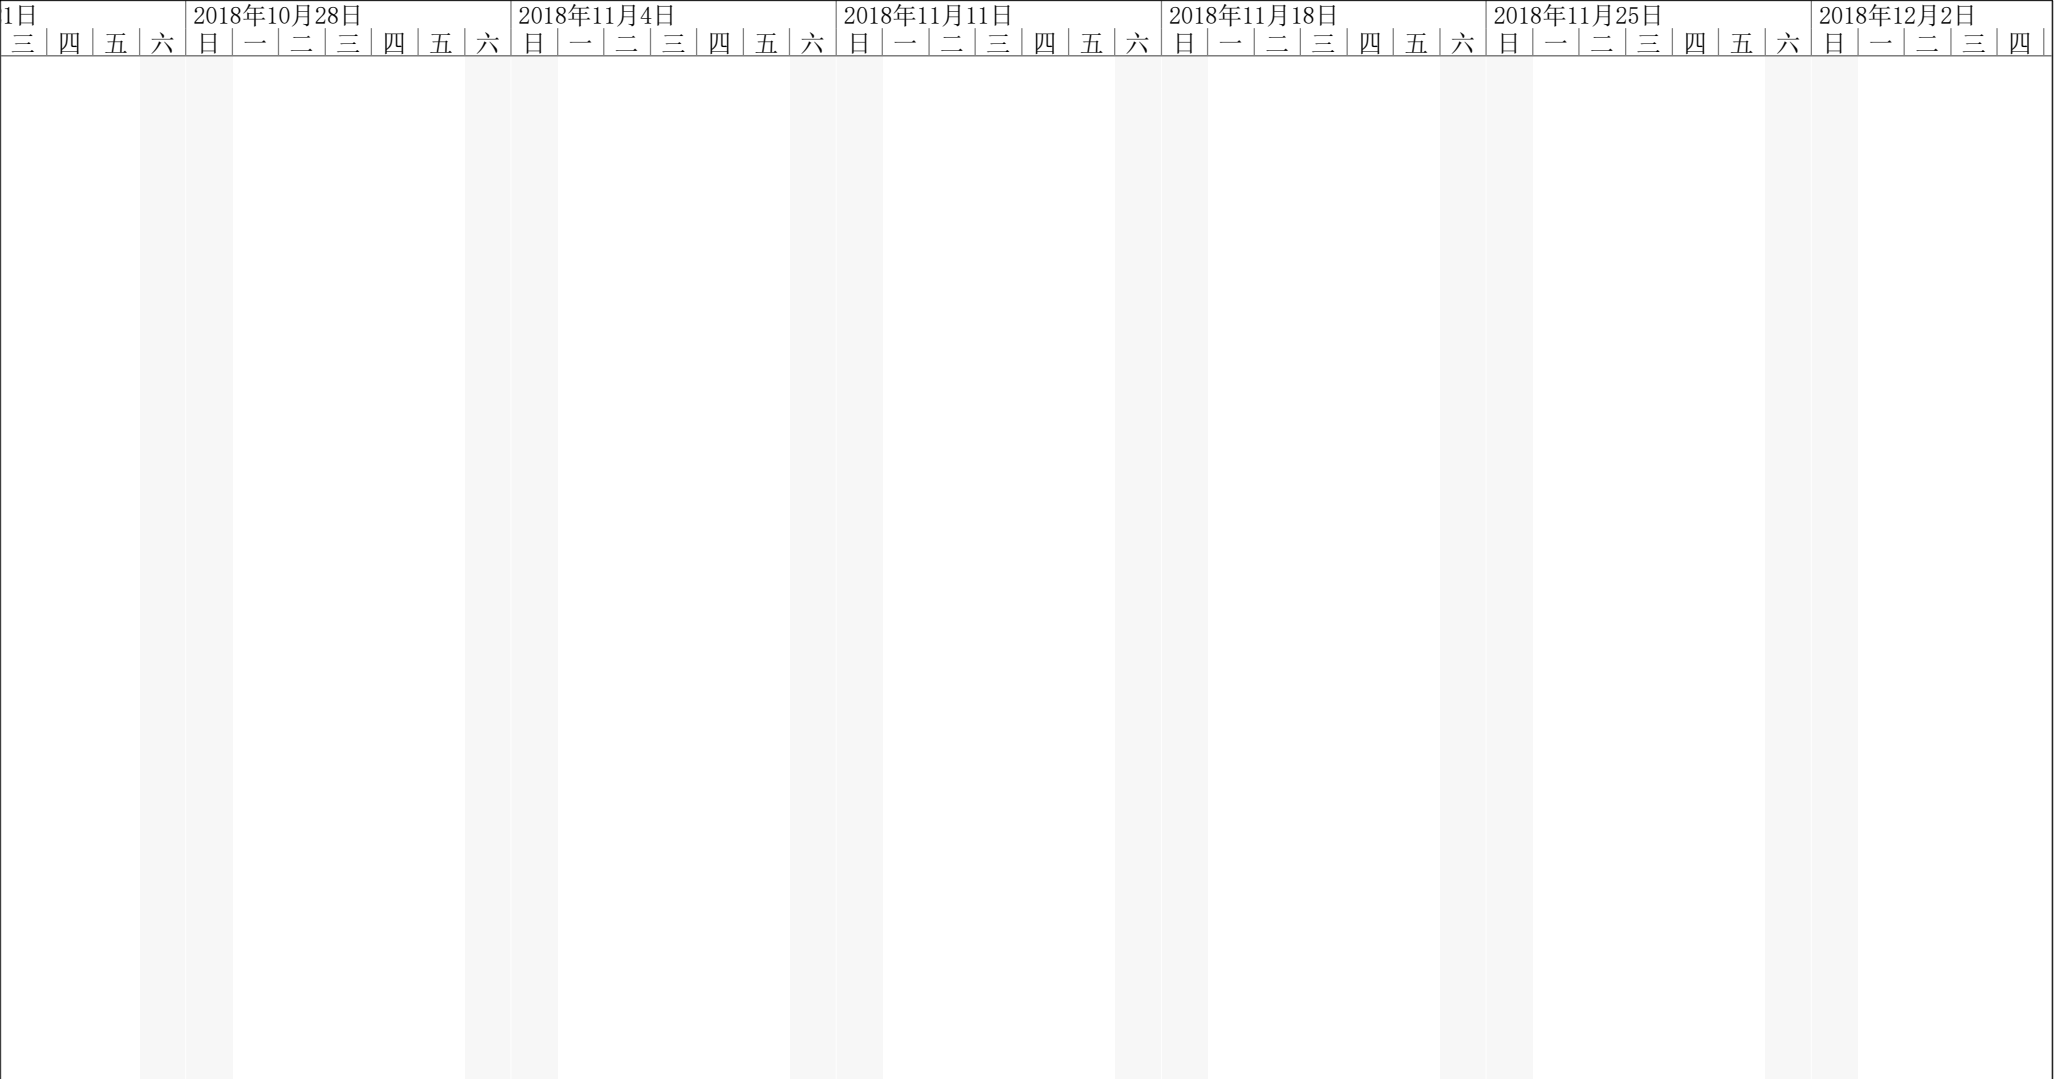

项目：msproj11  
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

◆

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

◇

◇

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间


期限

进度

手动进度

↓














五		六		2018年12月9日						2018年12月16日						2018年12月23日						2018年12月30日						2019年1月6日						2019年1月13日					
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六					



















项目: msproj11  
日期: 2019年6月19日


任务	外部任务	手动任务	仅完成时间
拆分	外部里程碑	仅工期	期限
里程碑	非活动任务	手动摘要总成	进度
摘要	非活动里程碑	手动摘要	手动进度
项目摘要	非活动摘要	仅开始时间	



项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			



项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			

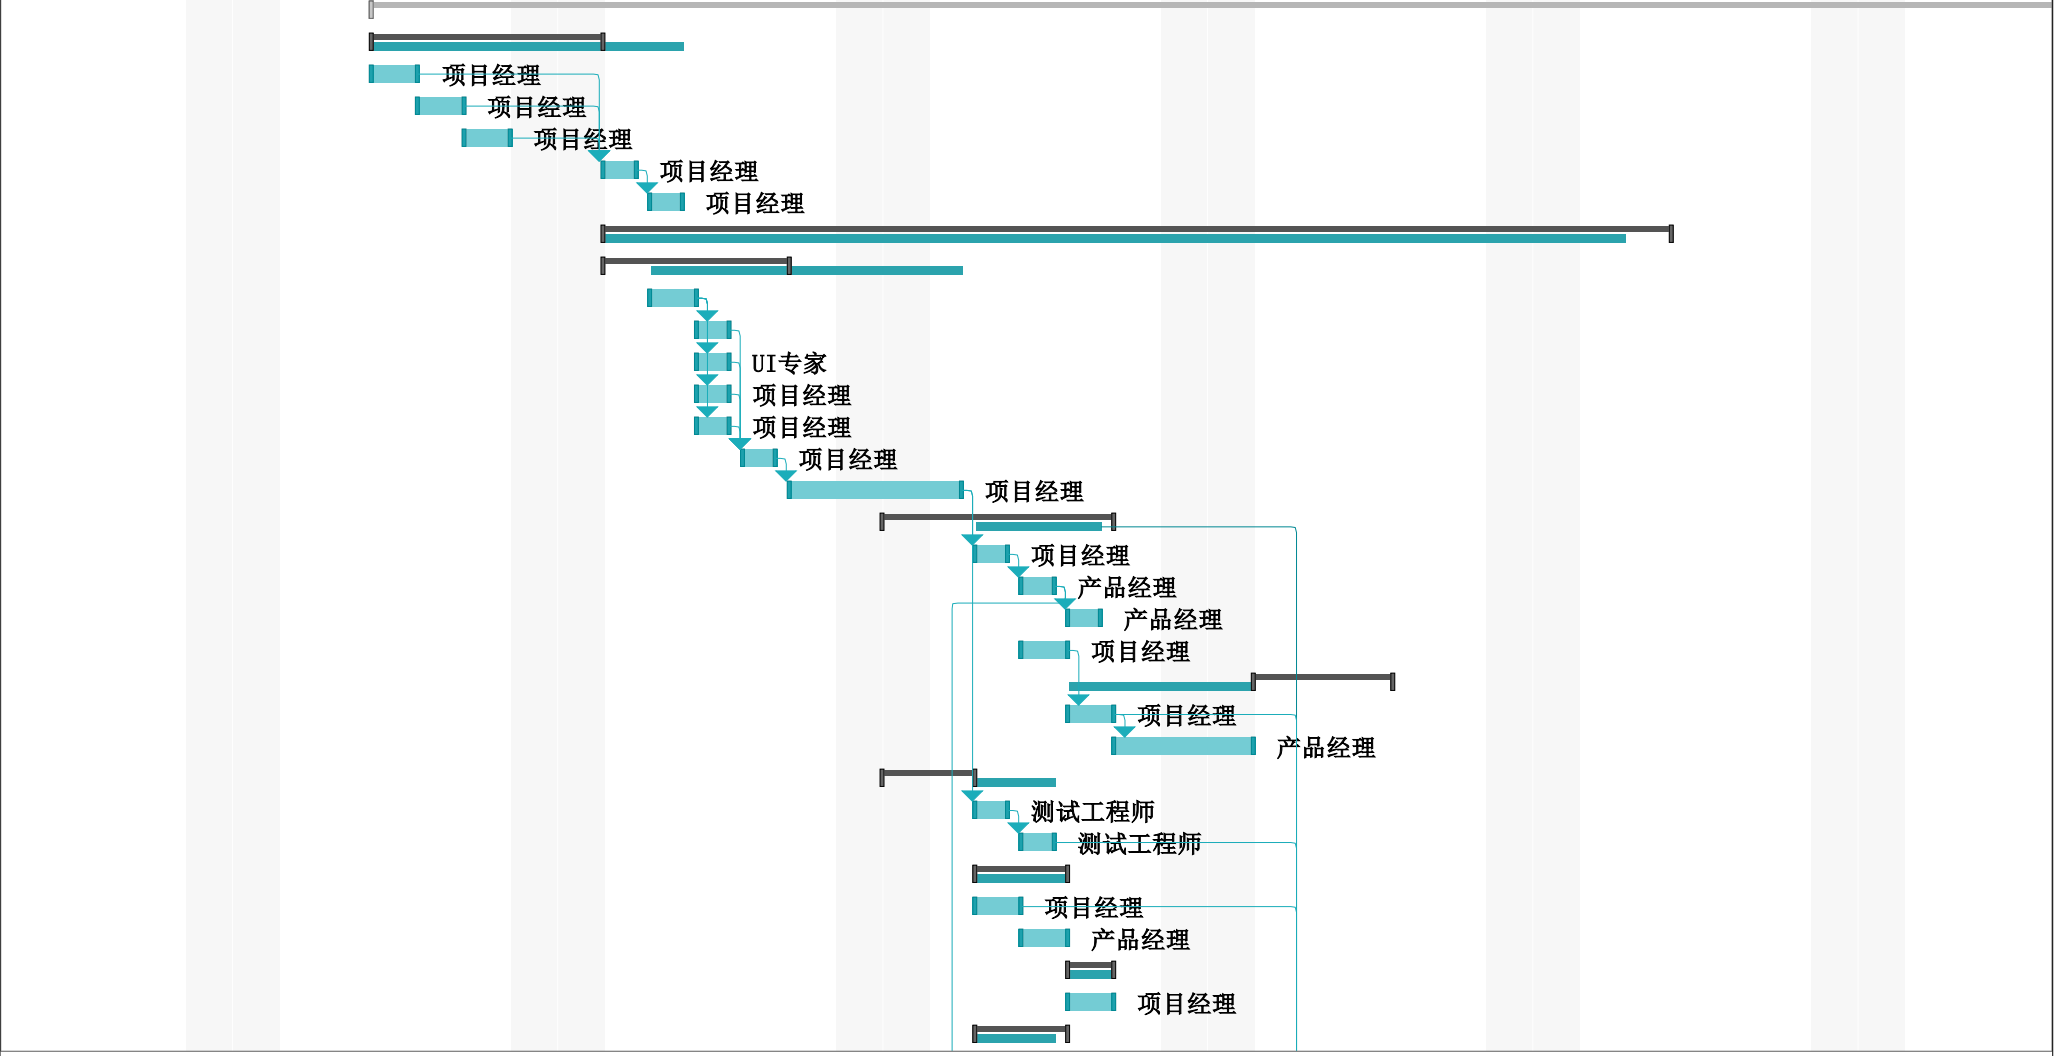

项目：msproj11

日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

期限

进度

手动进度


↓

↓

↓

↓

↓

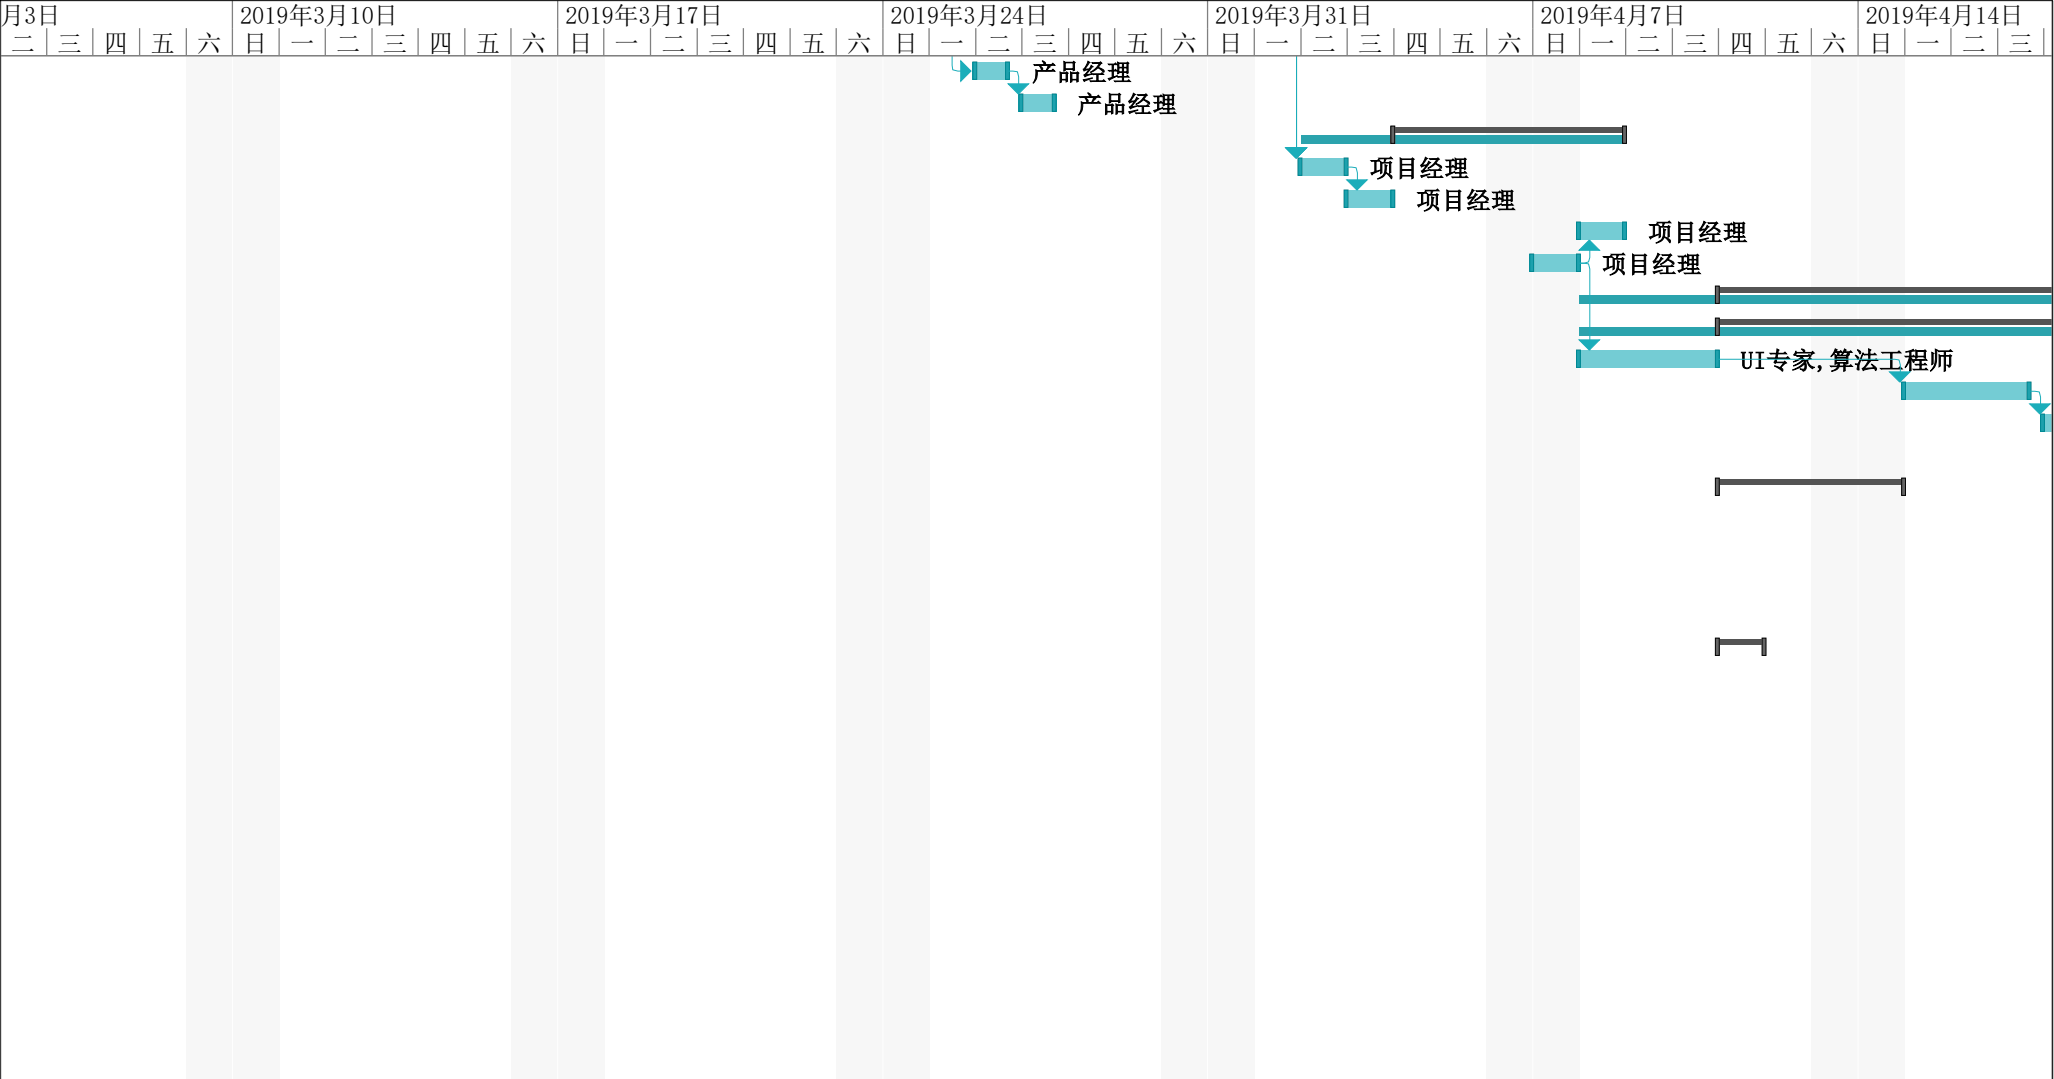

项目：msproj11  
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

◆

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

◆

◇

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间


仅完成时间

期限

进度

手动进度

↓

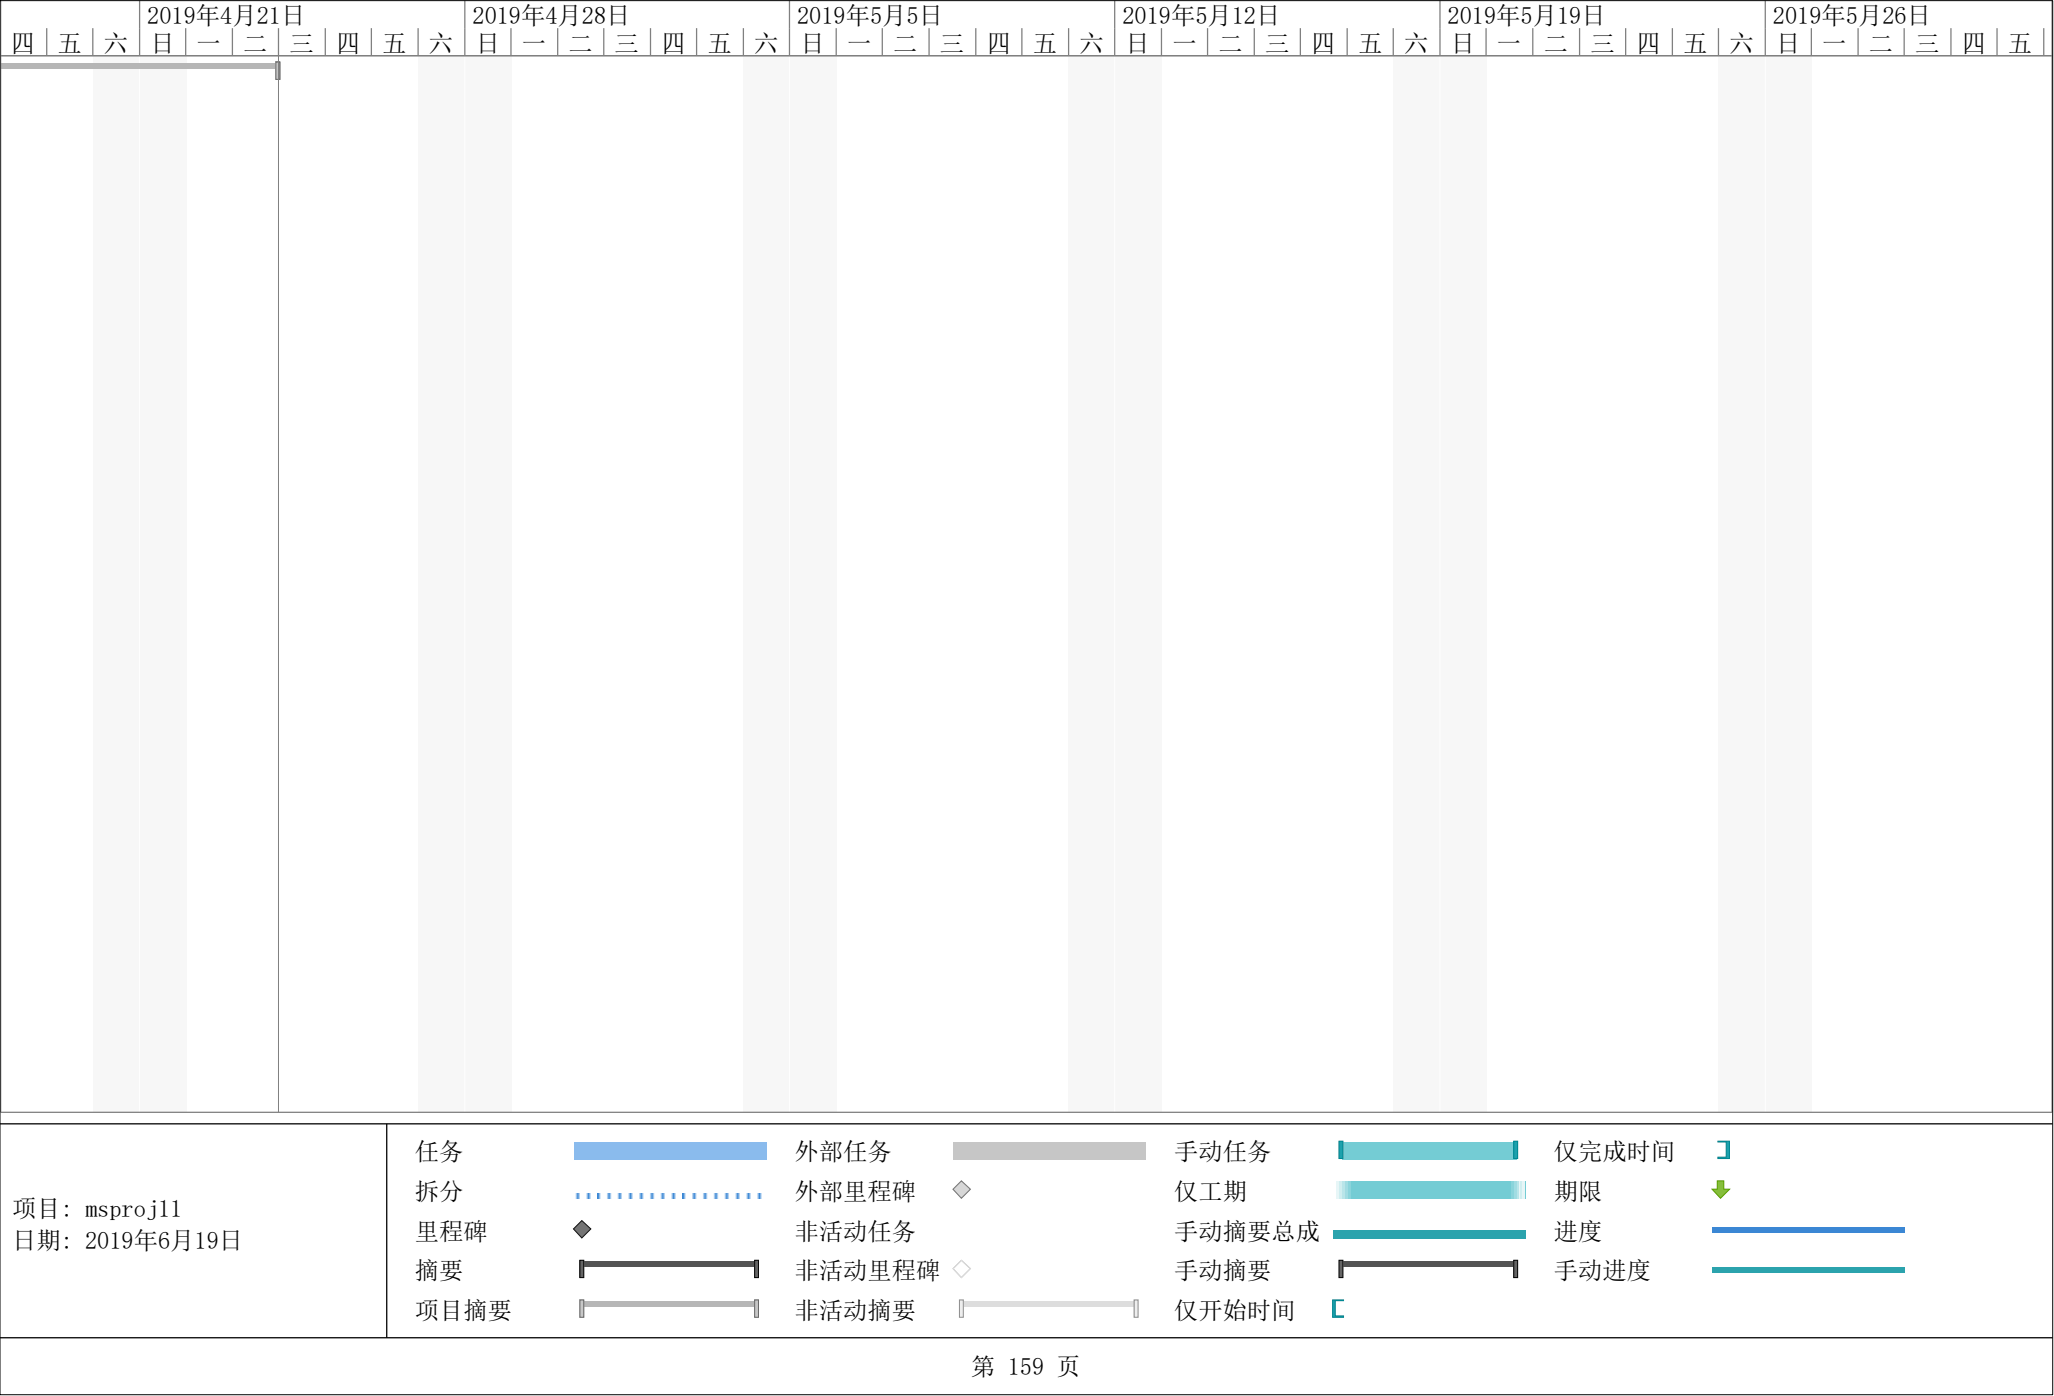



项目：msproj11  
日期：2019年6月19日

任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			
