

标识号	任务模 任务名称 式	工期	开始时间 完成时间 前置任务	资源名称	成本		三月二十三	日星期六 15 16	三月二 17
1	昌 启动	3 个工	[12019年: 2019年:	团队建设费[¥	500.00]	¥4, 100. 00			
2	组建核心团	1 个工	二(2019年)2019年)	UI专家,测试员		¥2,040.00			UI专刻
3	干系人分析		~ 2019年32019年3	项目经理		¥200.00			■ 项目经理
4	里程碑计划	0.5 个	~ 2019年32019年3	项目经理		¥200.00			■ 项目经理
5	制定项目章	1 个工	二(2019年)2019年)2, 3, 4	项目经理		¥400.00			
6	项目启动大	(会 1 个工	二(2019年:2019年:5	项目经理, 需求	き专家	¥760.00			
7	- 规划	23 个	工2019年 ∶2019年₄		3	¥9, 800. 00			
8	规划范围		[[2019年] 2019年]		į	¥2, 280. 00			
9	制定需求	え说明书 1 个工	[[12019年32019年36	需求专家		¥360.00			
10	界面设计		二(2019年32019年39	UI专家		¥320.00			
11	详细设计	F说明书 1 个工	二(2019年32019年39	设计专家		¥400.00			
12	范围说明		二(2019年32019年39	项目经理		¥400.00			
13	■ 创建WBS		二(2019年)2019年)10,11,	12 项目经理		¥400.00			
14	形成范围		【12019年42019年413	项目经理		¥400.00			
15	★ 规划时间		[[12019年42019年4		3	¥2,000.00			
16	排列工作		【12019年42019年414	项目经理		¥400.00			
17	二 估算资源		二(2019年42019年416	项目经理		¥400.00			
18	二 估算持续		二(2019年42019年417	项目经理		¥400.00			
19	制定进度		工(2019年42019年418	项目经理		¥400.00			
20	形成进度		【12019年42019年419	项目经理		¥400.00			
21	规划成本		[12019年42019年4		Ž	¥1, 200. 00			
22	项目成本		□ 12019年42019年420	项目经理		¥400.00			
23	项目预算	1 个工	【12019年42019年422	项目经理		¥400.00			
24	形成范围	1基准 1 个工	【12019年42019年423	项目经理		¥400.00			
25	★ 规划质量		[12019年42019年4			¥720.00			
26	制定测证		【12019年42019年414	质量专家		¥360.00			
27	制定测证		【12019年42019年426	质量专家		¥360.00			
28	★ 规划人力资		[12019年42019年4			¥800.00			
29			□ 12019年42019年417	项目经理		¥400.00			
30			□ 12019年42019年429	项目经理		¥400.00			
31	> 规划沟通		[12019年42019年4			¥400.00			
32			【12019年42019年430	项目经理		¥400.00			
33	★ 规划采购	2 个工	C/2019年42019年4			¥800.00			
		任务	非活动任务	手	三动摘要总成	外部	里程碑 ◇		
-E	*** E + WD0	拆分	非活动里程碑《	◇ 手	≤动摘要 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	 最后期	朝限 ♣		
	L 特 向 木 WBS	里程碑 ◆	非活动摘要		双开始时间 □	进度	_		_
日期: 20	713年0月10日						# 庄		_
		摘要	手动任务		又完成时间]	手动边	世)吳 📉		
		项目摘要 『	【 仅工期	夕)部任务				
		项目摘要 『	【 仅工期	第1页	卜部任务				_


示识号	仕务模	任务名称	I	期	开始时间	司 完成时间 前置任务	资源名称		成本	三月二	十三日星 15	期六 16	三月
34	-	自制外购会	分析 1	个工	12019年	至42019年417	项目经理		¥400.00		10	10	
35	-3	制定采购				至42019年434	项目经理		¥400.00				
36	*	规划风险				- 2019年4	- A d ze-z		¥1, 200. 00				
37	=	识别风险				至42019年415, 21, 2	5. 项目经理		¥400.00				
38	-3	风险分析				至42019年437	项目经理		¥400.00				
39	-3	制定风险				至42019年438	项目经理		¥400.00				
40	-5	规划整合				至42019年439	项目经理		¥400.00				
41		执行与监控				42019年(本[¥2,500.(
42	-5	组建项目团队				至42019年417		序员1,项目约					
43	-5	项目执行				42019年	(1,1,1,2)	7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	¥4, 560. 00				
44	-	用户模块				42019年4			¥1, 960. 00				
45	-	注册登				42019年442	程序员1		¥280.00				
46	-5	首页				至42019年445	程序员1		¥280.00				
47	-5	浏览日标				至42019年446	程序员1		¥280.00				
48	-5	搜索景				42019年447	程序员1		¥280.00				
49	-5			个工	12019年	至42019年448	程序员1		¥280.00				
50	-5	打卡	1	个工	12019年	至42019年449	程序员1		¥280.00				
51	-5	个人日末				至42019年450	程序员1		¥280.00				
52	*	商家模块		个工	12019年	{2019年 {	,,,,,,		¥1, 400. 00				
53	-5	注册登				52019年542	程序员2		¥280.00				
54	-5	景点或	商铺的简介	个工	12019年	52019年553	程序员2		¥280.00				
55	-5	每日推	差 1	个工	12019年	52019年554	程序员2		¥280.00				
56	-5	统计打-	卡数量 1	个工	12019年	52019年555	程序员2		¥280.00				
57	5			个工	12019年	52019年556	程序员2		¥280.00				
58	*	管理员模	央 5			₹2019年{			¥1, 200. 00				
59	-5	商家审	亥 1	个工	12019年	52019年542	程序员3		¥240.00				
60	5	每日精	先日记 1	个工	12019年	52019年559	程序员3		¥240.00				
61	-5	统计分				52019年560	程序员3		¥240.00				
62	-5	系统日		个工	12019年	52019年561	程序员3		¥240.00				
63	-5	备份				E 2019年	程序员3		¥240.00				
64	*	项目监控				€{2019年{			¥4, 140. 00				
65	-	各项指标				E 2019年 E 42	测试员1,项	目经理,需求	¥1,040.00				
66	-	监控评审	1	个工	12019年	至2019年565	设计专家,项	页目经理,需求	¥1, 160.00				
								手动摘要总成		外部里程碑	\Diamond		
			- 11			II.) of all HI dillorer		手动摘要		最后期限	•		
	专周末WBS												
∃期: 201′	.9年6月18日		! 程碑 •	~		非活动摘要		仅开始时间	С	进度			1
		拍	万要			■ 手动任务 ■		仅完成时间	3	手动进度			
		Ŋ	[目摘要			■ 仅工期		外部任务					


标识号	•		任务名称	工期	开始时间 完成时间 前置任务	资源名称	成本	三月二十	三日星期	7	三月二
	U	式						14	15	16	17
67		-	变更评审		~2019年52019年566	设计专家,项目经理,需求					
68		-	例会		↑ 2019年 2019年 542	UI专家,测试员1,程序员	¥1, 360.00				
69		*	管理干系人	1 个	[12019年₹2019年₹		¥396.00				
70		-	发布项目信息	0.33	个2019年52019年542	项目经理	¥132.00				
71		-	报告监控指标	0.33	个2019年52019年542	项目经理	¥132.00				
72		-	干系人沟通	0.33	个2019年52019年542	项目经理	¥132.00				
73		*	团队建设	1 个	[12019年₹2019年₹		¥3, 445. 20				
74		-	培训	0.33	个2019年52019年542	UI专家,质量专家,需求	¥1, 148. 40				
75		-	娱乐活动	0.33	个2019年52019年542	UI专家,质量专家,需求	¥1, 148. 40				
76		-	沟通	0.33	个2019年52019年542	UI专家,质量专家,需求	¥1, 148. 40				
77		-	采购	1 个	[12019年52019年542]	项目经理	¥400.00				
78		-	项目验收		[UI专家,设计专家,项目组	¥2, 160.00				
79		-	收尾	0. 33	个2019年(2019年(¥1, 993. 20				
80		-	项目终验		个2019年62019年678	UI专家,设计专家,项目组	¥712.80				
81		-	结束采购		个2019年€2019年€78	项目经理	¥132.00				
82		-	项目内部收尾	0.33	个2019年€2019年€78	UI专家,质量专家,需求	¥1, 148. 40				




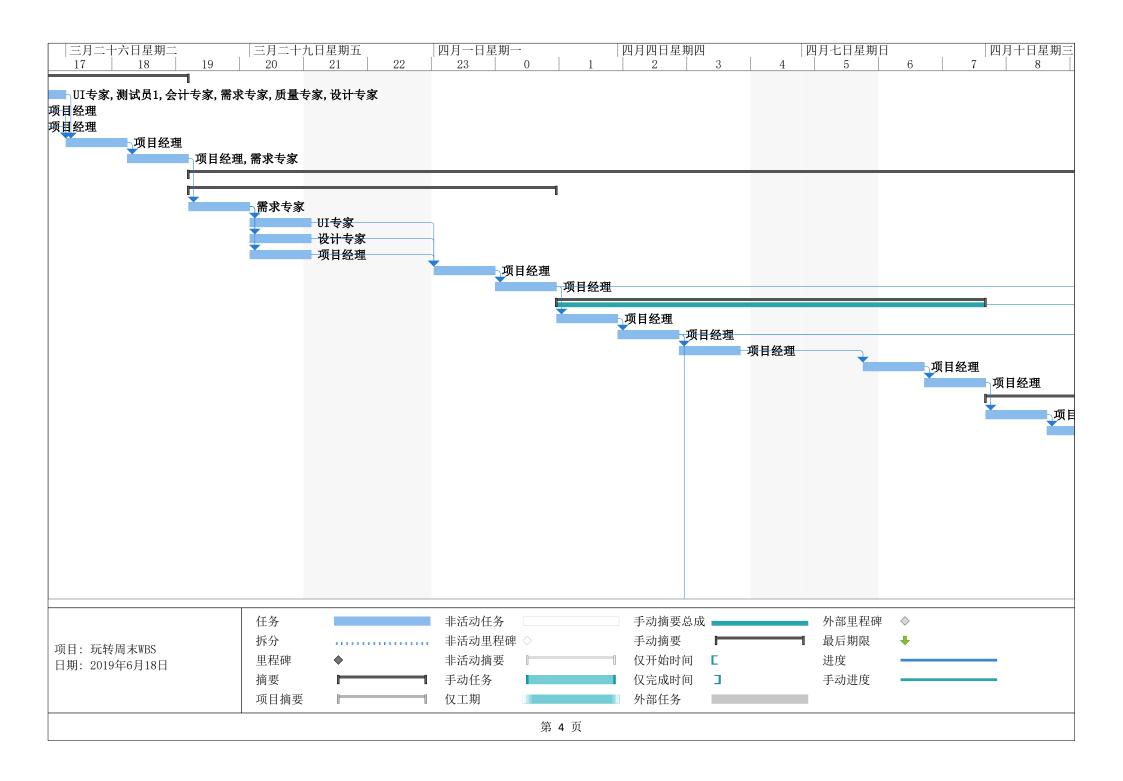

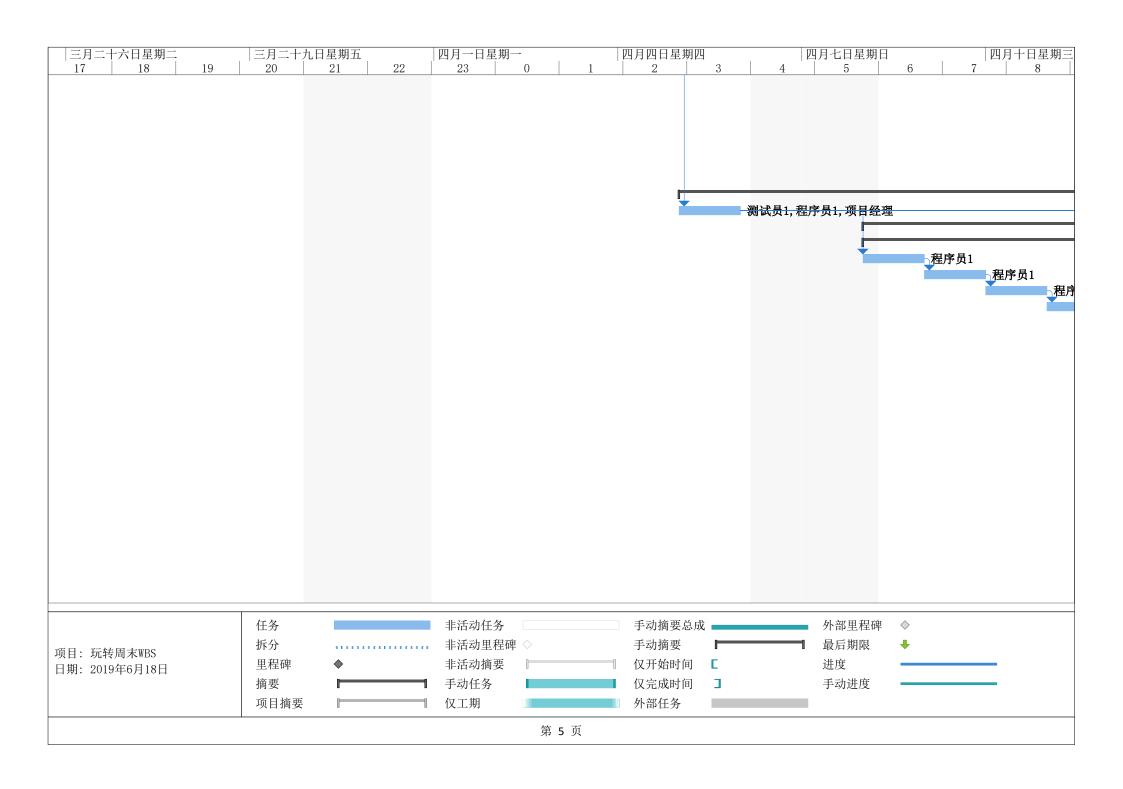


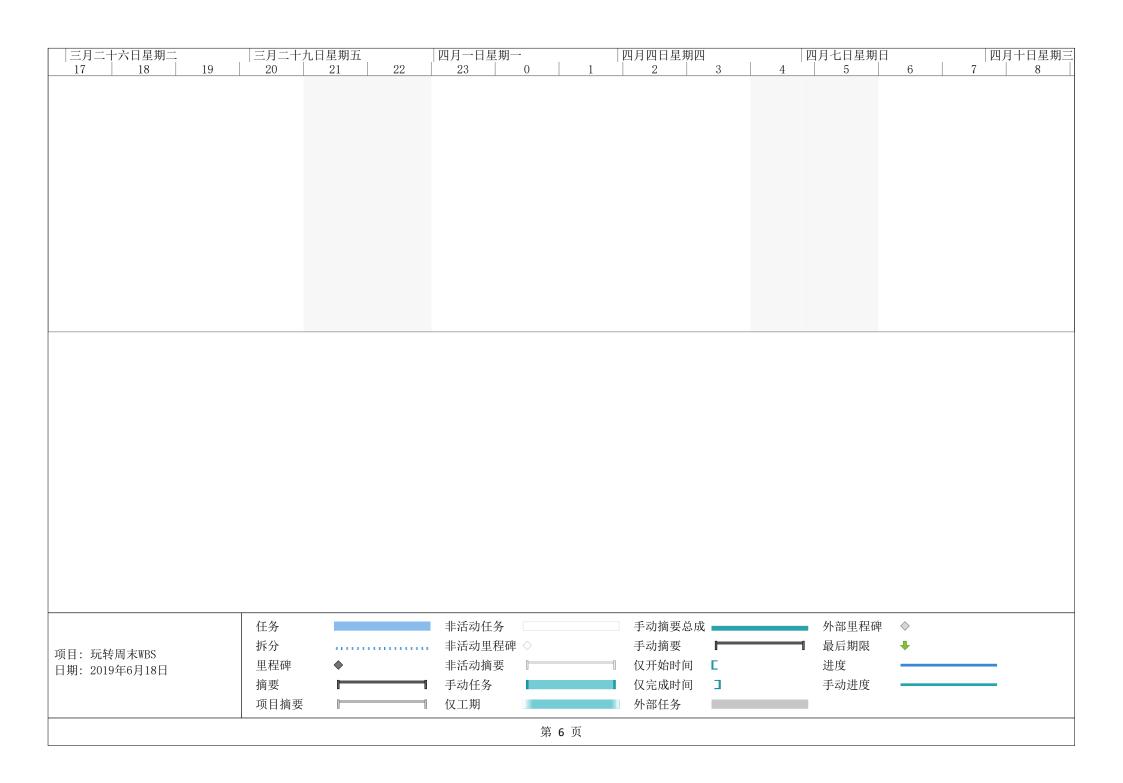


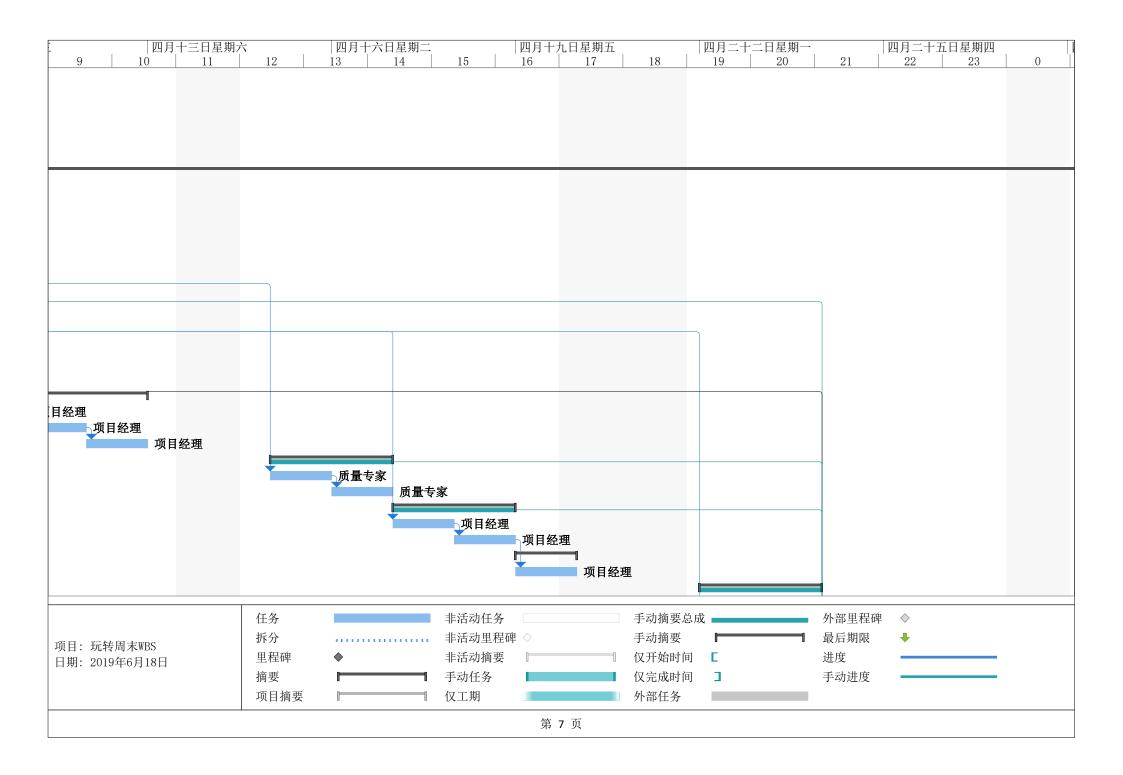


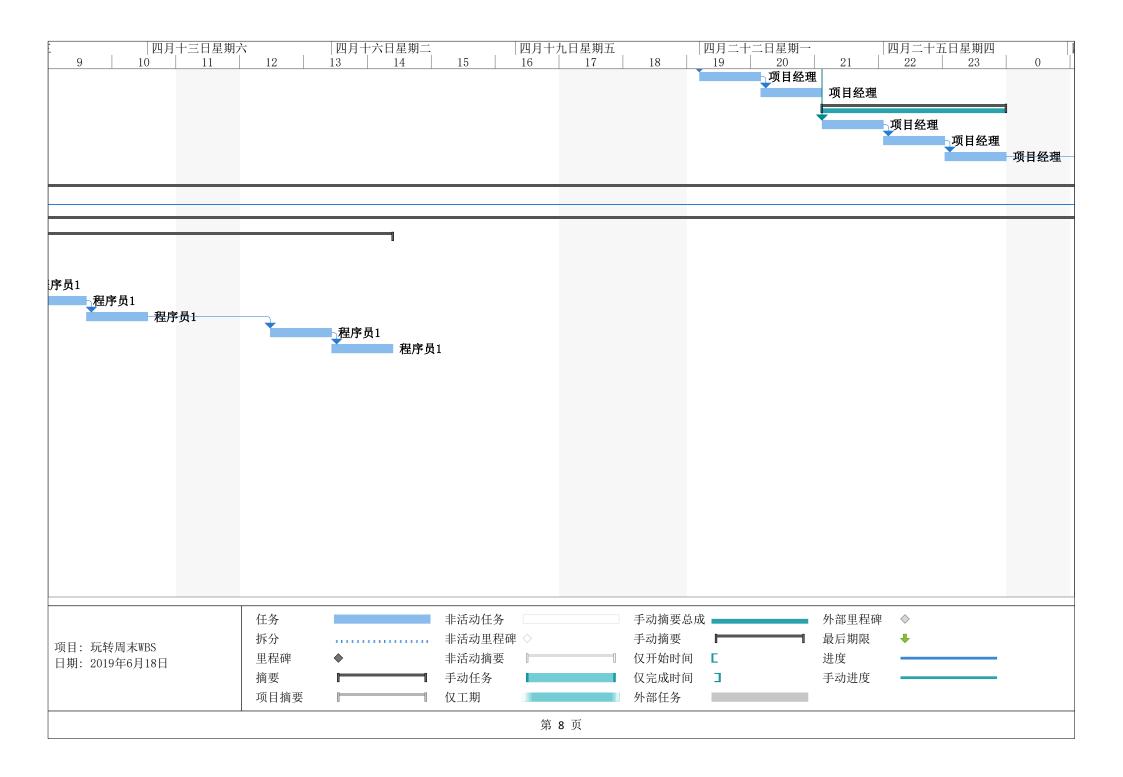



9 10	11 12	13 14 15	16 17	18 19 20	21 22 23 0
		非活动		手动摘要总成	外部里程碑 ◇
目:玩转周末WBS	任务		4 EI 107th A	手动摘要	最后期限 ◆
期: 2019年6月18日	任务		力里程碑 ◇		
,,, 2/ 1 + 2				仅开始时间 [进度 ———
	拆分 里程碑	非活动	力摘要 『	仅开始时间 [进度 手动进度
	拆分	非活动 ◆ 非活动	лág 『	仅开始时间 [

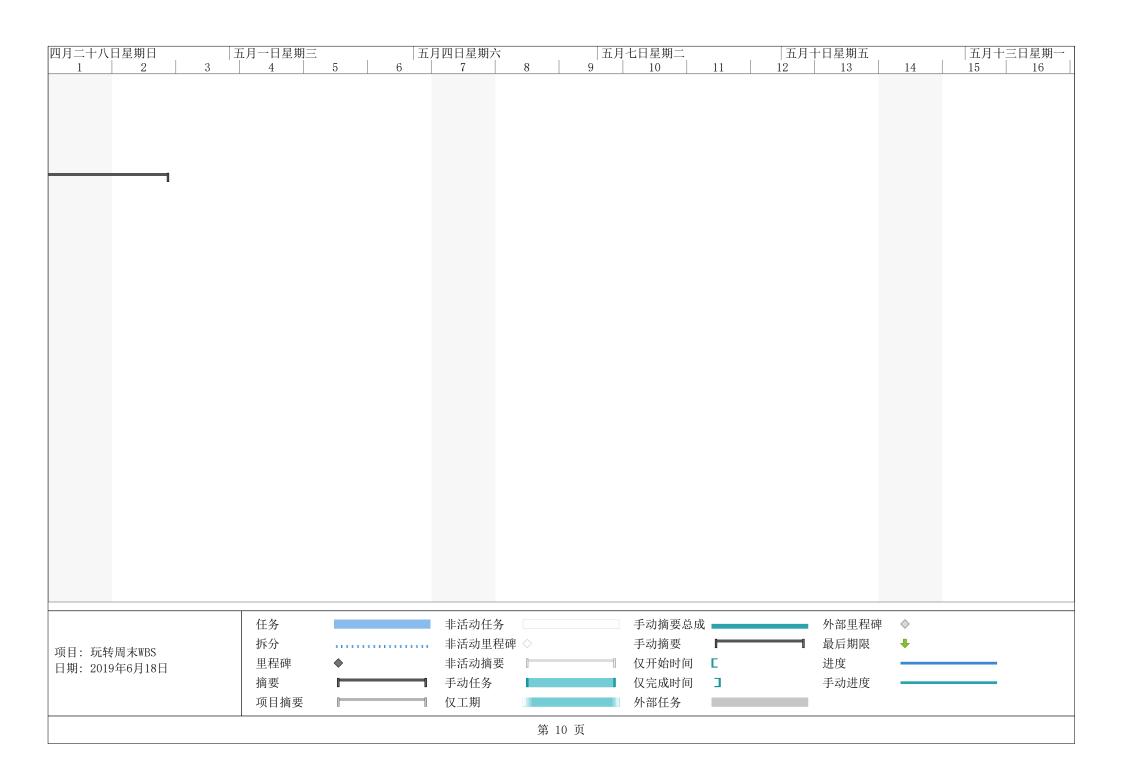


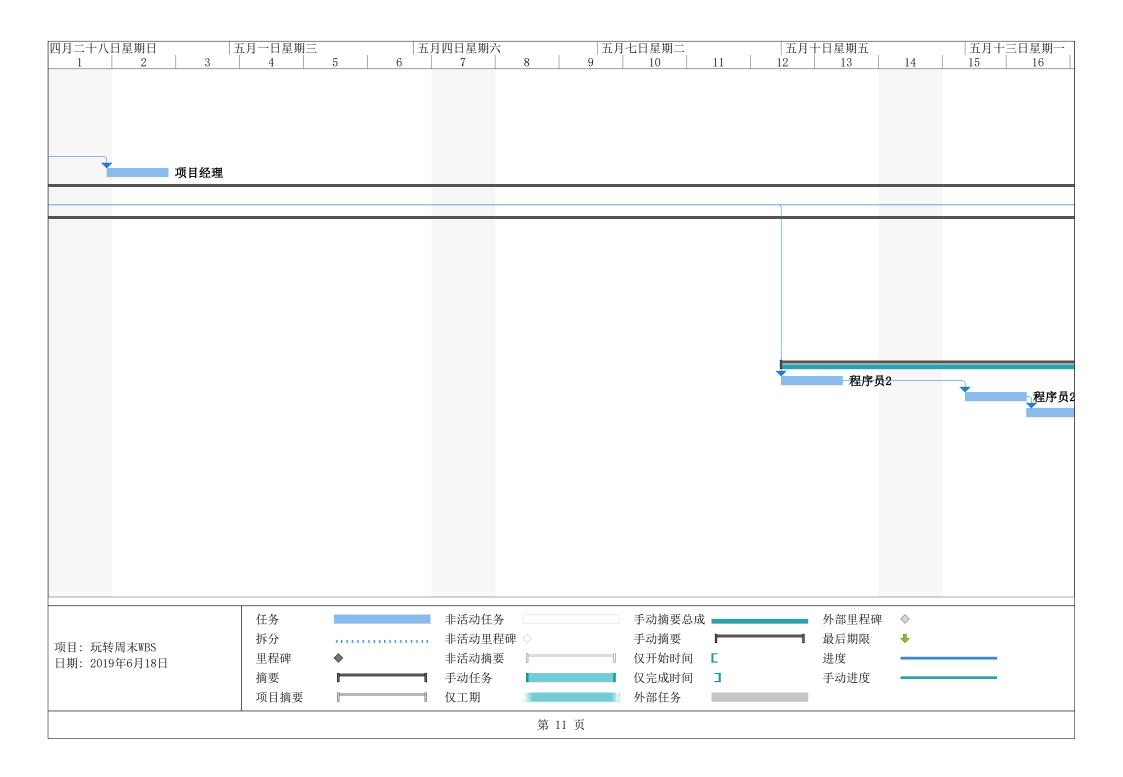

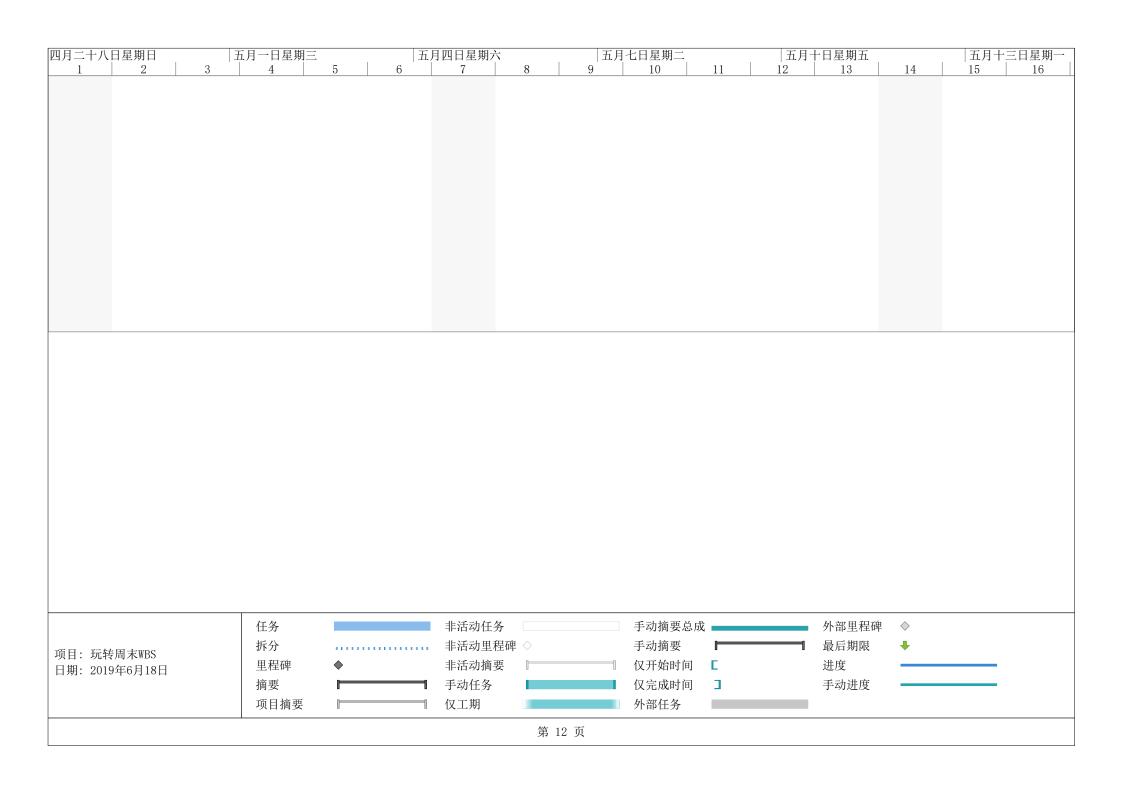

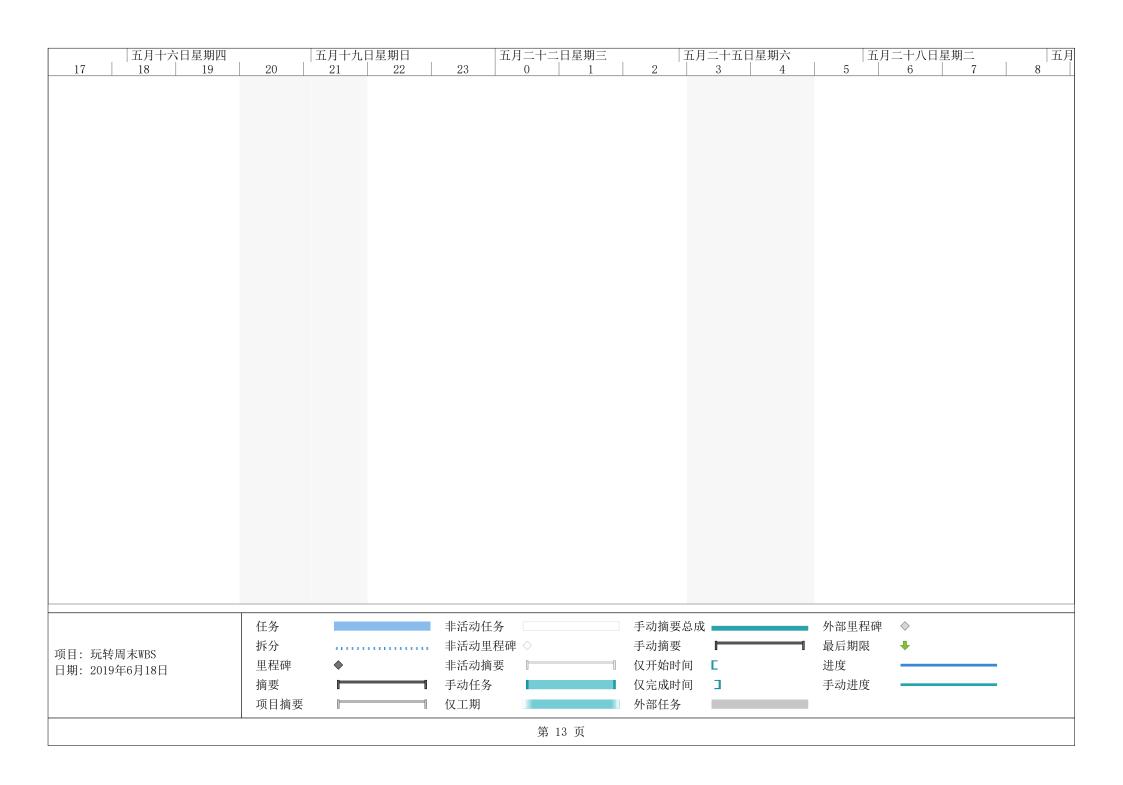

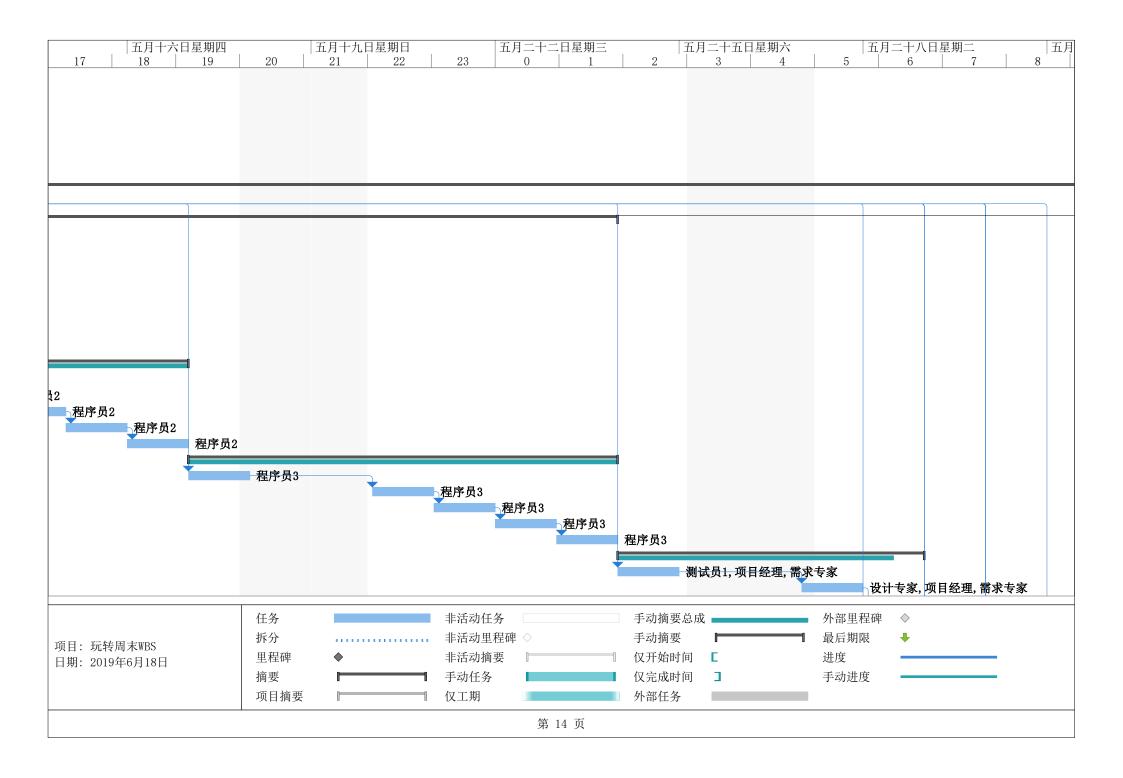

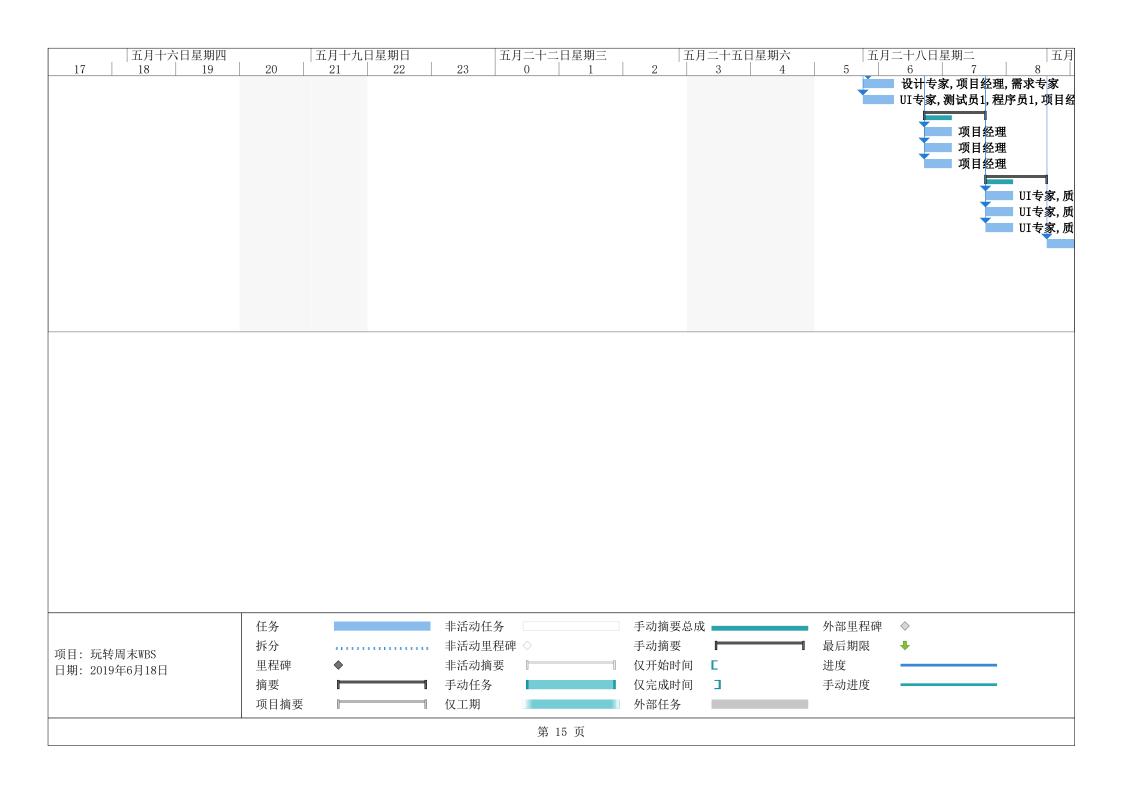

三十一日星	星期五		三日星期一	六月方	1日星期四		六月九日	日星期日		六月十二	日星期三		六月十五日	星期六
9	10	11	12	13 14	15	16	17	18 1	19	20	21	22	23	0
			任务		非活动任务			手动摘要总成			外部里程碑	\Diamond		
			拆分			鬼 ◇		手动摘要			最后期限	•		
项目: 玩车			里程碑	♦	非活动摘要			仅开始时间 [-	d	进度	Ť		
日期: 201	9年6月18日		摘要	*		и	U				手动进度			
					手动任务]		丁纫赶没			
			项目摘要		仅工期			外部任务						
						第	16 页							

